



ส่วนที่ ๑๒

บันทึกข้อความ

เลขที่เอกสารในระบบ E-Procurement ๑๐๖/๑๑๒/๒๐๖๖

1426

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๑๑๒/๒๕๖๖

วันที่ ๒๑

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อมูลการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

๑๒๑๖๔๓

เรียน ผอ.ผง. สำเนา ผผง.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำข้อมูลการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สรุปรายงานความก้าวหน้า โดยแยกตามปีงบประมาณ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๔ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๑,๘๓๖.๖๘ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๑,๖๓๔.๒๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๕๖๐.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๑ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา ๘๙๘.๐๔ ต้น ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา ๑,๒๗๘.๓๖ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๑๔๒.๓๕ ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๐ รายการ และยกเลิก จำนวน ๘ รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๘ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๘๕๑.๖๘ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๗๘๑.๗๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๒๑.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๕ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา ๖๘๗.๒๒ ต้น ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๘ รายการ (ประกาศ TOR จำนวน ๑ รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ เปิดซอง จำนวน ๑ รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน ๔ รายการ) และอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๔๐ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อชช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารกรณ์ ทัดพงษ์ศรีธรร)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๒๑ กพ. ๒๕๖๖

-ทราบ

เรียน ผอ.สชช., ผอ.ส.กท., ทน.๑-๙ ผอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๒ กพ. ๒๕๖๖



การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2566

กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566





การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ร.บ. 2565

ประเภท	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางขึ้น (ตัน)
แผน	1,634.22	134	898.04
ผล	1,560.87 (95.51%)	120	1,278.36 (142.35%)

Para Asphalt Concrete




ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางขึ้น (ตัน)
แผน	1,605.81	130	792.54
ผล	1,532.47 (95.43%)	116	1,171.22 (147.78%)

Para Soil Cement


ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางขึ้น (ตัน)
แผน	28.41	4	105.50
ผล	28.40 (99.96%)	4	107.14 (101.55%)



หมายเหตุ : ยกเลิก 8 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการเงินกู้ พ.ศ. 2563 และงบประมาณเพื่อจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

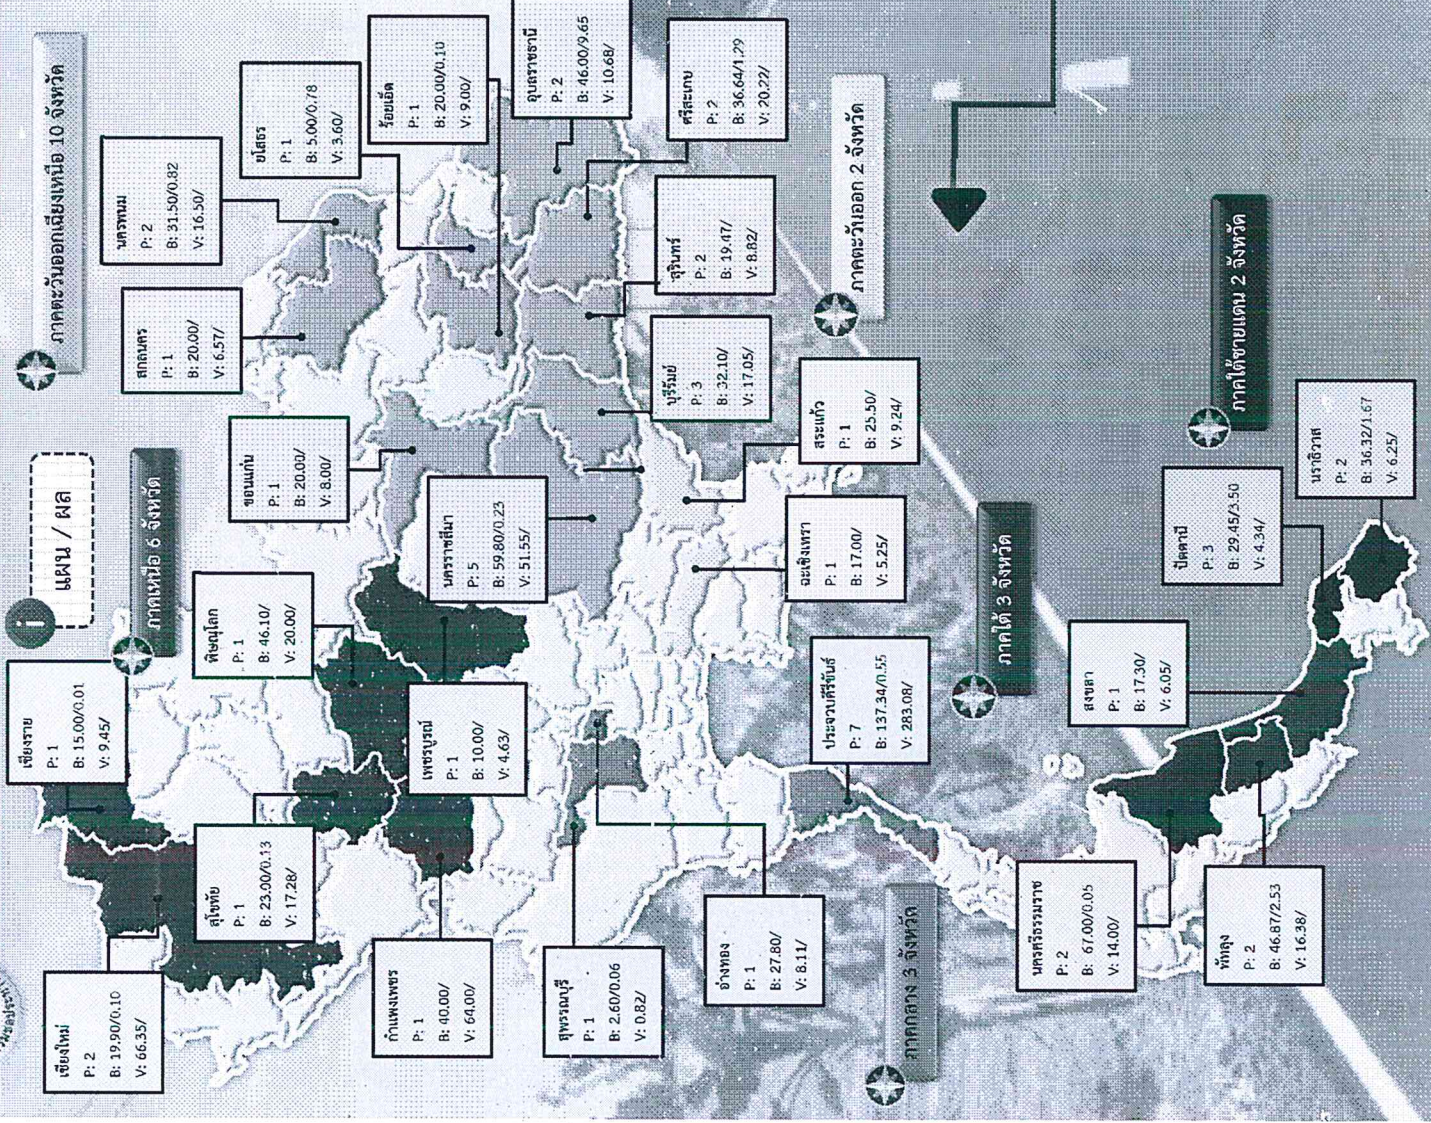

แผนการดำเนินงาน

ภาค	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	นำมายัง (ต้น)
รวม 26 จ.	48	851.68	687.22
เหนือ	7	154.00	181.71
ตะวันออกเฉียงเหนือ	20	290.51	151.99
กลาง	9	167.74	292.01
ตะวันออก	2	42.50	14.49
ใต้	5	131.17	36.43
ได้ขยายแดน	5	65.77	10.59

ผลการดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 66 (ล้านบาท)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	นำมายัง (ต้น)
แผน	851.68	781.72	48	687.22
ผล	21.46 (2.52%)	21.46 (2.75%)	-	-

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 8 รายการ (ประเภท TOR 1 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ เปิดซอง 1 รายการ อนุมัติราคา 4 รายการ) และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 40 รายการ
