



บันทึกข้อความ

1989

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘, ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๑๖๘/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ จากระบบติดตาม Cen Project)

22303

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ มีข้อสั่งการให้กองแผนงานสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกสัปดาห์ นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยกรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๐๖๕ รายการ งบประมาณ ๗๐,๖๘๘.๐๖๒๙ ล้านบาท ผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๓๘ รายการ งบประมาณ ๔,๖๔๔.๓๓๑๗ ล้านบาท (ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน จำนวน ๒๐ รายการ งบประมาณ ๓๘๖.๕๖๗๔ ล้านบาท ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓๓ รายการ งบประมาณ ๘๔๑.๖๗๖๖ ล้านบาท เปิดซอง จำนวน ๓๖ รายการ งบประมาณ ๒,๑๙๕.๔๓๐๒ ล้านบาท อนุมัติรับราคา จำนวน ๔๙ รายการ งบประมาณ ๑,๒๒๐.๗๕๗๕ ล้านบาท) ทำข้อผูกพัน จำนวน ๙,๗๙๘ รายการ งบประมาณ ๖๕,๙๓๓.๕๕๘๙ ล้านบาท ยกเลิก จำนวน ๑๒๖ รายการ งบประมาณ ๘๘๐.๗๗๒๓ ล้านบาท และรายการ Lump Sum จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๒๒๙.๐๐๐๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายงานงานปีเดียวต้องก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ จากการตรวจสอบ พบว่า ปัจจุบันมีสำนัก/กองที่ก่อหนี้ผูกพันรายงานงานปีเดียวแล้วเสร็จทุกรายการ จำนวน ๖ สำนัก คือ สมต. สอส. สจต. สบก. สขป. ๒ และ สขป. ๕ นอกจากนี้ยังมีรายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๑๓ รายการ งบประมาณ ๒,๓๑๙.๕๕๗๖ ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประเภทซ่อมแซม/ปรับปรุงงานชลประทาน จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการก่อผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีสำนัก/กองที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันมากที่สุด ๓ ลำดับ คือ

๑) สขป. ๑๕ จำนวน ๑๙ รายการ งบประมาณ ๑๒๒.๖๕๓๗ ล้านบาท

๒) สขป. ๑๐ จำนวน ๑๒ รายการ งบประมาณ ๗๙.๘๑๑๒ ล้านบาท

๓) สขป. ๙ จำนวน ๘ รายการ งบประมาณ ๗๒.๖๓๕๔ ล้านบาท สขป. ๑๑ จำนวน

๘ รายการ งบประมาณ ๒๓๓.๔๐๐๐ ล้านบาท และ สบอ. จำนวน ๘ รายการ งบประมาณ ๑๓๘.๗๒๐๑ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ตาม QR Code

ท้ายหนังสือมาด้วยแล้ว

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.



รายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

- ทสม

65 มน ๗๐ รวณ., ๗๐๕. ๗๓๑., ๗๓๑. ๑-๙

11๗1 มนท. ๗๐.

11๗1 มนท. ๗๐.

(นายธเนศร์ สมบุญ)

ผส.บอ.

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

- ส่วนกลาง

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 138 รายการ

หน่วย : ล้านบาท



การประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 26 ก.ค. 65 มีมติให้ รายการงานปีเดียวต้องก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาส 1



สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน		ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวม	9,936	69,578.29	20	386.47	33	841.68	36	2,195.43	49	1,220.76	9,798	64,933.96
กพก.	158	13,162.81	3	24.09	1	78.00	5	593.47	1	94.56	148	12,372.70
สพญ.	176	10,927.46			3	77.76	3	1,196.00	1	399.75	169	9,253.95
สกก.	373	1,470.02					6	125.25			367	1,344.77
สบอ.	228	706.59	1	0.06	1	5.00	5	86.21	1	47.45	220	567.87
สบก.	32	598.70			7	55.00	3	18.00			22	525.70
สจค.	49	272.55									49	272.55
สลด.	5	102.97					1	3.00	2	50.20	2	49.77
สตร.	39	513.24					1	6.22	1	5.20	37	501.82
สอศ.	13	331.04			1	55.00	4	19.00			8	257.04
สมค.	48	5,538.62									48	5,538.62


ภาพรวม

รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 138 รายการ งบประมาณ 4,644.33 ล้านบาท

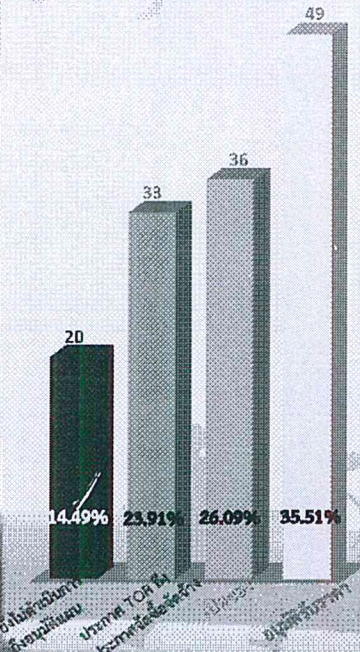

■ ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน
■ ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
■ เปิดซอง
■ อนุมัติรับราคา

ไม่รวมรายการ จำนวน 129 รายการ งบประมาณ 1,109.77 ล้านบาท ดังนี้
 - ยกเลิก จำนวน 126 รายการ งบประมาณ 880.77 ล้านบาท
 - รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

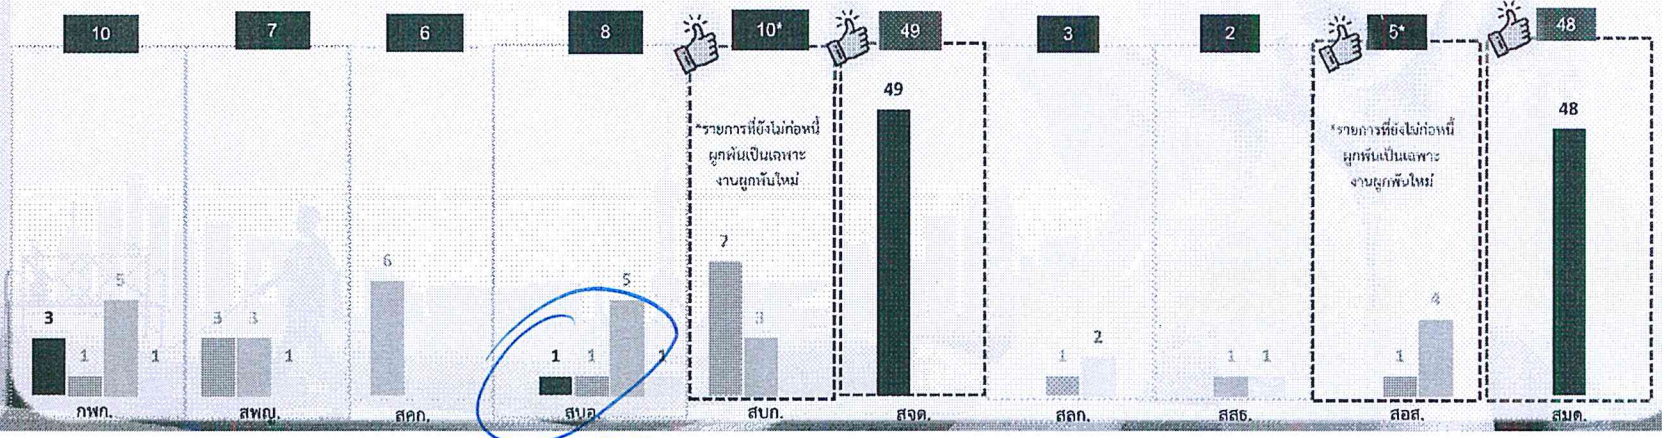

๑๑

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

- ส่วนภูมิภาค


หน่วย : ล้านบาท

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 138 รายการ

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 138 รายการ

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน		ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สขป. 1	416	1,499.48							4	2.50	412	1,496.98
สขป. 2	403	1,292.27									403	1,292.27
สขป. 3	359	2,211.74			2	0.47			1	46.10	356	2,165.17
สขป. 4	532	1,567.27	1	2.66	3	219.91					528	1,344.70
สขป. 5	494	2,660.15									494	2,660.15
สขป. 6	500	2,834.39					1	50.00			499	2,784.39
สขป. 7	653	5,050.92							5	182.50	648	4,868.42
สขป. 8	623	3,419.84							3	38.70	620	3,381.14
สขป. 9	739	1,654.39	1	0.24	2	1.60	2	45.79	3	25.01	731	1,581.75

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน		ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สขป. 10	608	1,032.68	7	6.65	1	1.00	2	24.65	2	47.51	596	952.87
สขป. 11	575	1,560.76	3	24.00	2	181.00	1	26.40	2	2.00	567	1,327.36
สขป. 12	671	1,468.39			1	83.29			1	4.93	669	1,380.17
สขป. 13	611	1,321.28	3	313.77							608	1,007.51
สขป. 14	353	2,956.44			2	48.50			4	49.48	347	2,858.46
สขป. 15	500	1,215.76	1	15.00	6	34.20	2	1.45	10	72.00	481	1,093.11
สขป. 16	517	3,158.96							2	135.00	515	3,023.96
สขป. 17	261	1,049.56			1	0.95			6	17.87	254	1,030.74

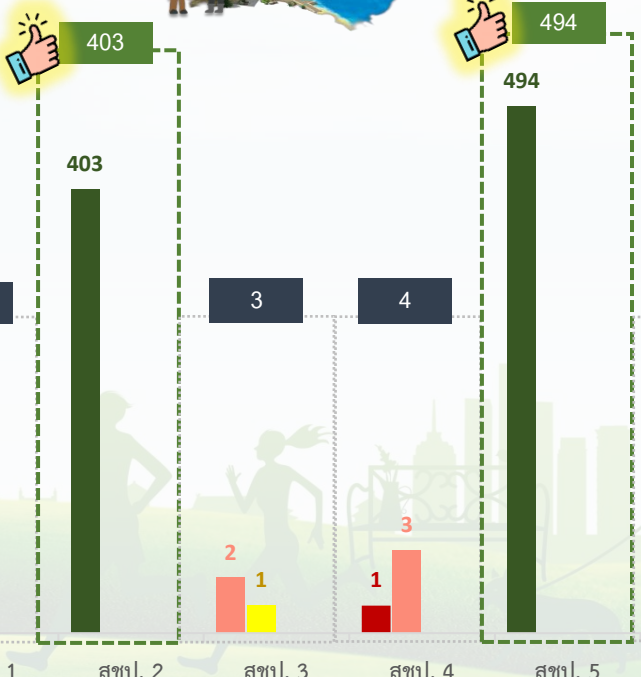

■ ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน
■ ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
■ เปิดซอง
■ อนุมัติรับราคา

ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566



ไม่รวมรายการ จำนวน 129 รายการ งบประมาณ 1,109.77 ล้านบาท ดังนี้
 - ยกเลิก จำนวน 126 รายการ งบประมาณ 880.77 ล้านบาท
 - รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

