



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๑๙๖/๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อมูลการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖) ๑๒๑๖๒๓

เรียน ผอ.ผง. สำเนา ผผง.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำข้อมูลการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สรุปรายงานความก้าวหน้า โดยแยกตามปีงบประมาณ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๔ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๑,๘๓๖.๖๘ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๑,๖๓๔.๒๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๕๘๐.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๓ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา ๘๘๘.๐๔ ตัน ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา ๑,๒๘๓.๗๖ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๔๒.๙๕ ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๓ รายการ และยกเลิก จำนวน ๘ รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๘ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๘๕๑.๖๘ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๗๕๙.๒๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๔๐.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๒ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา ๖๘๗.๒๒ ตัน ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา ๑๐.๗๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๖ ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗ รายการ (ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ เปิดซอง จำนวน ๑ รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน ๕ รายการ) และอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๔๑ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อชช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาวราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธรรม)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ

(นายธนะศักดิ์ โยเฮา)

ผวน.ผง. รักษาการแทน ผอ.ผง.

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖

- ทราบ

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖ ผอ.ส่วน., ผอ.อ.ภค., ทน.๑-๗ ผอ.

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๖

โครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานที่ดำเนินการโดยนายงพารามาเป็นส่วนผสมของงานถนน เพื่อการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนบนคันคลอง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในงานด้านชลประทาน รวมทั้งสิ้น 134 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1,836.68 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,634.22 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,580.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.73 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา 898.04 ตัน ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา 1,283.76 ตัน คิดเป็นร้อยละ 142.95 ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 123 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ ทั้งนี้ จำแนกตามประเภท ดังนี้

- Para Asphalt Concrete จำนวน 130 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,605.81 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,552.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา 792.54 ตัน ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา 1,176.62 ตัน คิดเป็นร้อยละ 148.46 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 119 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

- Para Soil Cement จำนวน 4 รายการ งบประมาณจัดสรร 28.41 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 28.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา 105.50 ตัน ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา 107.14 ตัน คิดเป็นร้อยละ 101.55 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 โครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานเป็นงานซ่อมแซม ปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน และถนนทางเข้าหัวงาน โครงการชลประทาน ประเภท Para Asphalt Concrete รวมทั้งสิ้น 48 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 851.68 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 759.25 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 40.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา 687.22 ตัน ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา 10.70 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.56 ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 รายการ (ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ เปิดซอง จำนวน 7 รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน 5 รายการ) และอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 41 รายการ




การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2566

กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566



การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

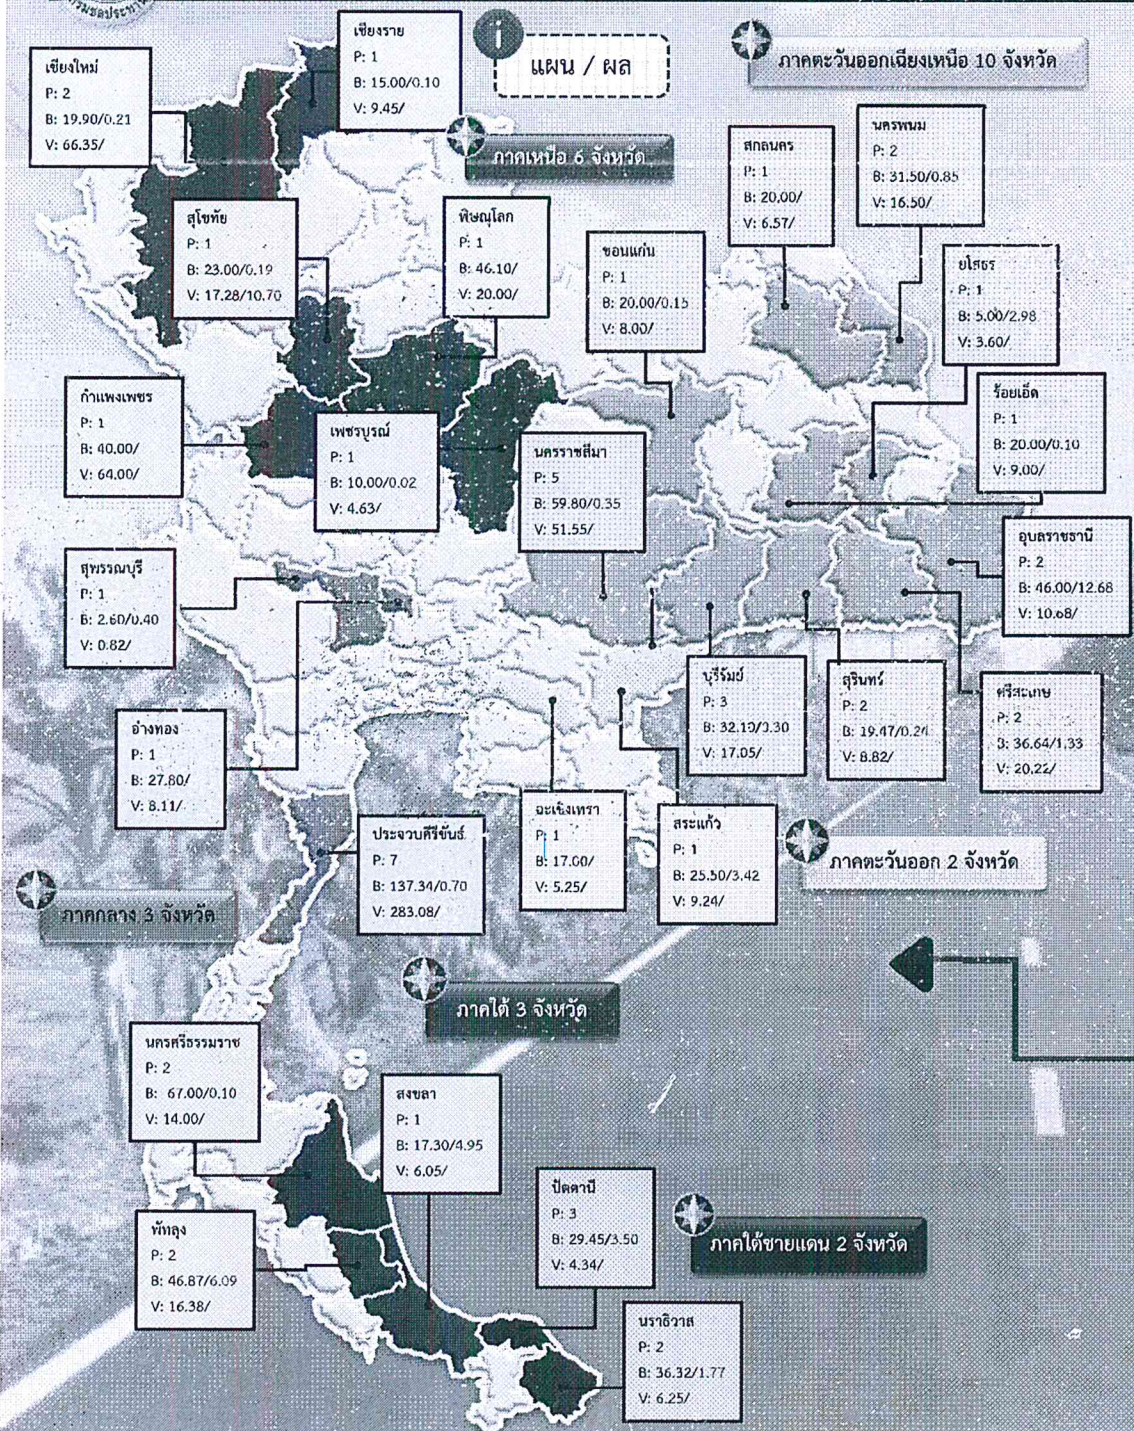

แผนการดำเนินงาน

ภาค	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	น้ำยางชั้น (ตัน)
	P	B	V
รวม 26 จ.	48	851.68	687.22
เหนือ	7	154.00	181.71
ตะวันออกเฉียงเหนือ	20	290.51	151.99
กลาง	9	167.74	292.01
ตะวันออก	2	42.50	14.49
ใต้	5	131.17	36.43
ใต้ชายแดน	5	65.77	10.59

ผลการดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 66 (ล้านบาท)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	851.68	759.25	48	687.22
ผล	40.43 (4.75%)	40.43 (5.32%)	-	10.70 (1.56%)

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 7 รายการ (ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ เปิดซอง 1 รายการ อนุมัติรับราคา 5 รายการ) และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 41 รายการ
