



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘, ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๒๐๕/๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ จากระบบติดตาม Cen Project) พ.ร. ๒๕๖๕

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ มีข้อสั่งการให้กองแผนงานสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกสัปดาห์ นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยกรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๐๖๕ รายการ งบประมาณ ๗๐,๖๘๘.๐๖๒๙ ล้านบาท ผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๐๖ รายการ งบประมาณ ๔,๐๒๓.๖๓๐๐ ล้านบาท (อนุมัติแผนถึงประกาศ TOR จำนวน ๒๐ รายการ งบประมาณ ๔๔๗.๔๘๔๔ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๔ รายการ งบประมาณ ๕๗๔.๐๐๔๐ ล้านบาท เปิดซอง จำนวน ๒๘ รายการ งบประมาณ ๑,๒๗๔.๘๘๐๔ ล้านบาท อนุมัติรับราคา จำนวน ๔๔ รายการ งบประมาณ ๑,๗๒๗.๒๖๑๒ ล้านบาท) ทำข้อผูกพัน จำนวน ๙,๘๒๔ รายการ งบประมาณ ๖๕,๔๗๘.๓๔๓๕ ล้านบาท ยกเลิก จำนวน ๑๓๒ รายการ งบประมาณ ๙๕๗.๐๘๙๔ ล้านบาท และรายการ Lump Sum จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๒๒๙.๐๐๐๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายงานงานปีเดียวต้องก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ จากการตรวจสอบ พบว่า ปัจจุบันมีสำนัก/กองที่ก่อหนี้ผูกพันรายงานงานปีเดียวแล้วเสร็จทุกรายการ จำนวน ๖ สำนัก คือ สมต. สอส. สจต. สบก. สขป. ๒ และ สขป. ๕ นอกจากนี้ยังมีรายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๘๓ รายการ งบประมาณ ๑,๘๔๓.๙๙๕๐ ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประเภทซ่อมแซม/ปรับปรุงงานชลประทาน จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการก่อผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีสำนัก/กองที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันมากที่สุด ๓ ลำดับ คือ

- ๑) สขป. ๑๕ จำนวน ๑๐ รายการ งบประมาณ ๘๑.๑๒๓๗ ล้านบาท
- ๒) สขป. ๑๐ จำนวน ๙ รายการ งบประมาณ ๓๑.๖๕๐๐ ล้านบาท
- ๓) สขป. ๑๑ จำนวน ๗ รายการ งบประมาณ ๒๐๗.๐๐๐๐ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันมาด้วยแล้ว

- ทราบ

๖๒๗ นอ.รณ., นอ.ร.ท., ทน.๑-๙ นอ.

11๘๗ พท.นอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธนเศรษฐ์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๖

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.


รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 รายการที่ยังไม่ก่อสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูลจากระบบ Gen Project ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566
 หมายเหตุ : ล้านบาท

การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 26 ก.ค. 65 มติให้ รายการงานปีเดียวต้องก่อสร้างผู้ถือหุ้นภายในไตรมาสที่ 1



ภาพรวม

รายการที่ยังไม่ก่อสร้างผู้ถือหุ้น 106 รายการ งบประมาณ 4,023.63 ล้านบาท



ลำดับ/กอง	จำนวนรายการที่สิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	อนุมัติแผนงบประมาณ TOR	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	เกิดของ	อนุมัติรับราคา	ทำข้อตกลง					
รวม	9,930	69,501.97	20	447.48	14	574.00	28	1,274.88	44	1,727.26	9,824	65,478.34
กทท.	157	13,135.15	3	24.09	3	77.76	5	574.00	1	94.56	148	12,442.51
สพญ.	175	10,886.44					2	436.00	2	1,159.75	168	9,212.93
สกก.	373	1,470.02	1	5.00	6	125.25	6	125.25	2	63.23	367	1,344.77
สทอ.	228	706.59	1	12.00	2	12.98	2	12.98	3	21.00	223	625.38
สทก.	32	598.70			6	40.00	6	40.00			22	525.70
สจต.	49	272.55									49	272.55
สกก.	5	102.97							1	2.52	4	100.45
สสร.	39	513.24									38	507.02
สอธ.	13	331.04					4	19.00			8	257.04
สมต.	48	5,538.62	1	55.00					1	6.22	48	5,538.62

ไม่รวมรายการ จำนวน 135 รายการ งบประมาณ 1,186.09 ล้านบาท ดังนี้
 - ยกเลิก จำนวน 132 รายการ งบประมาณ 957.09 ล้านบาท
 - รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

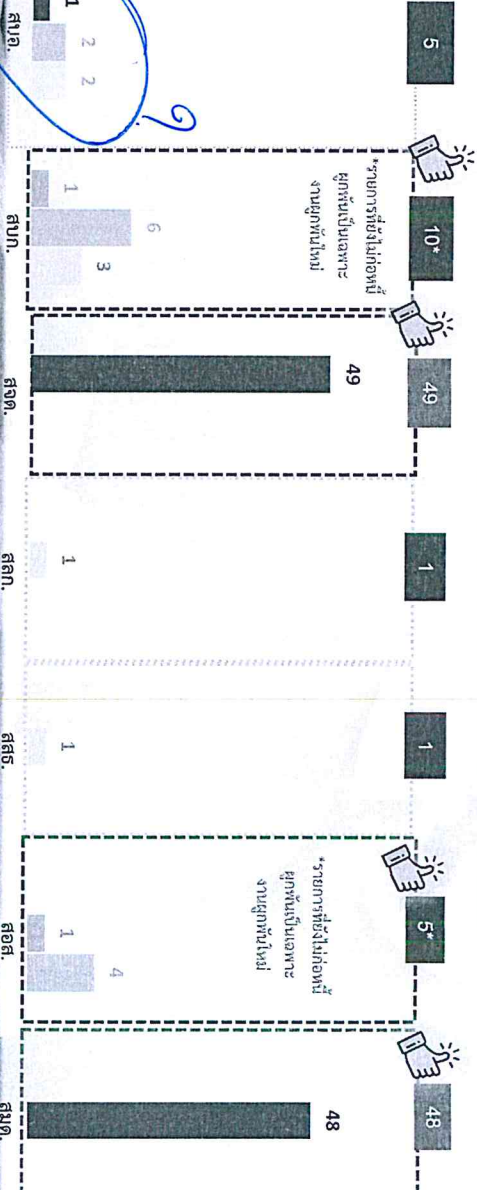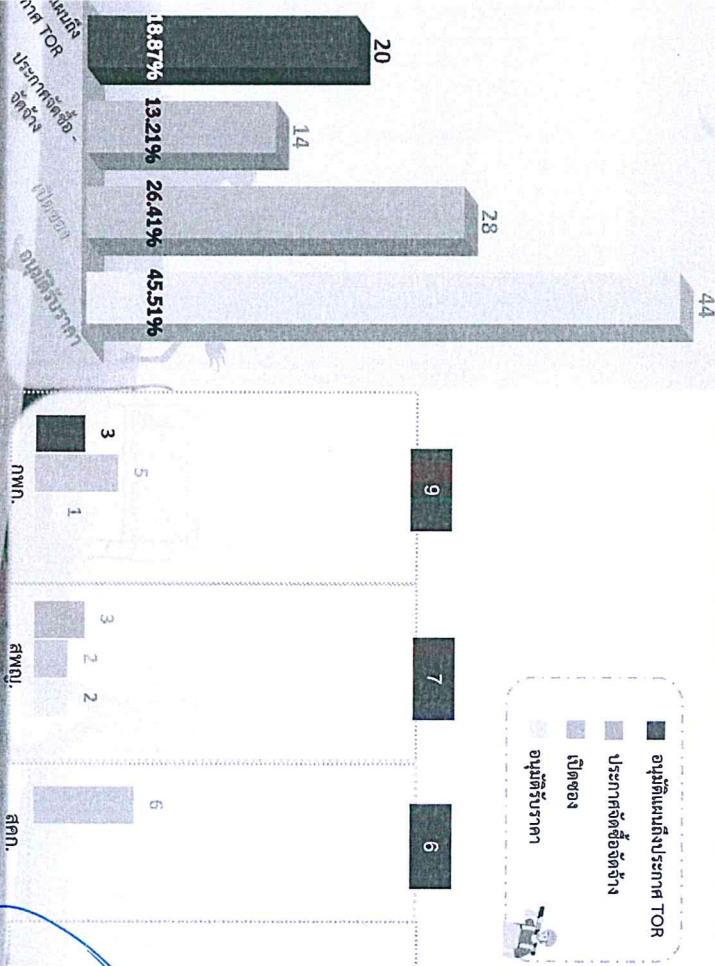

*รายการที่ยังไม่ก่อสร้างผู้ถือหุ้นเป็นเพราะงานผู้ถือหุ้นใหม่

*รายการที่ยังไม่ก่อสร้างผู้ถือหุ้นเป็นเพราะงานผู้ถือหุ้นใหม่

รายละเอียดรายการงานปีเดียว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

ข้อมูลจากระบบ Gen project วันที่ 27/03/66

ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27/03/66
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 83 รายการ		1,843,999,000	
1	สำนักงาน ชลประทานที่ 1	(1.1512) ขุดลอกคลองโดยรดชุดข้างเหมา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ปริมาณดิน 26,168 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [3607]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000	6.อนุมัติรับราคา
2	สำนักงาน ชลประทานที่ 1	(1.1547) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ - [3642]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000	6.อนุมัติรับราคา
3	สำนักงาน ชลประทานที่ 1	(1.1584) ขุดลอกคลองโดยรดชุดข้างเหมา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ปริมาณดิน 26,791 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสันป่าตอง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ - [3679]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000	6.อนุมัติรับราคา
4	สำนักงาน ชลประทานที่ 1	(1.1654) ขุดลอกคลองโดยรดชุดข้างเหมา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ปริมาณดิน 29,907 ลูกบาศก์เมตร อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ - [3749]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000	6.อนุมัติรับราคา
5	สำนักงาน ชลประทานที่ 3	(23) ปรับปรุงผิวจราจรคลองระบายน้ำ DR.15.8 ฝั่งขวา ด้วยพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระยะทางรวม 10.519 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหลายชุมพล ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [2081]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	46,100,000	6.อนุมัติรับราคา
6	สำนักงาน ชลประทานที่ 4	(222) ปรับปรุงฝายยางเกาะวงษ์เกียรติ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย - [982]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	117,025,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7	สำนักงาน ชลประทานที่ 4	(2) ปรับปรุงถนนคันคลอง MC หินซงอก (Para Asphalt Concrete) ระยะทาง 17 กิโลเมตร ระยะที่ 1 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร - [2060]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	40,000,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8	สำนักงาน ชลประทานที่ 4	(1.16) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ก่อสร้างฝายชั่วคราวกันแม่น้ำปิงหนองวัวด้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลลาดตอกไม่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร - [9387]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	2,662,000	2.อนุมัติแผน
9	สำนักงาน ชลประทานที่ 6	(59) ปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ P2 (เครื่องที่ 1 และ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชิน ตำบลแก่งสนามนาง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา - [819]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	50,000,000	5.เปิดซอง
10	สำนักงาน ชลประทานที่ 7	(271) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P.1 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร - [1031]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	37,500,000	6.อนุมัติรับราคา
11	สำนักงาน ชลประทานที่ 8	(1.5) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ LMC เชื่อมลำนางรอง กม.0+000 ถึง กม.2+090 ระยะทาง 2.090 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ - [2049]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	6,000,000	6.อนุมัติรับราคา
12	สำนักงาน ชลประทานที่ 8	(1.6) ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหัวงานเขื่อนลำนางรอง ระยะทาง 1.100 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ - [2050]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	3,700,000	6.อนุมัติรับราคา
13	สำนักงาน ชลประทานที่ 9	(4) ถนนภายในบริเวณหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสิียดตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร - [2062]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	17,000,000	5.เปิดซอง
14	สำนักงาน ชลประทานที่ 9	(1.881) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา - [2976]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000	6.อนุมัติรับราคา
15	สำนักงาน ชลประทานที่ 9	(1.1820) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดนครนายก - [3915]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	237,400	2.อนุมัติแผน
16	สำนักงาน ชลประทานที่ 9	(1.3441) ซ่อมแซมปั๊มน้ำไฟฟ้า สถานีสูบน้ำคลองบางพลวง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [5536]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	600,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27/03/66
17	สำนักงาน ชลประทานที่ 9	(1.4783) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานระยอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - [6878]	โครงการสนับสนุนการ บริหารจัดการน้ำและงาน ชลประทาน	1,000,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18	สำนักงาน ชลประทานที่ 9	(32) ประตุระบายน้ำคลองจุกกวาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบาง อ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก - [9883]	โครงการป้องกันและ บรรเทาภัยจากน้ำ	28,788,000	6.อนุมัติรับราคา
19	สำนักงาน ชลประทานที่ 10	(1.268) ก่อสร้างบ้านพักผู้รักษาอาคาร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านถนนใหญ่ โครงการ ชลประทานลพบุรี ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [274]	ผลผลิตการจัดการงาน ชลประทาน	650,000	5.เปิดซอง
20	สำนักงาน ชลประทานที่ 10	(189) ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1 ซ้าย - 19 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 5,500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [949]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	24,000,000	6.อนุมัติรับราคา
21	สำนักงาน ชลประทานที่ 10	(1.1080) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท - [3175]	โครงการสนับสนุนการ บริหารจัดการน้ำและงาน ชลประทาน	1,000,000	2.อนุมัติแผน
22	สำนักงาน ชลประทานที่ 10	(1.3723) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5818]	โครงการสนับสนุนการ บริหารจัดการน้ำและงาน ชลประทาน	1,000,000	2.อนุมัติแผน
23	สำนักงาน ชลประทานที่ 10	(1.5036) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนา นิคม จังหวัดลพบุรี - [7131]	โครงการสนับสนุนการ บริหารจัดการน้ำและงาน ชลประทาน	1,000,000	2.อนุมัติแผน
24	สำนักงาน ชลประทานที่ 10	(1.5806) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลสร้างโคก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี - [7901]	โครงการสนับสนุนการ บริหารจัดการน้ำและงาน ชลประทาน	1,000,000	2.อนุมัติแผน
25	สำนักงาน ชลประทานที่ 10	(1.5824) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ชลประทาน โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี - [7919]	โครงการสนับสนุนการ บริหารจัดการน้ำและงาน ชลประทาน	1,000,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26	สำนักงาน ชลประทานที่ 10	(1.5825) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี - [7920]	โครงการสนับสนุนการ บริหารจัดการน้ำและงาน ชลประทาน	1,000,000	2.อนุมัติแผน
27	สำนักงาน ชลประทานที่ 10	(1.5932) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [8027]	โครงการสนับสนุนการ บริหารจัดการน้ำและงาน ชลประทาน	1,000,000	6.อนุมัติรับราคา
28	สำนักงาน ชลประทานที่ 11	(1.16) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ประตุระบายน้ำบึงพ่อห้าลูก โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา - [547]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	8,000,000	2.อนุมัติแผน
29	สำนักงาน ชลประทานที่ 11	(1.17) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ประตุระบายน้ำบึงคุดซ้อน โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา - [548]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	8,000,000	2.อนุมัติแผน
30	สำนักงาน ชลประทานที่ 11	(1.18) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ประตุระบายน้ำบึงคู โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา - [549]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	8,000,000	2.อนุมัติแผน
31	สำนักงาน ชลประทานที่ 11	(1.680) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัด ฉะเชิงเทรา - [2775]	โครงการสนับสนุนการ บริหารจัดการน้ำและงาน ชลประทาน	1,000,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
32	สำนักงาน ชลประทานที่ 11	(1.2929) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ชลประทาน โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี - [5024]	โครงการสนับสนุนการ บริหารจัดการน้ำและงาน ชลประทาน	1,000,000	6.อนุมัติรับราคา
33	สำนักงาน ชลประทานที่ 11	(1.3155) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี - [5250]	โครงการสนับสนุนการ บริหารจัดการน้ำและงาน ชลประทาน	1,000,000	6.อนุมัติรับราคา

ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27/03/66
34	สำนักงาน ชลประทานที่ 11	(16) สถานีสูบน้ำเชื่อมต่อแก้มลิงคลองเปรมประชากร และส่วนประกอบอื่น แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [9867]	โครงการป้องกันและ บรรเทาภัยจากน้ำ	180,000,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
35	สำนักงาน ชลประทานที่ 12	(1.19) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 5ขวา-1ขวา (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรม ธาตุ ตำบลดงคอน อำเภอสรคบุรี จังหวัดชัยนาท - [550]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	4,925,000	6.อนุมัติรับราคา
36	สำนักงาน ชลประทานที่ 12	(103) คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยทัพทัน ระยะที่ 3 ระยะทางรวม 6.5 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลลุดกู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี - [9954]	โครงการป้องกันและ บรรเทาภัยจากน้ำ	83,293,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
37	สำนักงาน ชลประทานที่ 13	(1.6290) ซ่อมแซมตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-3ขวา-11ซ้าย-2ซ้าย กม.2+400 ถึง กม.3+700 จำนวน 8,000 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลบาง เลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี - [8385]	โครงการสนับสนุนการ บริหารจัดการน้ำและงาน ชลประทาน	4,500,000	2.อนุมัติแผน
38	สำนักงาน ชลประทานที่ 13	(14) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม - [9789]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	260,000,000	2.อนุมัติแผน
39	สำนักงาน ชลประทานที่ 14	(108) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำตะแบกโพรง(ปชด.) ตำบลอ่างทอง อำเภอทับ สะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [868]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	40,000,000	3.ประกาศ TOR
40	สำนักงาน ชลประทานที่ 14	(1.311) ปรับปรุงท่อบนดิน และอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำน้ำวัลเปรียง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสมาธิย้อยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [1354]	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	8,500,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
41	สำนักงาน ชลประทานที่ 14	(26) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรตำบลแสงอรุณอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [1733]	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	15,000,000	6.อนุมัติรับราคา
42	สำนักงาน ชลประทานที่ 14	(1.7) ซ่อมแซมถนนทางลำเลียงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.0+725 ฝายส่งน้ำ และบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ระยะทาง 2.600 กม. ตำบล หนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [2051]	โครงการสนับสนุนการ บริหารจัดการน้ำและงาน ชลประทาน	9,547,200	6.อนุมัติรับราคา
43	สำนักงาน ชลประทานที่ 14	(18) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 16ซ้าย ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2ระยะทาง 6.000 กม. ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [2076]	โครงการสนับสนุนการ บริหารจัดการน้ำและงาน ชลประทาน	24,000,000	6.อนุมัติรับราคา
44	สำนักงาน ชลประทานที่ 14	(1.4257) โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาคองส่งน้ำ 1 ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา 1 (คลองสาย หัวหิน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี - [6352]	โครงการสนับสนุนการ บริหารจัดการน้ำและงาน ชลประทาน	934,600	6.อนุมัติรับราคา
45	สำนักงาน ชลประทานที่ 15	(1.72) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองท่าเสา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาปากพองล่าง ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [603]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	9,665,000	6.อนุมัติรับราคา
46	สำนักงาน ชลประทานที่ 15	(68) ปรับปรุงผิวทางถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ พื้นที่ MC2 กม.0+200 ถึง กม. 5+300 ความยาว 5.100 กม. ตำบลเชียรเข้ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [828]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	20,350,000	6.อนุมัติรับราคา
47	สำนักงาน ชลประทานที่ 15	(70) ปรับปรุงประตูระบายน้ำสุขุมพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพองล่าง ตำบลปากพองฝั่งตะวันตก อำเภอปากพอง จังหวัด นครศรีธรรมราช - [830]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	15,000,000	2.อนุมัติแผน
48	สำนักงาน ชลประทานที่ 15	(72) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านศาลาแก้ว โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพองล่าง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [832]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	16,000,000	6.อนุมัติรับราคา
49	สำนักงาน ชลประทานที่ 15	(73) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1 พื้นที่ MD7 กม.4+400 ถึง กม.17+833 ความ ยาว 13.433 กม. ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [833]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	17,000,000	6.อนุมัติรับราคา
50	สำนักงาน ชลประทานที่ 15	(1.2519) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดนครศรีธรรมราช - [4614]	โครงการสนับสนุนการ บริหารจัดการน้ำและงาน ชลประทาน	158,700	6.อนุมัติรับราคา

ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27/03/66
51	สำนักงาน ชลประทานที่ 15	(1.2567) ขุดลอกคลองโดยรถขุดข้างเขมาคลองแปลงสาธิต หมู่ที่ 1 ตำบลห้องลำเจียก อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จำนวน 9 สาย - [4662]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	450,000	6.อนุมัติรับราคา
52	สำนักงาน ชลประทานที่ 15	(1.2584) ขุดลอกคลองโดยรถขุดข้างเขมา คลอง 6R-MD6 (คลองบางทวยเทพ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลบ้านเนิน อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [4679]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000	6.อนุมัติรับราคา
53	สำนักงาน ชลประทานที่ 15	(1.2585) ขุดลอกคลองโดยรถขุดข้างเขมา คลองบางท่าขนาน หมู่ 4 ตำบลบ้านเนิน อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง - [4680]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000	6.อนุมัติรับราคา
54	สำนักงาน ชลประทานที่ 15	(1.6421) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [8516]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000	6.อนุมัติรับราคา
55	สำนักงาน ชลประทานที่ 16	(4) เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำคลองท่าจิวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลท่าจิว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง - [9754]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	90,000,000	6.อนุมัติรับราคา
56	สำนักงาน ชลประทานที่ 17	(1.173) บ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว (หัวงานป่าเสม็ด) จำนวน 8 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก อำเภอสู่ไทยโก-ลก จังหวัดนราธิวาส - [179]	ผลผลิตการจัดกรงานชลประทาน	4,500,000	6.อนุมัติรับราคา
57	สำนักงาน ชลประทานที่ 17	(1.78) ระบบรักษาความปลอดภัย ถัดวงจรปิด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [471]	ผลผลิตการจัดกรงานชลประทาน	1,200,000	6.อนุมัติรับราคา
58	สำนักงาน ชลประทานที่ 17	(1.77) ปรับปรุงท่อลอดถนนคันกันน้ำโตะแดงศรีพจน์ จำนวน 12 แห่ง ตำบลโฆสิต อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [608]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	9,000,000	6.อนุมัติรับราคา
59	สำนักงาน ชลประทานที่ 17	(1.443) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองเจาะบือราพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา - [1486]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	950,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
60	สำนักงาน ชลประทานที่ 17	(1.2953) ทำนบของป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำสายที่ 2 (นานาค) ตำบลนานาค อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส - [5048]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	170,000	6.อนุมัติรับราคา
61	สำนักงาน ชลประทานที่ 17	(1.4664) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านตะลิเ่ว ตำบลปะเต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา - [6759]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	2,000,000	6.อนุมัติรับราคา
62	กองพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง	(1.18) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแอ่ง จังหวัดตราด - [9389]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	2,380,000	2.อนุมัติแผน
63	กองพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง	(25) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.21 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุ่ย ตำบลเกียนหัก อำเภอขลุ่ย จังหวัดจันทบุรี - [9434]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	20,000,000	2.อนุมัติแผน
64	กองพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง	(8) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกิงพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี - [9783]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	90,000,000	5.เปิดซอง
65	กองพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง	(9) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี - [9784]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	110,000,000	5.เปิดซอง
66	กองพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง	(15) แก้มลิงเกาะพระทองพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.55 ล้าน ลบ.ม. ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา - [9790]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	94,556,400	6.อนุมัติรับราคา
67	กองพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง	(1.3) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการประดูระบบน้ำคลองกลายบ้านนาขุน ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช - [9821]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	1,705,000	2.อนุมัติแผน
68	สำนักเครื่องจักรกล	(273) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองนางหงษ์ ตำบลคลองदान อำเภอบางป่อง จังหวัดสมุทรปราการ - [1033]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	76,770,400	5.เปิดซอง
69	สำนักเครื่องจักรกล	(1.1) รถบดล้อเหล็กชนิดเดินตาม ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม จำนวน 3 คัน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรุงเทพมหานคร - [1777]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,770,000	5.เปิดซอง
70	สำนักเครื่องจักรกล	(2) รถดักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 6 คัน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรุงเทพมหานคร - [1804]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	21,120,000	5.เปิดซอง

ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27/03/66
71	สำนักเครื่องจักรกล	(3) รถขุดดินตะขบ ขนาด 120 แรงม้า จำนวน 3 คัน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรุงเทพมหานคร - [1805]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	12,000,000	5.เปิดซอง
72	สำนักเครื่องจักรกล	(4) รถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แรงม้า จำนวน 3 คันสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรุงเทพมหานคร - [1806]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	6,090,000	5.เปิดซอง
73	สำนักเครื่องจักรกล	(5) รถบดล้อหนามชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 ตัน จำนวน 3 คัน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรุงเทพมหานคร - [1807]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	7,500,000	5.เปิดซอง
74	สำนักงานเลขานุการกรม	(1.163) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หลังที่ 3 และหลังที่ 4 - [169]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	2,520,000	6.อนุมัติรับราคา
75	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.71) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ.2566 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2166]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	9,980,000	5.เปิดซอง
76	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.84) โครงการศึกษาวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำชี ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2179]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	5,000,000	3.ประกาศ TOR
77	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.131) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) พ.ศ.2566 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2226]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	3,000,000	5.เปิดซอง
78	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(7) งานไตรมาสเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทาน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [9193]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	16,585,300	6.อนุมัติรับราคา
79	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(9) สำรองรูปตัดลำน้ำและจัดทำ rating curve สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [9195]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	46,640,000	6.อนุมัติรับราคา
80	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(3) อาคารชลประทาน - [9364]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	20,000,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
81	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(4) สะพานรถยนต์ทางหลวง จำนวน 6 แห่ง - [9365]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	52,756,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
82	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(1.1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [9370]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	5,000,000	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
83	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	(7) จัดทำครุภัณฑ์ระบบสำรวจทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่อการชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด - [1776]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	6,220,000	6.อนุมัติรับราคา
