



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘, ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/ ๑๒๓/ ๑๐๕๖๖ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ จากระบบติดตาม Cen Project) ๙๒๑๐๑๙

เรียน อช. สำนานาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ มีข้อสั่งการให้กองแผนงานสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกสัปดาห์ นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยกรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๐๖๕ รายการ งบประมาณ ๗๐,๖๘๘.๐๖๒๙ ล้านบาท ผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR จำนวน ๑๑๑ รายการ งบประมาณ ๑,๒๘๘.๖๐๗๘ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๓๔ รายการ งบประมาณ ๒,๖๖๖.๙๑๐๕ ล้านบาท เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา จำนวน ๓๘๗ รายการ งบประมาณ ๕,๙๒๒.๕๕๖๒ ล้านบาท ทำข้อผูกพัน จำนวน ๙,๓๒๖ รายการ งบประมาณ ๖๐,๐๔๑.๘๓๙๑ ล้านบาท ยกเลิก จำนวน ๑๐๔ รายการ งบประมาณ ๕๓๘.๑๔๙๓ ล้านบาท และรายการ Lump Sum จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๒๒๙.๐๐๐๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายงานงานปีเดียวต้องก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ จากการตรวจสอบ พบว่า ยังมีรายการงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๖๐๑ รายการ งบประมาณ ๖,๖๔๓.๓๐๐๔ ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประเภทซ่อมแซม/ปรับปรุงงานชลประทาน จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายการงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ตาม QR Code ท้ายหนังสือมาด้วยแล้ว

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

- ทราบ

๖ ๕๖๖ ผอ.สอน., ผอ.ร.ทอ., ทน.๑-๙ ผอ.

|| ลจ ผท.ผอ. (พด.ผอ.)

เพื่อโปรดทราบ เร่งรัดดำเนินการ

(นายธนศรี สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๖



รายการงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน

Handwritten signature and initials


- ส่วนกลาง

หน่วย : ล้านบาท

ภาพรวม

การประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 26 ก.ค. 65 มีมติให้ **รายการงานปีเดียวต้องก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาส 1**

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวม	9,958	69,920.91	111	1,289.61	134	2,666.91	387	5,922.56	9,326	60,041.84
กพก.	158	13,162.81	6	186.40	4	275.22	9	1,032.56	139	11,668.64
สพญ.	178	11,144.59			21	857.86	8	1,762.91	149	8,523.82
สคก.	370	1,464.84	1	30.00			10	192.16	359	1,242.68
สบอ.	228	706.59	16	79.38	2	19.98	8	142.55	202	464.67
สบก.	32	598.70			9	61.00	3	33.87	20	503.83
สจด.	49	272.55					8	37.21	41	235.34
สลก.	5	102.97	1	3.00			3	50.89	1	49.08
สสร.	39	513.24			1	6.22	8	54.40	30	452.61
สอส.	13	331.04			1	55.00	5	29.00	7	247.04
สมด.	48	5,538.62							48	5,538.62

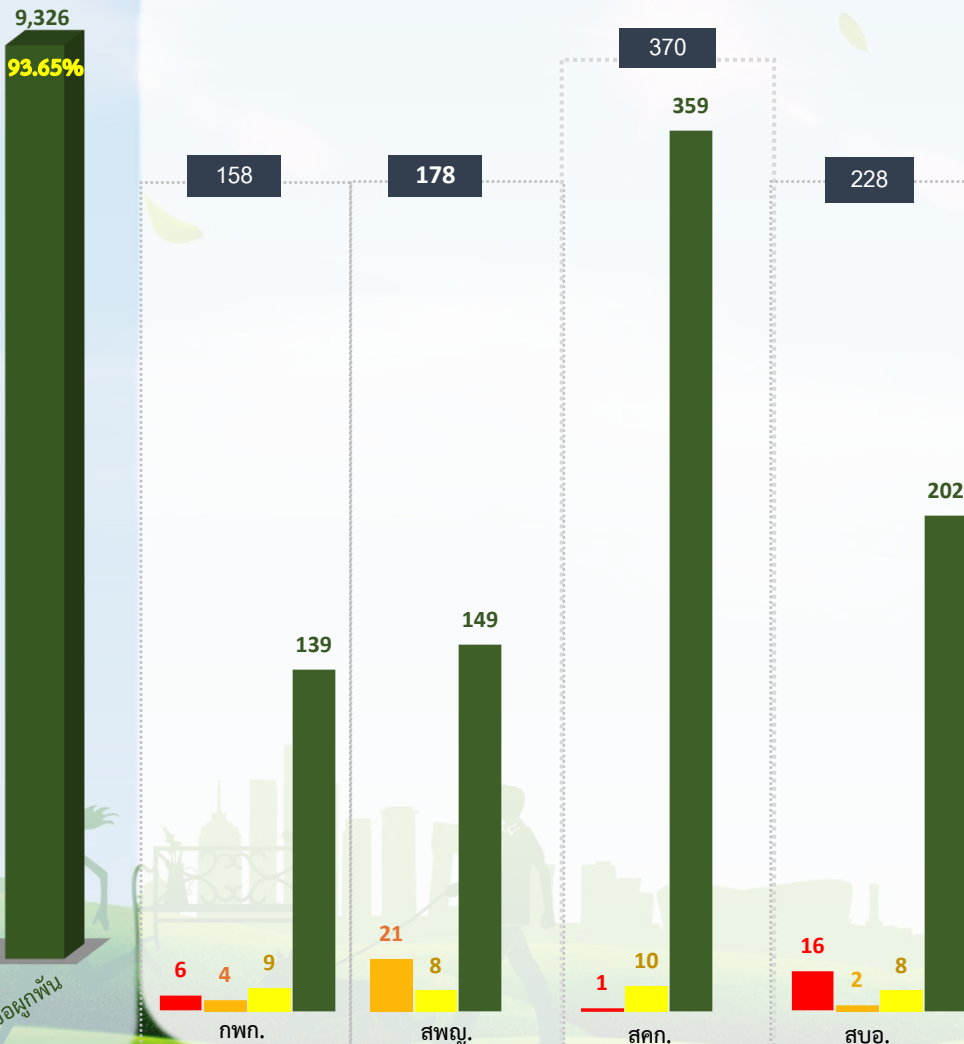

หมายเหตุ
 ไม่รวมรายการ จำนวน 107 รายการ งบประมาณ 767.15 ล้านบาท ดังนี้
 - ยกเลิก จำนวน 104 รายการ งบประมาณ 538.15 ล้านบาท
 - รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

- ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา
- ทำข้อผูกพัน

ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR 1.11%
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1.35%
 เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา 3.89%
 ทำข้อผูกพัน 93.65%



- ส่วนภูมิภาค

หน่วย : ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน		สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ				จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สขป. 1	418	1,522.48			1	3.00	12	44.90	405	1,474.58	สขป. 10	608	1,032.68	22	63.65	3	48.51	6	126.24	577	794.28
สขป. 2	403	1,292.27	1	0.81	2	2.00	7	41.85	393	1,247.61	สขป. 11	580	1,573.54	11	71.51	7	210.80	52	133.23	510	1,158.00
สขป. 3	360	2,212.09	1	46.10	6	27.29	4	9.88	349	2,128.82	สขป. 12	671	1,468.39	13	91.05	1	1.50	23	132.56	634	1,243.28
สขป. 4	534	1,571.89	2	65.54	5	178.98	3	17.50	524	1,309.87	สขป. 13	611	1,321.28	3	313.77	1	20.00	3	15.88	604	971.63
สขป. 5	494	2,660.15					6	30.62	488	2,629.53	สขป. 14	355	2,960.75	1	40.00	14	174.77	33	283.40	307	2,462.59
สขป. 6	500	2,834.39	2	10.95	1	50.00	7	53.80	490	2,719.64	สขป. 15	500	1,215.76	6	37.20	9	93.93	31	226.63	454	858.01
สขป. 7	654	5,051.26			5	182.50	4	5.62	645	4,863.14	สขป. 16	518	3,208.96	5	87.48	5	316.00	26	867.03	482	1,938.45
สขป. 8	625	3,421.90	4	80.75	2	9.70	14	143.85	605	3,187.60	สขป. 17	265	1,082.67	2	23.75	4	41.40	42	241.96	217	775.56
สขป. 9	742	1,654.49	14	58.26	30	31.26	52	212.08	646	1,352.89											

ไม่รวมรายการ จำนวน 107 รายการ งบประมาณ 767.15 ล้านบาท ดังนี้
 - ยกเลิก จำนวน 104 รายการ งบประมาณ 538.15 ล้านบาท
 - รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

