



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๒๕๖๖/๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อมูลการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผอ.ผง. สำนัก ผผง.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำข้อมูลการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สรุปรายงานความก้าวหน้า โดยแยกตามปีงบประมาณ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๔ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๑,๘๓๖.๖๘ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๑,๖๓๔.๒๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๕๘๐.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๓ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา ๘๘๘.๐๔ ตัน ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา ๑,๒๘๓.๗๖ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๔๒.๙๕ ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๓ รายการ และยกเลิก จำนวน ๘ รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๘ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๘๕๑.๖๘ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๗๓๙.๖๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑๐๓.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๕ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา ๖๘๗.๒๒ ตัน ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา ๓๑.๕๓ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๙ ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ (ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ เปิดซอง จำนวน ๑ รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน ๑ รายการ) อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๔๑ รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารรัตน์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำนักเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖



- ทราบ

โธม โส.สน., ผอ.บ.กต., ทน. ๑-๙ มอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)


ผส.บอ.



การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2566

กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566

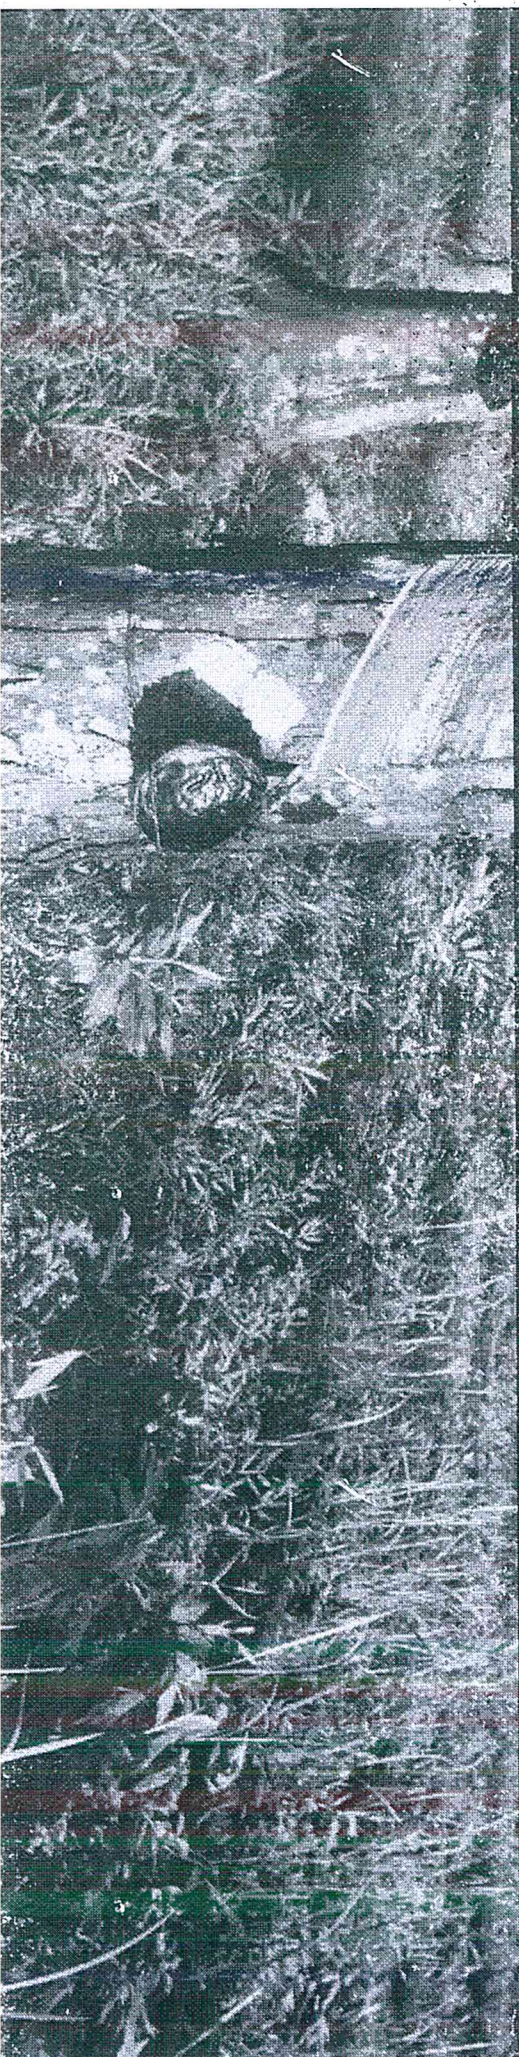



การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ดำเนินการต่อไปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ร.บ. 2565


ประเภท	งบประมาณโหนดจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,634.22	134	898.04
ผล	1,580.71 (96.73%)	123	1,283.76 (142.95%)

Para Asphalt (Concrete)			
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,605.81	130	792.54
ผล	1,552.30 (95.93%)	119	1,176.62 (148.46%)

Para Soil Cement			
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	28.41	4	105.50
ผล	28.40 (99.96%)	4	107.14 (101.55%)



หมายเหตุ : ยกเลิก 8 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการเงินกู้ พ.ศ. 2563
และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

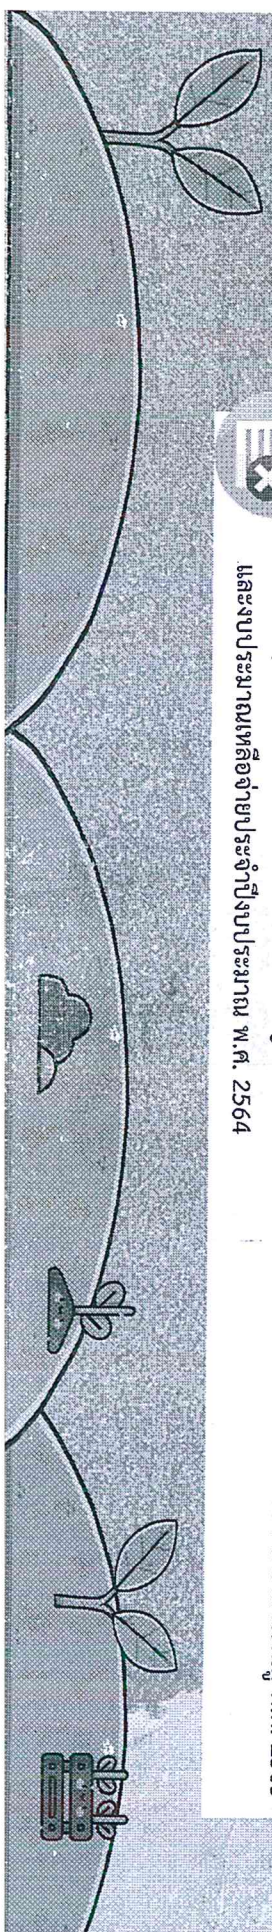

การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยวิทยางานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผน / ผล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด

แผนการดำเนินงาน

ภาค	จำนวน (รายการ) P	งบประมาณ (ล้านบาท) B	น้ำยางขึ้น (ตัน) V
รวม 26 จ.	48	851.68	687.22
เหนือ	7	154.00	181.71
ตะวันออกเฉียงเหนือ	20	290.51	151.99
กลาง	9	167.74	292.01
ตะวันออก	2	42.50	14.49
ใต้	5	131.17	36.43
ได้ขยายแผน	5	65.77	10.59

ผลการดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 66 (ล้านบาท)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางขึ้น (ตัน)
แผน	851.68	739.63	48	687.22
ผล	103.94 (12.20%)	103.94 (14.05%)	4	31.53 (4.59%)

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการ (ประเภทติดตั้งห้อง 1 รายการ การเปิดของ 1 รายการ การอนุมัติบริการ 1 รายการ) อยู่ระหว่างก่อสร้าง 41 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 4 รายการ

