



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๒๕๘๓/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖)

๑๒๓๓๔๐

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อชช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววารารัตน์ ทัดพงษ์ศรีธรร)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
เพื่อโปรดทราบ

(นายโอรจน์วิวัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๖

-ทราบ

โยธนา นอ.คณ., นอ.กต., ทน.๑-ส.นอ.

และ ผ.ท.นอ.(ม.นอ., ท.นอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายเนนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2566)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณจำนวน 6 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 101,657.02 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 45,730.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.99 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 14,467 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 378 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.61 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 809 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.59 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 8,687 รายการ คิดเป็นร้อยละ 60.05 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4,444 รายการ คิดเป็นร้อยละ 30.72 และยกเลิก จำนวน 149 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.03 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พ.ร.บ.) งบประมาณ จำนวน 77,494.48 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 35,241.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.48 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 7,324.37 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 4,081.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.72 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 70,170.11 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 31,160.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.41 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 10,065 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 65 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.65 เนื่องจากส่วนใหญ่ 1) ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เพราะมีผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้างยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว 2) ผู้ยื่นเสนอราคามีการขออุทธรณ์และต้องรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน และ 3) มีการปรับแก้ไขรายละเอียดของราคากลาง และรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 7,464 รายการ คิดเป็นร้อยละ 74.16 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2,391 รายการ คิดเป็นร้อยละ 23.75 และยกเลิก จำนวน 145 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.44 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้น และเป็นรายการซ้ำซ้อน

2. งบเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 12,009.81 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 6,839.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.95 งบประมาณเหลือจ่ายจากงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 และงบประมาณที่ต้องดำเนินต่อ 5,165.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.01 จำนวนรายการทั้งสิ้น 1,015 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 603 รายการ คิดเป็นร้อยละ 59.41 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 410 รายการ คิดเป็นร้อยละ 40.39 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.20 คือ ประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองคู (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสสามโคก จังหวัดปทุมธานี และประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย (ขนาด 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3. งบกลาง พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 4,896.45 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 2,843.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.06 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,087 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ จำนวน 71 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.53 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,014 รายการ คิดเป็นร้อยละ 93.29 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.18 คือ ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง สถานีสูบน้ำบ้านหนองขาม โครงการชลประทานสุพรรณบุรี และซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง สถานีสูบน้ำบ้านจิกรากษา โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เนื่องจากเมื่อตรวจสอบและประเมินค่าเสียหายพบว่ามีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

4. งบกลาง พ.ศ. 2566 งบประมาณ จำนวน 4,809.77 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 207.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.31 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,188 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ 378 รายการ คิดเป็นร้อยละ 31.82 ส่วนใหญ่เป็นโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี 2565 ซึ่งกรม. อนุมัติ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 344 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.96 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 465 รายการ คิดเป็นร้อยละ 39.14 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.08 คือ โครงการจัดหารถปั้นจั่นล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกพับไปตามกฎหมาย

5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ จำนวน 1,411.51 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 97.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.94 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,020 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 400 รายการ คิดเป็นร้อยละ 39.22 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 620 รายการ คิดเป็นร้อยละ 60.78

6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ จำนวน 1,035.00 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 500.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.37 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 92 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 84 รายการ คิดเป็นร้อยละ 91.30 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.70



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดทำโดย
ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2566



รายละเอียดข้อมูล

1

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบ พ.ร.บ.)

2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามสำนัก/กอง

2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามสำนัก/กอง

2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566

2.7 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566

2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566

3

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณงานกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	
รวมทั้งสิ้น	101,657.02	45,730.76	44.99	14,467	378	809	8,687	4,444	ยกเลิก 149 รายการ
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 (กรมบัญชีกลาง)	77,494.48	35,241.93	45.48	10,065		65	7,464	2,391	
1.1 งบรายจ่ายประจำ	7,324.37	4,081.48	55.72						
1.2 งบรายจ่ายลงทุน	70,170.11	31,160.45	44.41	10,065		65	7,464	2,391	ยกเลิก 145 รายการ
2. งบเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2565	12,009.81	6,839.88	56.95	1,015			603	410	ยกเลิก 2 รายการ
3. งบกลาง พ.ศ. 2565	4,896.45	2,843.08	58.06	1,087			71	1,014	
3.1 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	3,872.34	2,088.74	53.94	1,036			42	992	
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565	1,126.19	1,053.77	93.57	620			4	614	ยกเลิก 2 รายการ
- จัดหารถปั้นจั่นล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกปรับไปตามกฎหมาย	97.92	97.92	100.00	1				1	
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566	1,137.66	896.74	78.82	407			30	377	
- โครงการจัดหาเครื่องจักรกลสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง	663.88			3			3		อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 เพิ่มเติม	190.14	40.31	21.20	4			4		
- โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว จำนวน 30 เครื่อง	656.55			1			1		อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
3.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2565	1,024.11	754.34	73.66	51			29	22	
4. งบกลาง พ.ศ. 2566	4,809.77	207.32	4.31	1,188	378	344	465	1	
4.1 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	4,207.98	179.87	4.27	1,154	360	344	449	1	
- โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย (สนับสนุนโครงการหลวงเลอตอ)	8.86	0.92	10.38	1			1		
- โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิค	395.50			2		2			
- โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี 2565	2,954.40	129.99	4.40	1,142	352	342	448		ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
- โครงการจัดหารถปั้นจั่นล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกปรับไปตามกฎหมาย	48.96	48.96	100.00	1				1	
- โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ)	300.00			1	1				ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566
- โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่	500.26			7	7				ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566
4.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2566	601.79	27.45	4.56	34	18		16		
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2566	1,411.51	97.94	6.94	1,020		400		620	
6. จัดรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2566	1,035.00	500.61	48.37	92			84	8	



2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลจาก ระบบติดตาม Cen Project

ณ วันที่ 18 เมษายน 2566

ผลการก่อหนี้ผูกพัน

แล้วเสร็จ จำนวน 2,391 รายการ
งบประมาณ พ.ร.บ. 3,978.47 ล้านบาท

ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 9,855 รายการ (99.34%)
งบประมาณ พ.ร.บ. 66,832.80 ล้านบาท (96.10%)

ปัญหา/อุปสรรค

- ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เพราะมีผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้าง ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว
- ผู้ยื่นเสนอราคามีการขออุทธรณ์และต้องรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
- มีการปรับแก้ไขรายละเอียดของราคากลาง และรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR)

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน 65 รายการ (0.66%)

งบประมาณ พ.ร.บ. 2,709.41 ล้านบาท (3.90%)

- อนุมัติแผน 13 รายการ งบประมาณ พ.ร.บ. 71.40 ล้านบาท
- ประกาศ TOR 2 รายการ งบประมาณ พ.ร.บ. 52.00 ล้านบาท
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11 รายการ งบประมาณ พ.ร.บ. 563.58 ล้านบาท
- เปิดซอง 18 รายการ งบประมาณ พ.ร.บ. 671.39 ล้านบาท
- อนุมัติรับราคา 38 รายการ งบประมาณ พ.ร.บ. 1,857.28 ล้านบาท

✗ ยังไม่ดำเนินการ



อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



ก่อหนี้ผูกพัน



ยกเลิก

รวม

รายการ 10,065

งบ พ.ร.บ.

70,688.06

ล้านบาท

งบหลังโอน

เปลี่ยนแปลง

67,283.09

ล้านบาท

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

65

0.65%

2,709.41

2,636.80

ทำข้อผูกพัน

9,855

97.91%

66,832.80

64,474.52

ยกเลิก

145

1.44%

1,145.85

171.77

เป้าหมายเบิกจ่ายภาครัฐ

ภาพรวม 32%

36%

20%

54%

57%

45%

77%

80%

65%

100%

100%

100%

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รายจ่ายประจำรายจ่ายลงทุน

ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66



2.2

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 รายการที่ยังไม่ก่อนผูกพัน

ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 18 เมษายน 2566

- ส่วนกลาง

การประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 26 ก.ค. 65 มีมติให้ **รายการงานปีเดียวต้องก่อนผูกพันภายในไตรมาส 1**




ยังไม่ก่อนผูกพัน 65 รายการ

หน่วย : ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	อนุมัติแผนถึงประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวม	9,917	69,313.21	7	221.46	4	151.29	13	494.47	41	1,842.19	9,852	66,603.80
กพก.	155	13,020.60					3	336.00	2	238.00	150	12,446.60
สพญ.	175	10,886.44							3	1,006.45	172	9,879.99
สคก.	373	1,470.02	1	76.77			2	18.09	3	30.39	367	1,344.77
สบอ.	228	706.59					1	5.00	3	59.62	224	641.97
สบก.	32	598.70			1	12.00	1	3.00	8	58.00	22	525.70
สจค.	49	272.55									49	272.55
สลก.	5	102.97									5	102.97
สสธ.	39	513.24									39	513.24
สอส.	13	331.04					1	55.00	3	15.00	8	257.04
สมต.	46	5,518.86							1	4.00	46	5,518.86

ภาพรวม

รายการที่ยังไม่ก่อนผูกพัน 65 รายการ งบประมาณ 2,709.41 ล้านบาท

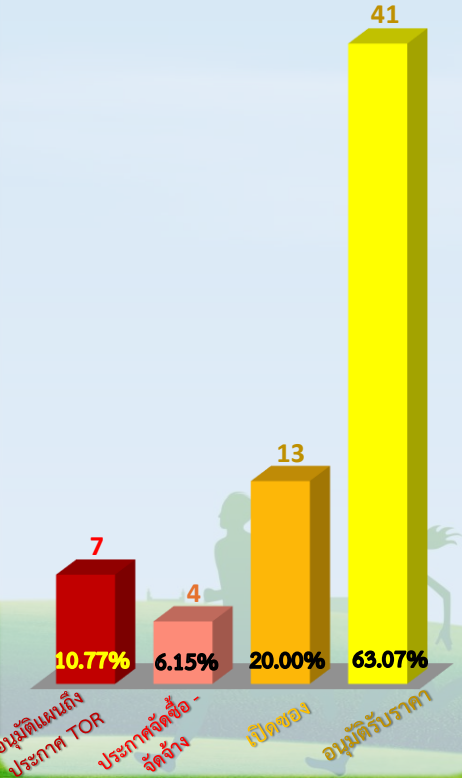

ไม่รวมรายการ จำนวน 148 รายการ งบประมาณ 1,374.85 ล้านบาท ดังนี้
 - ยกเลิก จำนวน 145 รายการ งบประมาณ 1,145.85 ล้านบาท
 - รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท



*รายการที่ยังไม่ก่อนผูกพันเป็นเฉพาะงานผูกพันใหม่

*รายการที่ยังไม่ก่อนผูกพันเป็นเฉพาะงานผูกพันใหม่

2.2

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

- ส่วนภูมิภาค

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 65 รายการ


สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	อนุมัติแผนถึงประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สขป. 1	416	1,499.48									416	1,499.48
สขป. 2	402	1,291.46									402	1,291.46
สขป. 3	358	2,211.64									358	2,211.64
สขป. 4	532	1,567.27	2	119.69			1	62.88			529	1,384.70
สขป. 5	494	2,660.15					1	50.00			494	2,660.15
สขป. 6	499	2,834.30									498	2,784.30
สขป. 7	653	5,050.92							1	37.50	652	5,013.42
สขป. 8	621	3,394.67							1	3.70	620	3,390.97
สขป. 9	738	1,654.15			1	1.00			2	45.79	735	1,607.36

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 65 รายการ

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	อนุมัติแผนถึงประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สขป. 10	607	1,032.04	1	1.00					5	4.65	601	1,026.39
สขป. 11	574	1,560.26	3	24.00					4	183.00	567	1,353.26
สขป. 12	671	1,468.39			1	83.29			1	4.93	669	1,380.17
สขป. 13	611	1,321.28					1	4.50		0.00	610	1,316.78
สขป. 14	353	2,956.44							3	63.50	350	2,892.94
สขป. 15	497	1,194.74							2	10.67	495	1,184.08
สขป. 16	517	3,158.96							1	90.00	516	3,068.96
สขป. 17	259	1,036.06							1	2.00	258	1,034.06

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 18 เมษายน 2566

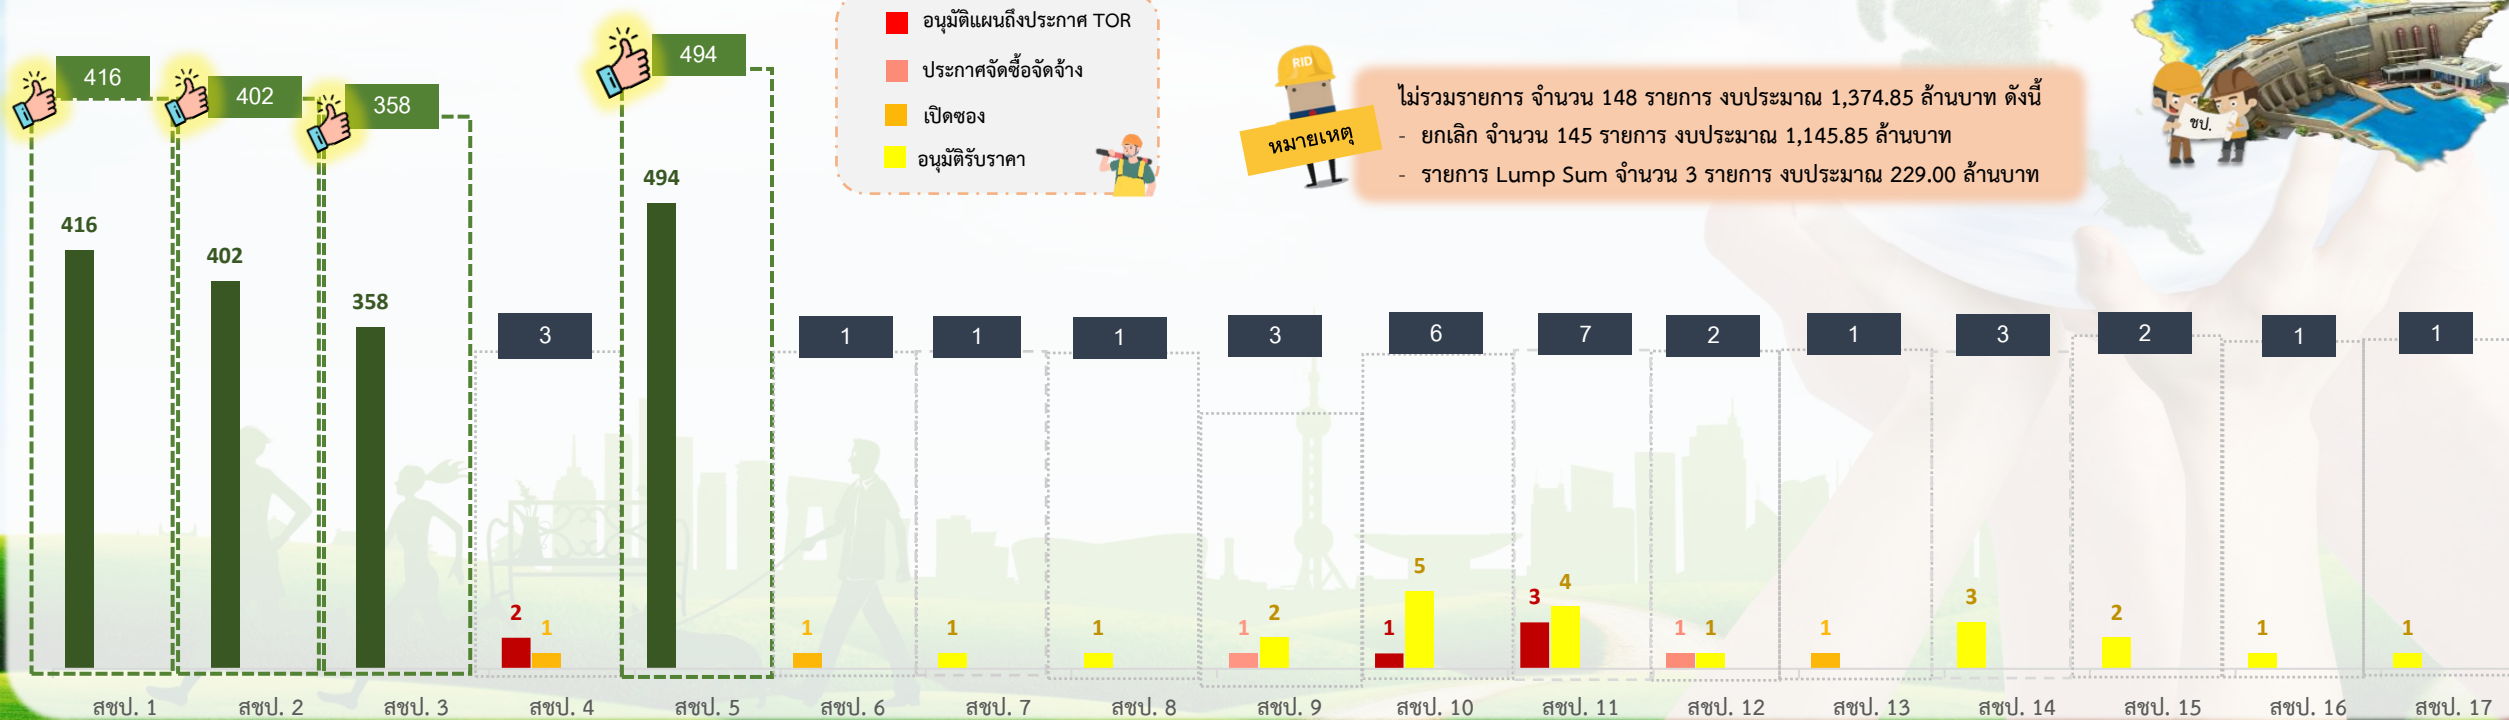

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามสำนัก/กอง

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ [New GFMS Thai](#) และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม [Cen Project](#) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566

สำนัก/กอง	งบประมาณ พ.ร.บ.	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย/งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง	จำนวนรายการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำข้อมูลผูกพัน							
						จำนวนรายการ	งบ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
										0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100 %
รวม	69,542.21	67,111.33	30,420.39	45.33	9,920	65	2,709.41	9,855	66,832.80	2,291	862	1,210	1,095	2,006	2,391
สขป. 1	1,499.48	1,428.86	919.74	64.37	416			416	1,499.48	16	27	54	68	129	122
สขป. 2	1,291.46	1,248.00	711.37	57.00	402			402	1,291.46	128	13	30	40	120	71
สขป. 3	2,211.64	2,054.16	1,051.92	51.21	358			358	2,211.64	57	40	75	49	60	77
สขป. 4	1,567.27	1,466.32	664.27	45.30	532	3	182.57	529	1,384.70	76	30	74	42	190	117
สขป. 5	2,660.15	2,545.40	1,411.54	55.45	494			494	2,660.15	47	40	57	63	95	192
สขป. 6	2,834.30	2,536.45	1,491.12	58.79	499	1	50.00	498	2,784.30	27	38	52	69	197	115
สขป. 7	5,050.92	4,871.21	3,330.70	68.38	653	1	37.50	652	5,013.42	34	39	55	90	225	209
สขป. 8	3,394.67	3,228.08	1,201.54	37.22	621	1	3.70	620	3,390.97	78	42	73	65	173	189
สขป. 9	1,654.15	1,606.38	814.03	50.67	738	3	46.79	735	1,607.36	200	83	86	92	103	171
สขป. 10	1,032.04	994.58	443.60	44.60	607	6	5.65	601	1,026.39	176	46	118	56	79	126
สขป. 11	1,560.26	1,535.70	498.35	32.45	574	7	207.00	567	1,353.26	262	62	49	44	90	60
สขป. 12	1,468.39	1,416.66	670.23	47.31	671	2	88.22	669	1,380.17	177	52	57	68	144	171
สขป. 13	1,321.28	1,278.01	553.26	43.29	611	1	4.50	610	1,316.78	175	91	71	86	114	73
สขป. 14	2,956.44	2,819.51	1,034.59	36.69	353	3	63.50	350	2,892.94	87	59	40	41	38	85
สขป. 15	1,194.74	1,120.19	391.91	34.99	497	2	10.67	495	1,184.08	223	32	72	50	76	42
สขป. 16	3,158.96	2,989.96	891.25	29.81	517	1	90.00	516	3,068.96	66	46	55	46	49	254
สขป. 17	1,036.06	981.68	277.68	28.29	259	1	2.00	258	1,034.06	48	27	40	32	53	58
กพท.	13,020.60	12,447.55	5,729.15	46.03	155	5	574.00	150	12,446.60	102	23	16	7	2	
สพญ.	10,886.44	10,982.82	3,455.77	31.47	175	3	1,006.45	172	9,879.99	115	28	14	7	2	6
สบอ.	706.59	698.16	221.65	31.75	228	4	64.62	224	641.97	20	17	92	46	24	25
สคก.	1,470.02	1,457.31	423.91	29.09	373	6	125.25	367	1,344.77	104	12	9	18	18	206
สสธ.	513.24	512.48	228.06	44.50	39			39	513.24	13	3	7	9	6	1
สบก.	598.70	598.70	141.35	23.61	32	10	73.00	22	525.70	22					
สอส.	331.04	331.04	122.12	36.89	13	5	74.00	8	257.04	8					
สจต.	272.55	255.85	124.32	48.59	49			49	272.55	7	4	10	5	9	14
สลก.	102.97	102.97	14.21	13.80	5			5	102.97	5					
สมต.	5,518.86	5,374.78	3,568.28	66.39	46			46	5,518.86	15	8	4	2	10	7
Lump Sum	229.00	228.50	34.46	15.08	3			3	229.00	3					

หมายเหตุ : ยกเลิก จำนวน 145 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1,145.85 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบกลาง เป็นต้น

สำนัก/กอง	งบประมาณ พ.ร.บ.	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย/งบหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	จำนวน รายการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำข้อผูกพัน							
						จำนวน รายการ	งบ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบ พ.ร.บ. (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
										0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100 %
รวม	69,542.21	67,111.33	30,420.39	45.33	9,920	65	2,709.41	9,855	66,832.80	2,291	862	1,210	1,095	2,006	2,391
โครงการเขื่อนทดน้ำผาจาก จังหวัดอุดรดิตต์	1,198.71	1,099.24	234.75	21.36	17			17	1,198.71	10	4	3			
โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,568.35	3,244.08	960.72	29.61	18	2	1,006.00	16	2,562.35	8	4	2	1		1
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	21,311.67	19,977.48	9,921.32	49.66	434	8	729.54	426	20,582.13	179	70	72	75	29	1
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	461.01	418.61	176.25	42.10	9			9	461.01	9					
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	411.68	930.37	18.24	1.96	13			13	411.68	9	3	1			
โครงการประตุระบายน้ำบ้านก้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	194.72	85.88	20.80	24.22	3			3	194.72	2	1				
โครงการประตุระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	164.65	158.05	55.30	34.99	4			4	164.65	2	2				
โครงการประตุระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	500.57	492.32	172.17	34.97	10			10	500.57	3	4	2		1	
โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย	139.89	287.81	105.96	36.81	8			8	139.89	7	1				
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	9,985.99	9,626.29	3,106.83	32.27	515	14	390.89	501	9,595.10	161	58	112	74	56	40
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	6,964.71	6,638.49	2,334.16	35.16	150	3	292.08	147	6,672.63	72	26	27	12	6	4
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	939.92	1,020.26	209.63	20.55	15			15	939.92	8	2	3	1	1	
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	813.25	852.72	339.34	39.80	17			17	813.25	11	4	1			1
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,140.70	2,063.70	1,077.97	52.23	711	2	23.50	709	2,117.20	156	34	67	71	153	228
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	16,692.09	16,132.03	9,429.58	58.45	7,440	34	266.30	7,406	16,425.79	1,505	619	894	810	1,630	1,948
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	30.84	30.82	1.13	3.67	3			3	30.84	3					
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง	503.83	666.97	303.12	45.45	4			4	503.83	3			1		
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	259.83	261.46	44.24	16.92	8			8	259.83	7					1
โครงการอ่างเก็บน้ำป้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพะเยา	141.00	222.91	99.37	44.58	7			7	141.00	3	2	1	1		
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	610.75	607.64	206.96	34.06	6			6	610.75	4	2				
โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	264.18	248.08	181.71	73.25	3			3	264.18	3					
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา	752.43	743.70	659.19	88.64	2			2	752.43		1				1
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตต์	535.84	362.00	252.00	69.61	10	1	0.45	9	535.39	3			3		3
ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	955.61	940.42	509.64	54.19	513	1	0.65	512	954.96	123	25	25	46	129	164

หมายเหตุ : ยกเลิก จำนวน 145 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1,145.85 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบกลาง เป็นต้น






2.5

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 18 เมษายน 2566

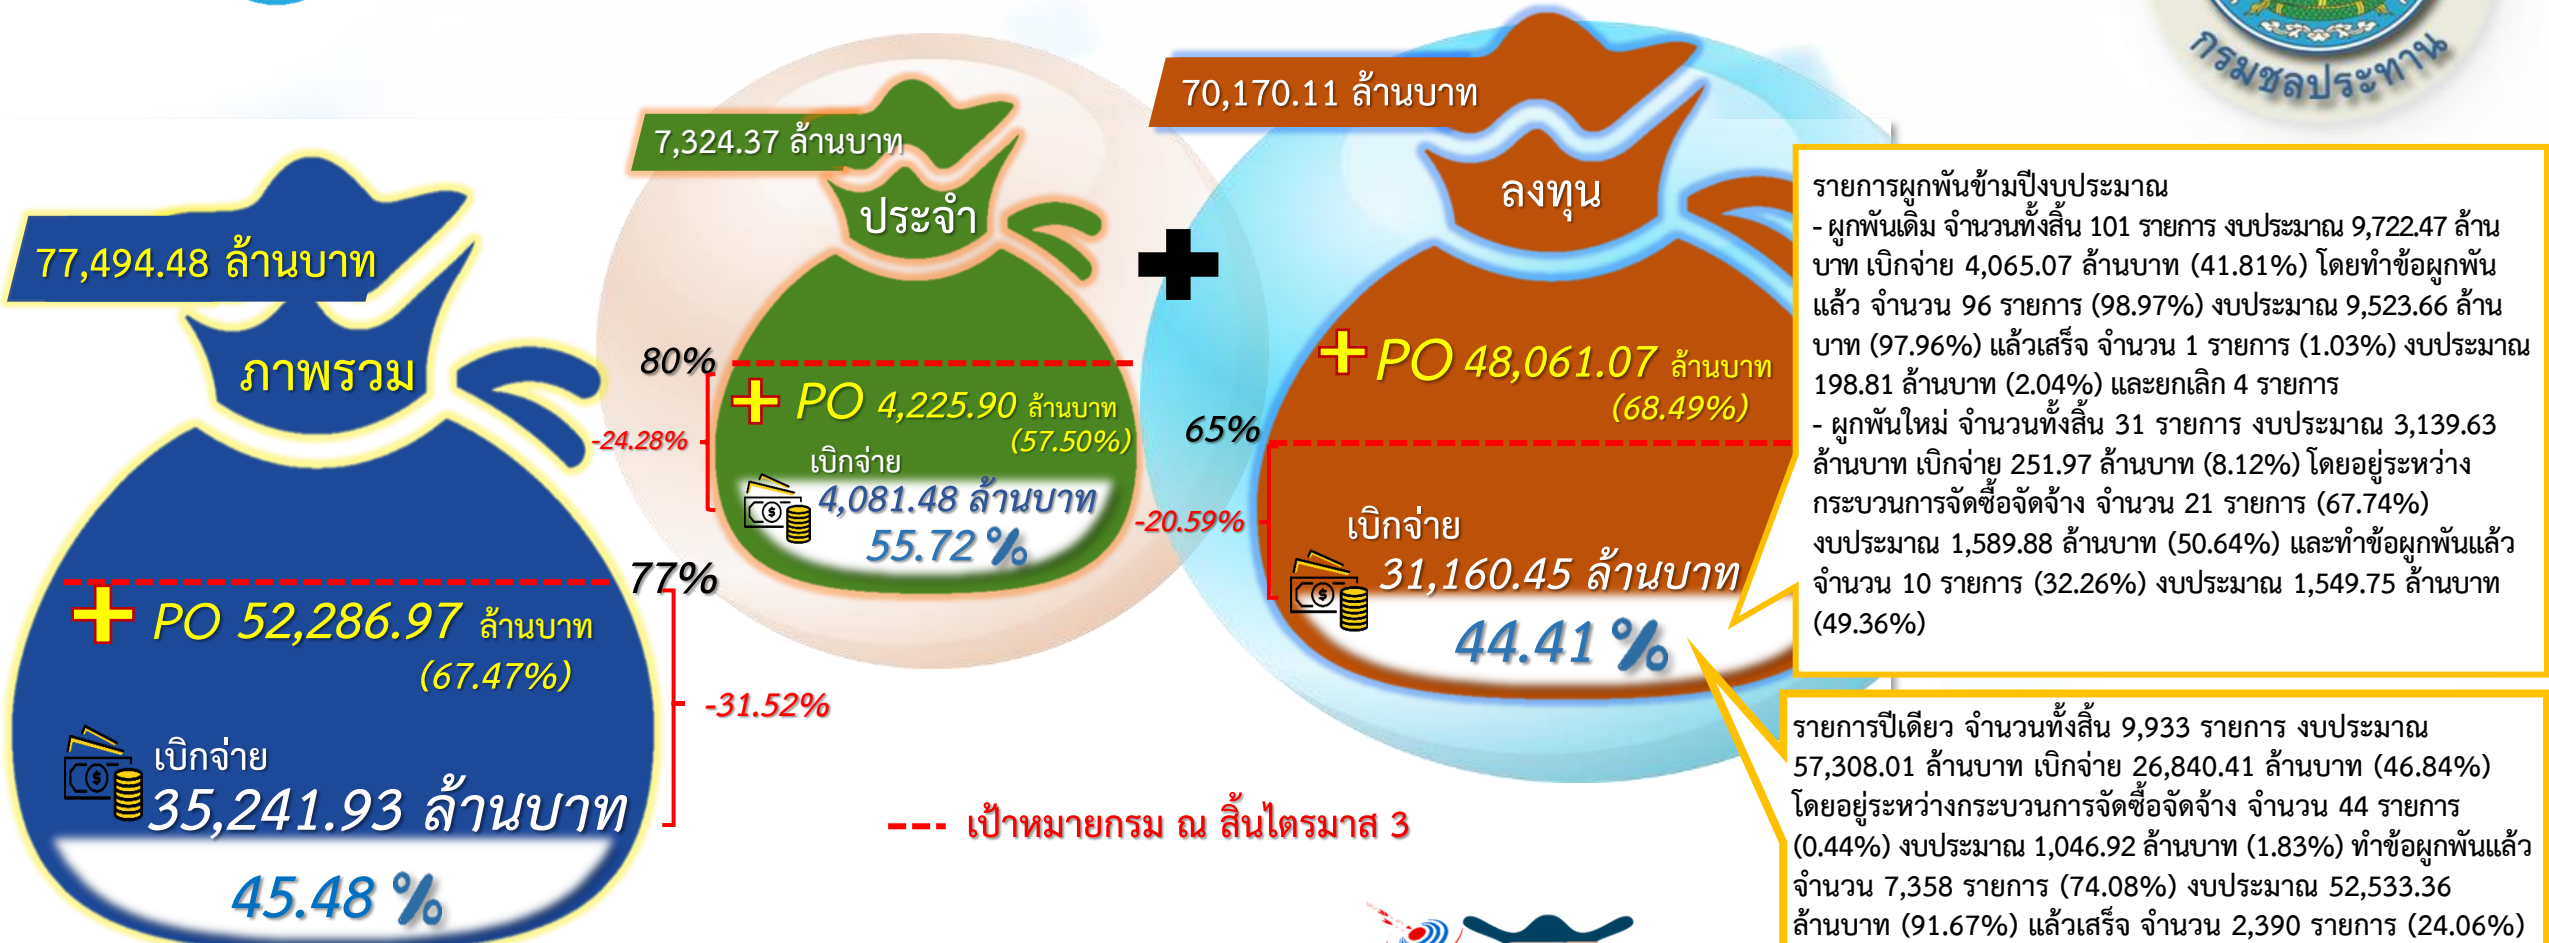

รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

- ผูกพันเดิม จำนวนทั้งสิ้น 101 รายการ งบประมาณ 9,722.47 ล้านบาท เบิกจ่าย 4,065.07 ล้านบาท (41.81%) โดยทำซื้อผูกพันแล้ว จำนวน 96 รายการ (98.97%) งบประมาณ 9,523.66 ล้านบาท (97.96%) แล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ (1.03%) งบประมาณ 198.81 ล้านบาท (2.04%) และยกเลิก 4 รายการ
- ผูกพันใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 31 รายการ งบประมาณ 3,139.63 ล้านบาท เบิกจ่าย 251.97 ล้านบาท (8.12%) โดยอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 21 รายการ (67.74%) งบประมาณ 1,589.88 ล้านบาท (50.64%) และทำซื้อผูกพันแล้ว จำนวน 10 รายการ (32.26%) งบประมาณ 1,549.75 ล้านบาท (49.36%)

รายการปีเดียว จำนวนทั้งสิ้น 9,933 รายการ งบประมาณ 57,308.01 ล้านบาท เบิกจ่าย 26,840.41 ล้านบาท (46.84%) โดยอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 44 รายการ (0.44%) งบประมาณ 1,046.92 ล้านบาท (1.83%) ทำซื้อผูกพันแล้ว จำนวน 7,358 รายการ (74.08%) งบประมาณ 52,533.36 ล้านบาท (91.67%) แล้วเสร็จ จำนวน 2,390 รายการ (24.06%) งบประมาณ 3,555.96 ล้านบาท (6.20%) และยกเลิก จำนวน 141 รายการ (1.42%) งบประมาณ 171.77 ล้านบาท (0.30%)

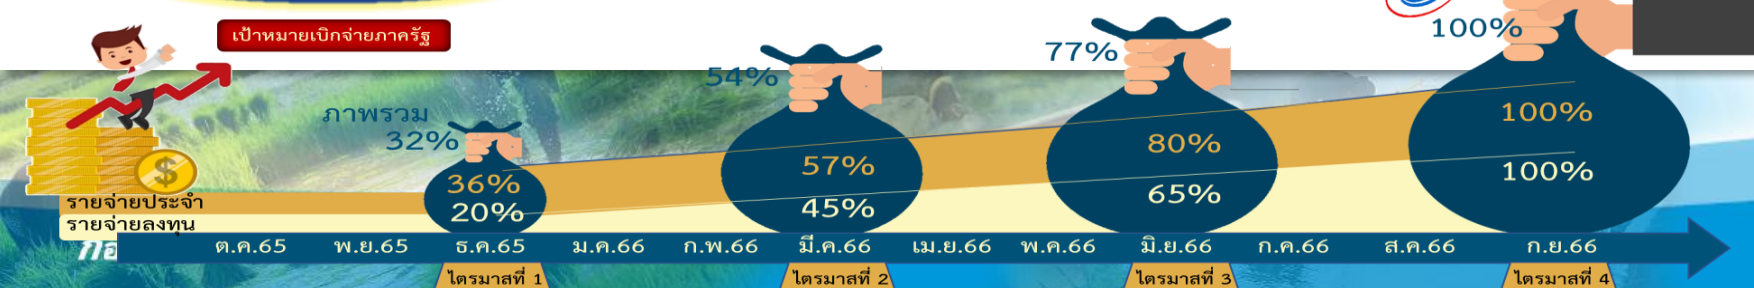



สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม ของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 18 เมษายน 2566



77,494.48 ล้านบาท

ภาพรวม



เบิกจ่าย

35,241.93 ล้านบาท

45.48%

ร้อยละ

เป้าหมายภาพรวม ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00

เป้าหมาย 100.00%

เป้าหมาย 32.00%

เป้าหมาย 54.00%

เป้าหมาย 77.00%


- ต่ำกว่าเป้าหมายกรม ร้อยละ -16.19
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (61 - 65) ร้อยละ 8.00

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
▶ เป้าหมายกรม ปี 66	10.67	21.34	32.00	39.33	46.66	54.00	61.67	69.34	77.00	84.67	92.34	100.00
▶ ผลปี 66 (77,494.48)	3.07	9.55	19.26	24.45	32.04	43.23	45.48					
▶ ผลปี 65 (77,143.43)2	2.45	7.97	16.49	21.25	28.37	38.31	43.27	51.57	61.30	66.15	73.38	84.09
▶ ผลปี 64 (74,106.98)2	0.66	4.91	12.24	16.05	22.61	34.76	39.61	48.38	59.48	64.67	68.91	83.67
▶ ผลปี 63 (69,177.56)	1.43	2.57	3.76	7.84	9.23	16.56	25.26	34.54	47.70	54.68	66.97	82.54
▶ ผลปี 62 (66,472.19)	1.36	6.82	13.73	17.52	23.68	34.85	39.31	47.16	56.76	62.33	70.47	83.17
▶ ผลปี 61 (55,620.32)	2.36	6.89	13.92	17.98	24.08	36.13	39.97	46.57	56.97	62.30	69.87	81.39
▶ เฉลี่ย 5 ปี (61-65)	1.65	5.83	12.03	16.13	21.59	32.12	37.48	45.64	56.44	62.03	69.92	82.97



สถิติการเบิกจ่าย งบรายจ่ายลงทุน ของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566


ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 18 เมษายน 2566

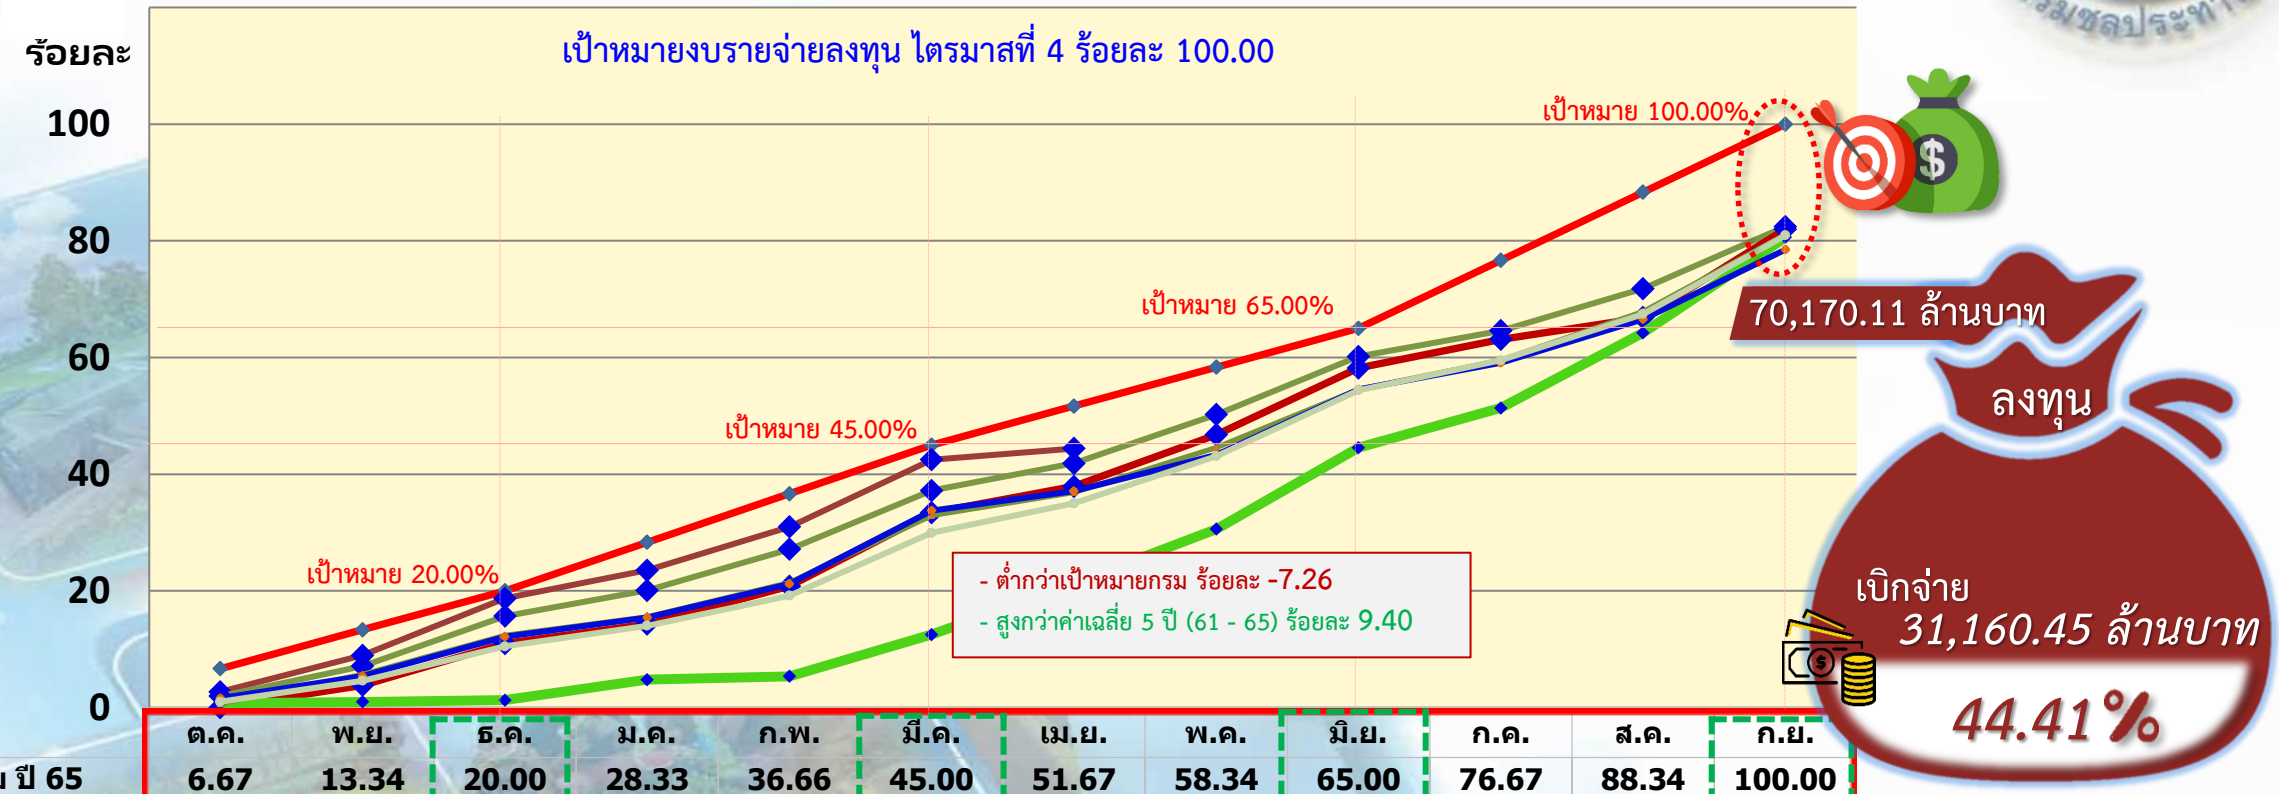

	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายกรม ปี 65	6.67	13.34	20.00	28.33	36.66	45.00	51.67	58.34	65.00	76.67	88.34	100.00
ผลปี 66 (70,682.86)	2.68	8.95	18.71	23.53	30.98	42.48	44.41					
ผลปี 65 (70,135.62) 2	1.94	7.11	15.67	20.09	27.12	37.20	41.86	50.22	60.17	64.59	71.8	82.46
ผลปี 64 (66,423.87)	0.003	3.81	10.97	14.29	20.79	33.39	37.9	46.78	58.21	63.11	66.85	82.02
ผลปี 63 (60,320.89)	0.73	0.96	1.27	4.77	5.36	12.51	21.31	30.59	44.54	51.34	64.24	80.61
ผลปี 62 (58,536.19)	0.65	5.65	12.34	15.53	21.40	32.92	36.90	44.54	54.53	59.54	67.87	81.08
ผลปี 61 (47,566.20)	1.63	5.40	12.15	15.41	21.17	33.77	37.08	43.29	54.53	59.09	66.56	78.50
เฉลี่ย 5 ปี (61 - 65)	0.99	4.59	10.48	14.02	19.17	29.96	35.01	43.08	54.40	59.53	67.46	80.93

— เป้าหมายกรม ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566 : 51.67 %
 - - - เฉลี่ย 5 ปี (61-65) : 35.01 %

ร้อยละ

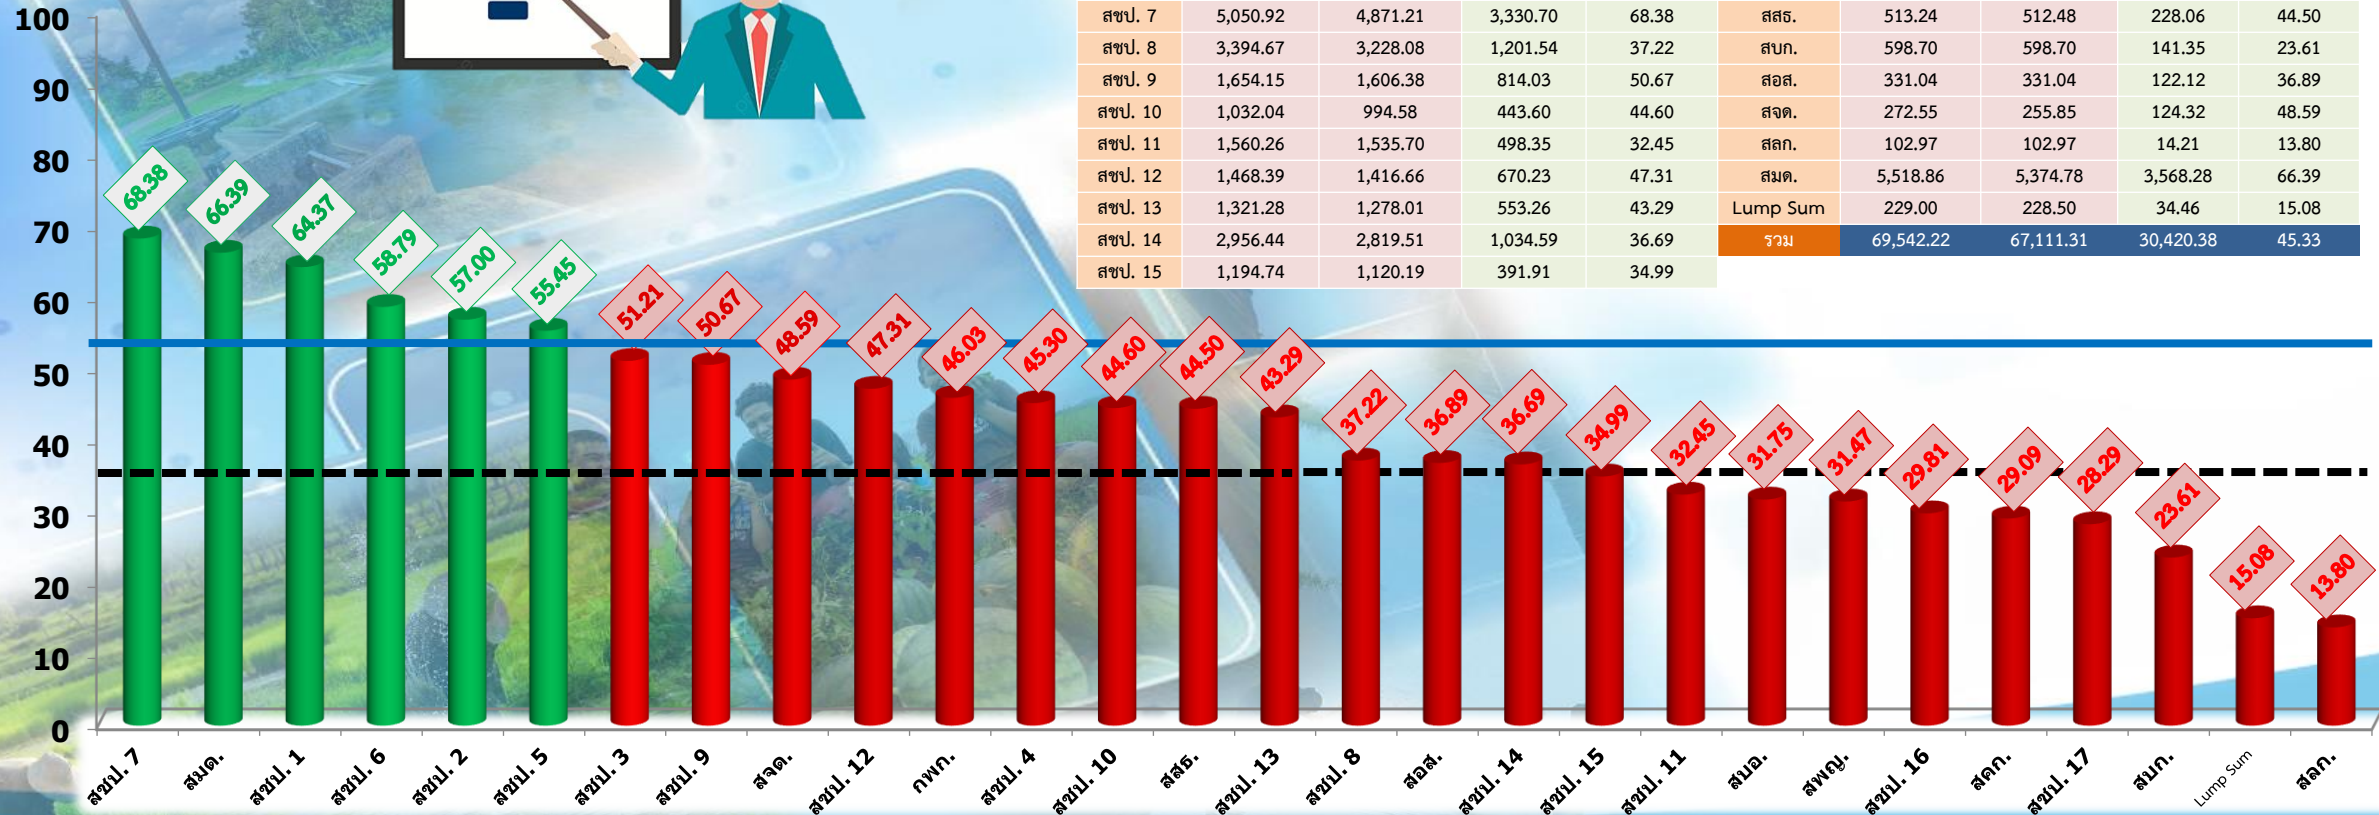

หมายเหตุ : ยกเลิก จำนวน 145 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1,145.85 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบกลาง เป็นต้น

■ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายกรม
 ■ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายกรม

2.9

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ผลต่าง ร้อยละ เบิกจ่าย
		งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	
ระดับกระทรวง (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 10,000 ล้านบาท)								
1	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	92,635.70	48,365.98	52.21	75,345.36	29,170.96	38.72	13.49
2	กระทรวงคมนาคม	168,440.10	72,801.45	43.22	161,344.10	58,324.23	36.15	7.07
3	กระทรวงมหาดไทย	80,964.89	13,994.30	17.28	75,863.83	18,899.71	24.91	-7.63
ระดับกรมใน กษ. (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 1,000 ล้านบาท)								
1	กรมพัฒนาที่ดิน	1,932.21	952.31	49.29	1,954.56	834.52	42.70	6.59
2	กรมชลประทาน	70,170.11	31,160.44	44.41	69,927.50	27,327.55	39.08	5.33
3	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,438.13	74.63	5.19	1,276.11	202.02	15.83	-10.64
ระดับกรม (คู่เทียบที่มีลักษณะงานคล้ายเคียงกัน)								
1	กรมทางหลวง	113,295.40	52,552.10	46.39	107,805.06	39,391.56	36.54	9.85
2	กรมชลประทาน	70,170.11	31,160.44	44.41	69,927.50	27,327.55	39.08	5.33
3	กรมทางหลวงชนบท	45,473.25	18,277.29	40.19	44,285.58	17,099.97	38.61	1.58
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	33,310.31	7,197.62	21.61	29,841.10	7,519.58	25.20	-3.59

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 18 เมษายน 2566

2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 39.84%

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (48 หน่วยงาน) เฉลี่ย 39.09%



งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3



ภาพรวม

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2566



สถานะการดำเนินงาน



ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

- ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด หรือทำงานทำให้กรมต้องบอกเลิกสัญญา และหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
- เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
- แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ

แผน/ผลการเบิกจ่าย (รายเดือน)

รวม	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	
แผน	12,009.81	656.81	1,620.80	2,068.76	1,471.04	1,305.06	2,138.73	912.54	434.09	532.64	189.45	167.01	461.22
ผล	6,839.88	656.81	1,358.74	1,408.54	862.88	752.79	1,520.36	279.76					
ผลต่าง	5,169.93	-	-262.06	-660.22	-608.16	-552.27	-618.37	-632.78					

หมวดความจำเป็น 51.66

เป้า 100%



งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



การดำเนินงาน

มีมติ ค.ร.ม./คำสั่งนายก ออนุมัติงบกลาง 65
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,087 รายการ

งบประมาณ 4,896.45 ล้านบาท
เบิก 2,843.08 ล้านบาท **58.06 %**

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์
71 รายการ **6.53 %**

✗ ยกเลิก 2 รายการ **0.18 %**

FINISH แล้วเสร็จ
1,014 รายการ **93.29 %**

ตัวชี้วัดของโครงการ

ปริมาณน้ำ 0.31 ล้าน ลบ.ม.
ผลสัมฤทธิ์ = - ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่รับประโยชน์ 2,443,886 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = 2,166,420 ไร่ **88.65 %**

คร่าวเรือน 204,583 คร่าวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = 194,893 คร่าวเรือน **95.26 %**

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project
ณ วันที่ 18 เมษายน 2566



620 รายการ
1,126.19 ล้านบาท

เบิกจ่าย 1,053.77 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 93.57

- แล้วเสร็จ 614 รายการ
 - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 4 รายการ
 - ยกเลิก 2 รายการ
- 97.39 %**

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ปริมาณน้ำ 0.31 ล้าน ลบ.ม. /- ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 1,657,922 ไร่ /1,647,422 ไร่
คร่าวเรือนรับประโยชน์ 130,088 คร่าวเรือน /129,268 คร่าวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

1 รายการ
97.92 ล้านบาท

เบิกจ่าย 97.92 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 100

- แล้วเสร็จ
- 100 %**

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565

ดำเนินการจัดการดินจันเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

จัดการดินจันลอยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกพับไป ตามกฎหมาย

407 รายการ
1,137.66 ล้านบาท

เบิกจ่าย 896.74 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 78.82

- แล้วเสร็จ 377 รายการ
 - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 30 รายการ
- 93.29 %**

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

พื้นที่รับประโยชน์ 588,388 ไร่ /518,998 ไร่
คร่าวเรือนรับประโยชน์ 69,180 คร่าวเรือน /65,625 คร่าวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566

3 รายการ
663.88 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

- อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ 3 รายการ
- %**

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565

ดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกลสูบน้ำที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงกับความต้องการใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

โครงการจัดหาเครื่องจักรกลสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหอุทกภัยและภัยแล้ง

4 รายการ
190.14 ล้านบาท

เบิกจ่าย 40.31 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 21.20

- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 4 รายการ
- 20.68 %**

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565

พื้นที่รับประโยชน์ 197,576 ไร่ /- ไร่
คร่าวเรือนรับประโยชน์ 5,315 คร่าวเรือน /- คร่าวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 เพิ่มเติม

1 รายการ
656.55 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

- อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ 1 รายการ
- %**

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

ดำเนินการจัดหาเครื่องสูบน้ำสำหรับการป้องกันความเสียหาย และสนับสนุนบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำได้ทันเหตุการณ์ และมีเครื่องสูบน้ำพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามที่มีหน่วยงานร้องขอสนับสนุน

โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว

51 รายการ
1,024.11 ล้านบาท

เบิกจ่าย 754.34 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 73.66

- แล้วเสร็จ 22 รายการ
 - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 29 รายการ
- 66.77 %**

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

ดำเนินงานก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2565



การดำเนินงาน

มีมติ คร.ม./คำสั่งนายก อนุมัติงบกลาง 66
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,188 รายการ

งบประมาณ 4,809.7707 ล้านบาท
เบิก 207.3197 ล้านบาท 4.31 %

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
378 รายการ 31.82 %

ดำเนินการก่อสร้าง
465 รายการ 39.14 %

จัดซื้อ-จัดจ้าง
344 รายการ 28.96 %

แล้วเสร็จ
1 รายการ 0.08 %

ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = - ไร่

ปริมาณน้ำ 11.80 ล้าน ลบ.ม.
ผลสัมฤทธิ์ = - ล้าน ลบ.ม.

คราวเรือน 422,447 คราวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = - คราวเรือน

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project
ณ วันที่ 18 เมษายน 2566

ส.ป.อนุมัติ
17 ม.ค. 66

มติ ครม.
17 ม.ค. 66
ครุภัณฑ์

มติ ครม.
7 ก.พ. 66

มติ ครม.
3 มี.ค. 66
ครุภัณฑ์

มติ ครม.
7 มี.ค. 66

มติ ครม.
14 มี.ค. 66

กปร.
ปี 2566

1 รายการ
8.86 ล้านบาท

เบิกจ่าย 0.92 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 10.36

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 รายการ

5.00 %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566

2 รายการ
395.50 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 รายการ

- %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ และสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย ภัยแล้ง หรือภัยอื่นๆ อันเกิดจากน้ำ และเพื่อให้ มีเครื่องสูบน้ำที่เพียงพอพร้อมปฏิบัติงานตามที่มี ผู้ร้องขอสนับสนุน และตามภารกิจ

โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำ แบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก

1,142 รายการ
2,954.40 ล้านบาท

เบิกจ่าย 129.99 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 4.40

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 352 รายการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 342 รายการ
ดำเนินการก่อสร้าง 448 รายการ

0.51 %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

พื้นที่รับประโยชน์ 2,600,739 ไร่ / - ไร่
ครวเรือนรับประโยชน์ 421,447 ครวเรือน / - ครวเรือน

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับการเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี 2565

1 รายการ
48.96 ล้านบาท

เบิกจ่าย 48.96 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 100

ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ

100 %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

ดำเนินการจัดหารถปั้นขึ้นเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

รถปั้นจั่นลอยทาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกขโมยไปตามกฎหมาย

1 รายการ
300.00 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ

- %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

พื้นที่รับประโยชน์ 106,000 ไร่ / - ไร่

โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ)

7 รายการ
500.26 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 7 รายการ

- %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

ปริมาณน้ำ 11.80 ล้าน ลบ.ม. / - ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 68,000 ไร่ / - ไร่
ครวเรือนรับประโยชน์ 1,000 ครวเรือน / - ครวเรือน

โครงการแก้ไขปัญหาลูกทกภัย ระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่

34 รายการ
601.79 ล้านบาท

เบิกจ่าย 27.45 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 4.56

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 18 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 16 รายการ

0.21 %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2566

แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย (สนับสนุนโครงการหลวงเลอตอ)

รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 18 เมษายน 2566)

6

เงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



งบประมาณ 1,411.51 ล้านบาท
(งบจัดสรร 771.34 ล้านบาท)
เบิกจ่าย 97.94 ล้านบาท 6.94 %

ผลการดำเนินงาน : 1,020 รายการ



แล้วเสร็จ

620 รายการ








อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

400 รายการ

7

งานกองทุน จัดรูปที่ดิน






จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

-  งบประมาณ 307.65 ล้านบาท = เบิกจ่าย 130.59 ล้านบาท 42.45 %
-  ผลการดำเนินงาน
 -  อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 32 รายการ
 -  ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 รายการ
-  ผลสัมฤทธิ์
 - พื้นที่เกษตรกรรม 23,890 ไร่
 - ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,774 ครัวเรือน

รวมทั้งสิ้นจำนวน
35 รายการ



จัดระบบน้ำเพื่อการเกษตร

-  งบประมาณ 727.35 ล้านบาท = เบิกจ่าย 370.02 ล้านบาท 50.87 %
-  ผลการดำเนินงาน
 -  อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 52 รายการ
 -  ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 รายการ
-  ผลสัมฤทธิ์
 - พื้นที่เกษตรกรรม 60,239 ไร่
 - ครัวเรือนรับประโยชน์ 5,235 ครัวเรือน

รวมทั้งสิ้นจำนวน
57 รายการ

ภาพรวม



งบประมาณ
1,035.00 ล้านบาท
= เบิกจ่าย 500.61 ล้านบาท 48.37 %



ผลการดำเนินงาน : 92 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 84 รายการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 รายการ

