



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๒๕๖๖/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖)

๑๐๓๓๔๒

เรียน ผอ.ผง. สำเนา ผผง.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สรุปรายงานความก้าวหน้า โดยแยกตามปีงบประมาณ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๔ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๑,๘๓๖.๖๘ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๑,๖๓๔.๒๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๕๘๐.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๓ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้ยางพารา ๘๘๘.๐๔ ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา ๑,๒๘๓.๗๖ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๔๒.๙๕ ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๓ รายการ และยกเลิก จำนวน ๘ รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๘ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๘๕๑.๖๘ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๗๒๘.๓๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑๒๑.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๒ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้ยางพารา ๖๘๗.๒๒ ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา ๕๑.๕๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๙ ผลการดำเนินงานในภาพรวม อนุมัติรับราคา จำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๔๑ รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ ออช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารารัตน์ หัตถพงษ์ศรีธรร)

ผตป.ผง.

เรียน ออช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ

(นายนิรัตน์วัฒน์ อิบทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖

- ทราบ

โยธเนศร์ สมบูรณ์, ผอ.สอ., ผอ.ทต., ทน. ๑-๗ มอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายโยธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖

โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2566

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพารา ในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานที่ดำเนินการโดยนำยางพารามาเป็นส่วนผสมของงานถนน เพื่อการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนบนคันคลอง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้อย่างพาราในงานด้านชลประทาน รวมทั้งสิ้น 134 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1,836.68 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,634.22 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,580.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.73 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 898.04 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 1,283.76 ตัน คิดเป็นร้อยละ 142.95 ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 123 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ ทั้งนี้ จำแนกตามประเภท ดังนี้

- Para Asphalt Concrete จำนวน 130 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,605.81 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,552.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 792.54 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 1,176.62 ตัน คิดเป็นร้อยละ 148.46 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 119 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

- Para Soil Cement จำนวน 4 รายการ งบประมาณจัดสรร 28.41 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 28.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 105.50 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 107.14 ตัน คิดเป็นร้อยละ 101.55 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพารา ในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานเป็นงานซ่อมแซม ปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน และถนนทางเข้าหัวงาน โครงการชลประทาน ประเภท Para Asphalt Concrete รวมทั้งสิ้น 48 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 851.68 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 728.32 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 121.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.72 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 687.22 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 51.50 ตัน คิดเป็นร้อยละ 7.49 ผลการดำเนินงานในภาพรวม อนุมัติรับราคา จำนวน 2 รายการ คือ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหัวงานเขื่อนลำนางรอง ระยะทาง 1.100 กม. โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาลำน้ำรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ และถนนภายในบริเวณหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสีียด ตำบลท่าตะเียบ อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 41 รายการและดำเนินการแล้วเสร็จ 5 รายการ

\*\*\*\*\*





การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2566

กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2566







# การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## ที่ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



พ.ร.บ. 2565			
ประเภท	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,634.22	134	898.04
ผล	1,580.71 (96.73%)	123	1,283.76 (142.95%)

Para Asphalt Concrete			
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,605.81	130	792.54
ผล	1,552.30 (95.93%)	119	1,176.62 (148.46%)

Para Soil Cement			
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	28.41	4	105.50
ผล	28.40 (99.96%)	4	107.14 (101.55%)




หมายเหตุ : ยกเลิก 8 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการเงินกู้ พ.ศ. 2563 และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564





# การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

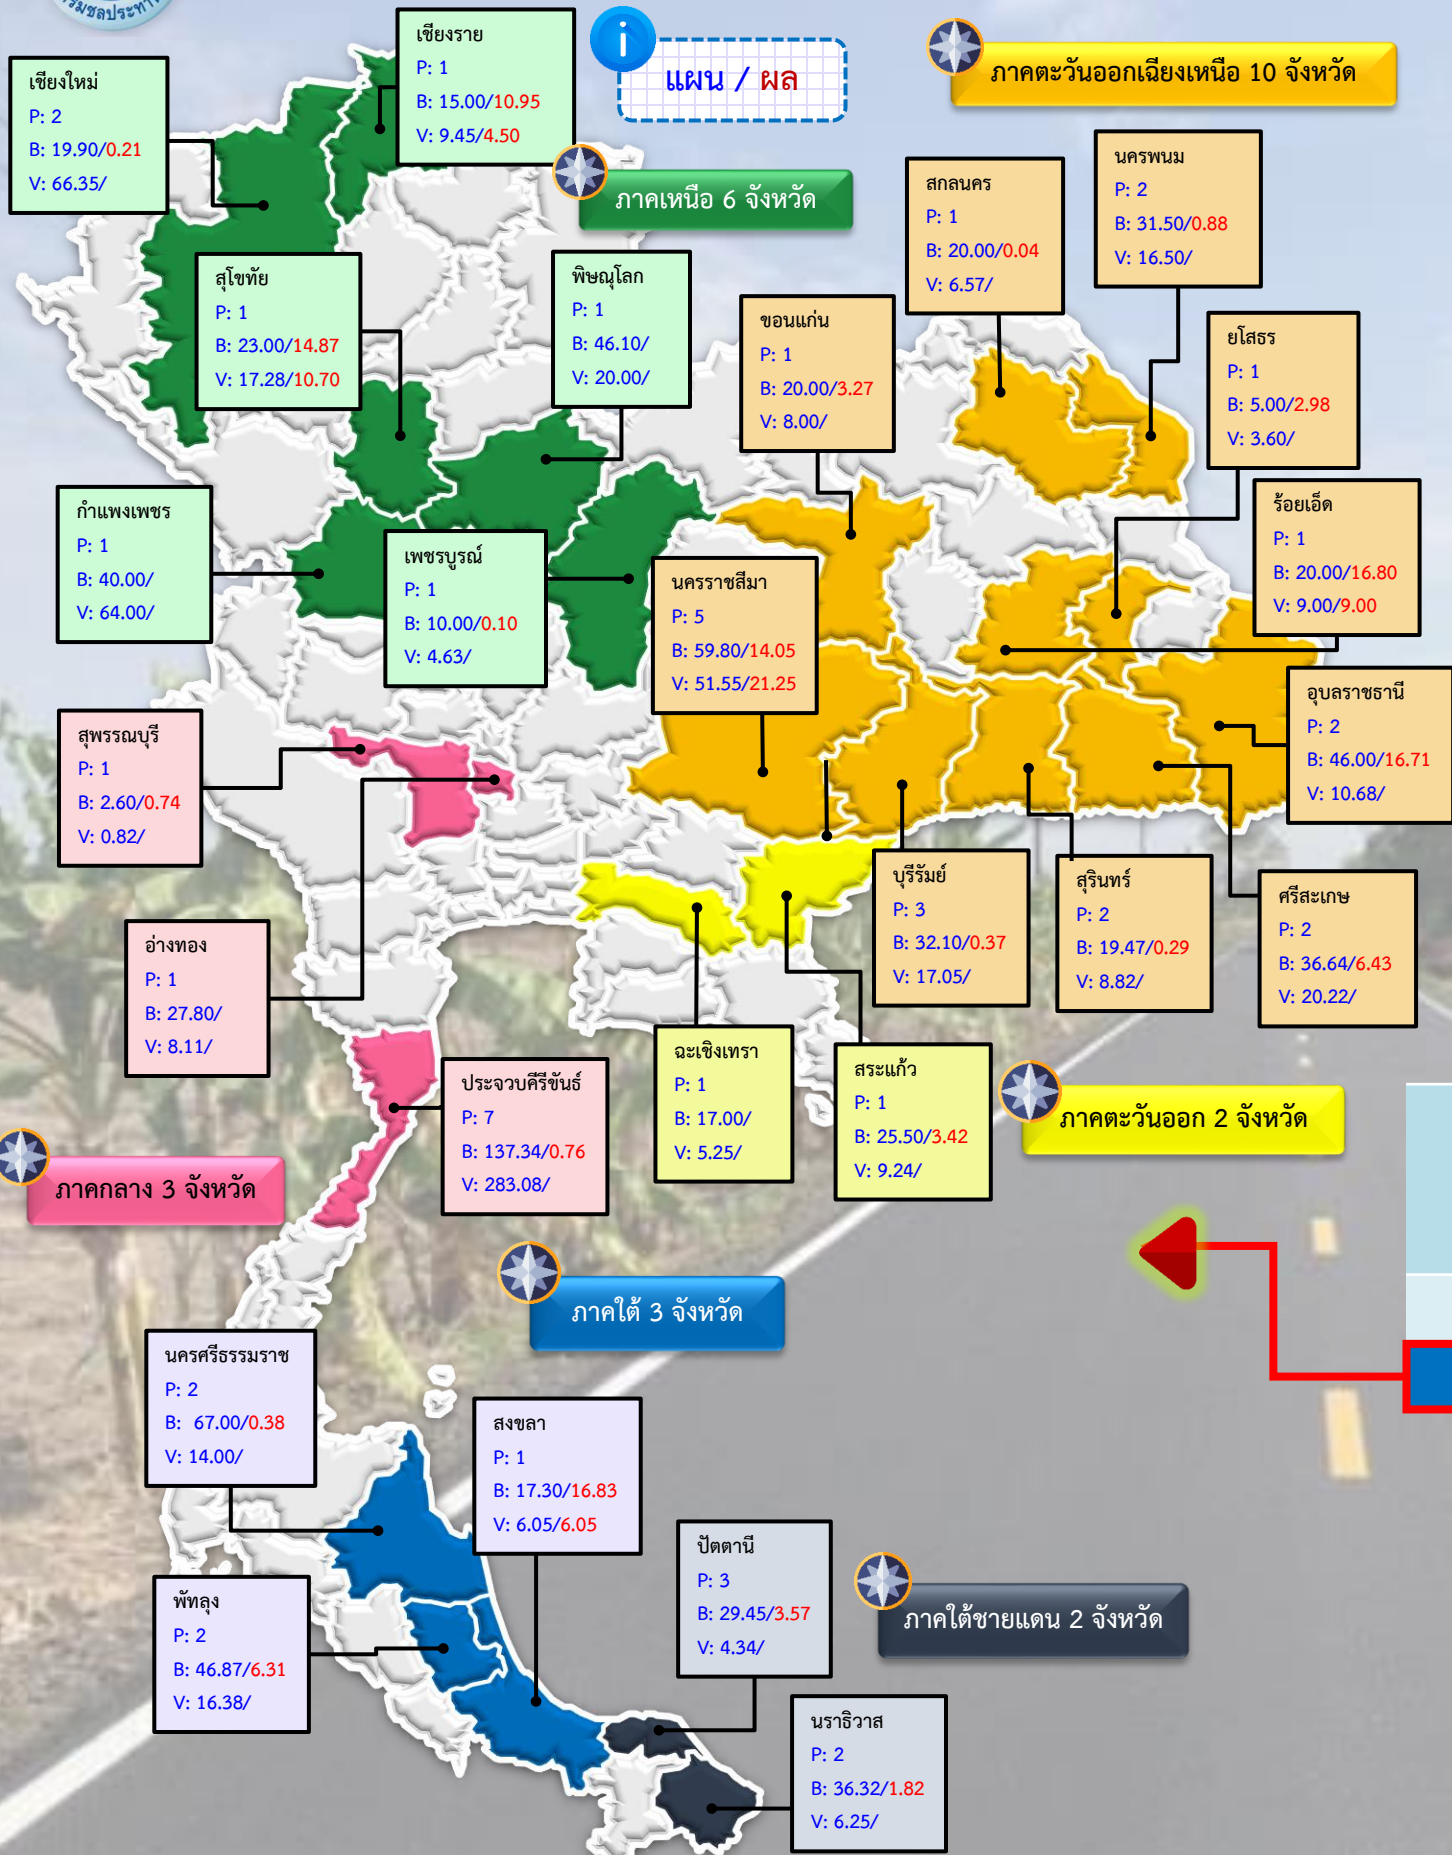

## แผนการดำเนินงาน

ภาค	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	น้ำยางชั้น (ตัน)
	P	B	V
รวม 26 จ.	48	851.68	687.22
เหนือ	7	154.00	181.71
ตะวันออกเฉียงเหนือ	20	290.51	151.99
กลาง	9	167.74	292.01
ตะวันออก	2	42.50	14.49
ใต้	5	131.17	36.43
ใต้ชายแดน	5	65.77	10.59

## ผลการดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 66 (ล้านบาท)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	851.68	728.32	48	687.22
<b>ผล</b>	<b>121.78 (14.30%)</b>	<b>121.78 (16.72%)</b>	<b>5</b>	<b>51.50 (7.49%)</b>

อนุมัติรับราคา 2 รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 41 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 5 รายการ

