



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๔๗/๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖)

JM.663

เรียน ผอ.พง. สำนัก ผผง.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สรุปรายงานความก้าวหน้า โดยแยกตามปีงบประมาณ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๔ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๑,๘๓๖.๖๘ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๑,๖๓๔.๒๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๔๙๗.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๔ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้ยางพารา ๘๙๘.๐๔ ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา ๑,๒๔๕.๓๓ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๓๘.๖๗ ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑๗ รายการ และยกเลิก จำนวน ๘ รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๘ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๘๕๑.๖๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๙.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๓ แผนปริมาณการใช้ยางพารา ๖๘๗.๒๒ ตัน ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๘ รายการ (ประกาศ TOR จำนวน ๒ รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ รายการ เปิดซอง จำนวน ๓ รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน ๘ รายการ) และอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อชช. เพื่อทราบต่อไป



(นางสลิทธิพิทย์ วีระวงษ์)

ตป.๓ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำนักเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
เพื่อโปรดทราบ



(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖

-ทราบ

เรียน ผอ.สอน, ผอ.บ.กต.

เพื่อโปรดทราบ



(นายเชนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖



โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2566

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานที่ดำเนินการโดยนำยางพารามาเป็นส่วนผสมของงานถนน เพื่อการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนบนคันคลอง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้อย่างพาราในงานด้านชลประทาน รวมทั้งสิ้น 134 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1,836.68 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,634.22 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,497.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.64 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 898.04 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 1,245.33 ตัน คิดเป็นร้อยละ 138.67 ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 117 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ ทั้งนี้ จำแนกตามประเภท ดังนี้

- **Para Asphalt Concrete** จำนวน 130 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,605.81 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,469.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.49 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 792.54 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 1,138.19 ตัน คิดเป็นร้อยละ 143.61 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 113 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

- **Para Soil Cement** จำนวน 4 รายการ งบประมาณจัดสรร 28.41 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 28.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 105.50 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 107.14 ตัน คิดเป็นร้อยละ 101.55 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานเป็นงานซ่อมแซม ปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน และถนนทางเข้าหัวงาน โครงการชลประทาน ประเภท Para Asphalt Concrete รวมทั้งสิ้น 48 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 851.68 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 9.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.13 แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 687.22 ตัน ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 18 รายการ (ประกาศ TOR จำนวน 2 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 รายการ เปิดซอง จำนวน 3 รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน 8 รายการ) และอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ



การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2566

กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2566





การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


พ.ร.บ. 2565			
ประเภท	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,634.22	134	898.04
ผล	1,497.61 (91.64%)	117	1,245.33 (138.67%)

Para Asphalt Concrete			
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,605.81	130	792.54
ผล	1,469.21 (91.49%)	113	1,138.19 (143.61%)

Para Soil Cement			
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	28.41	4	105.50
ผล	28.40 (99.96%)	4	107.14 (101.55%)




หมายเหตุ : ยกเลิก 8 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการเงินกู้ พ.ศ. 2563 และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564





การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

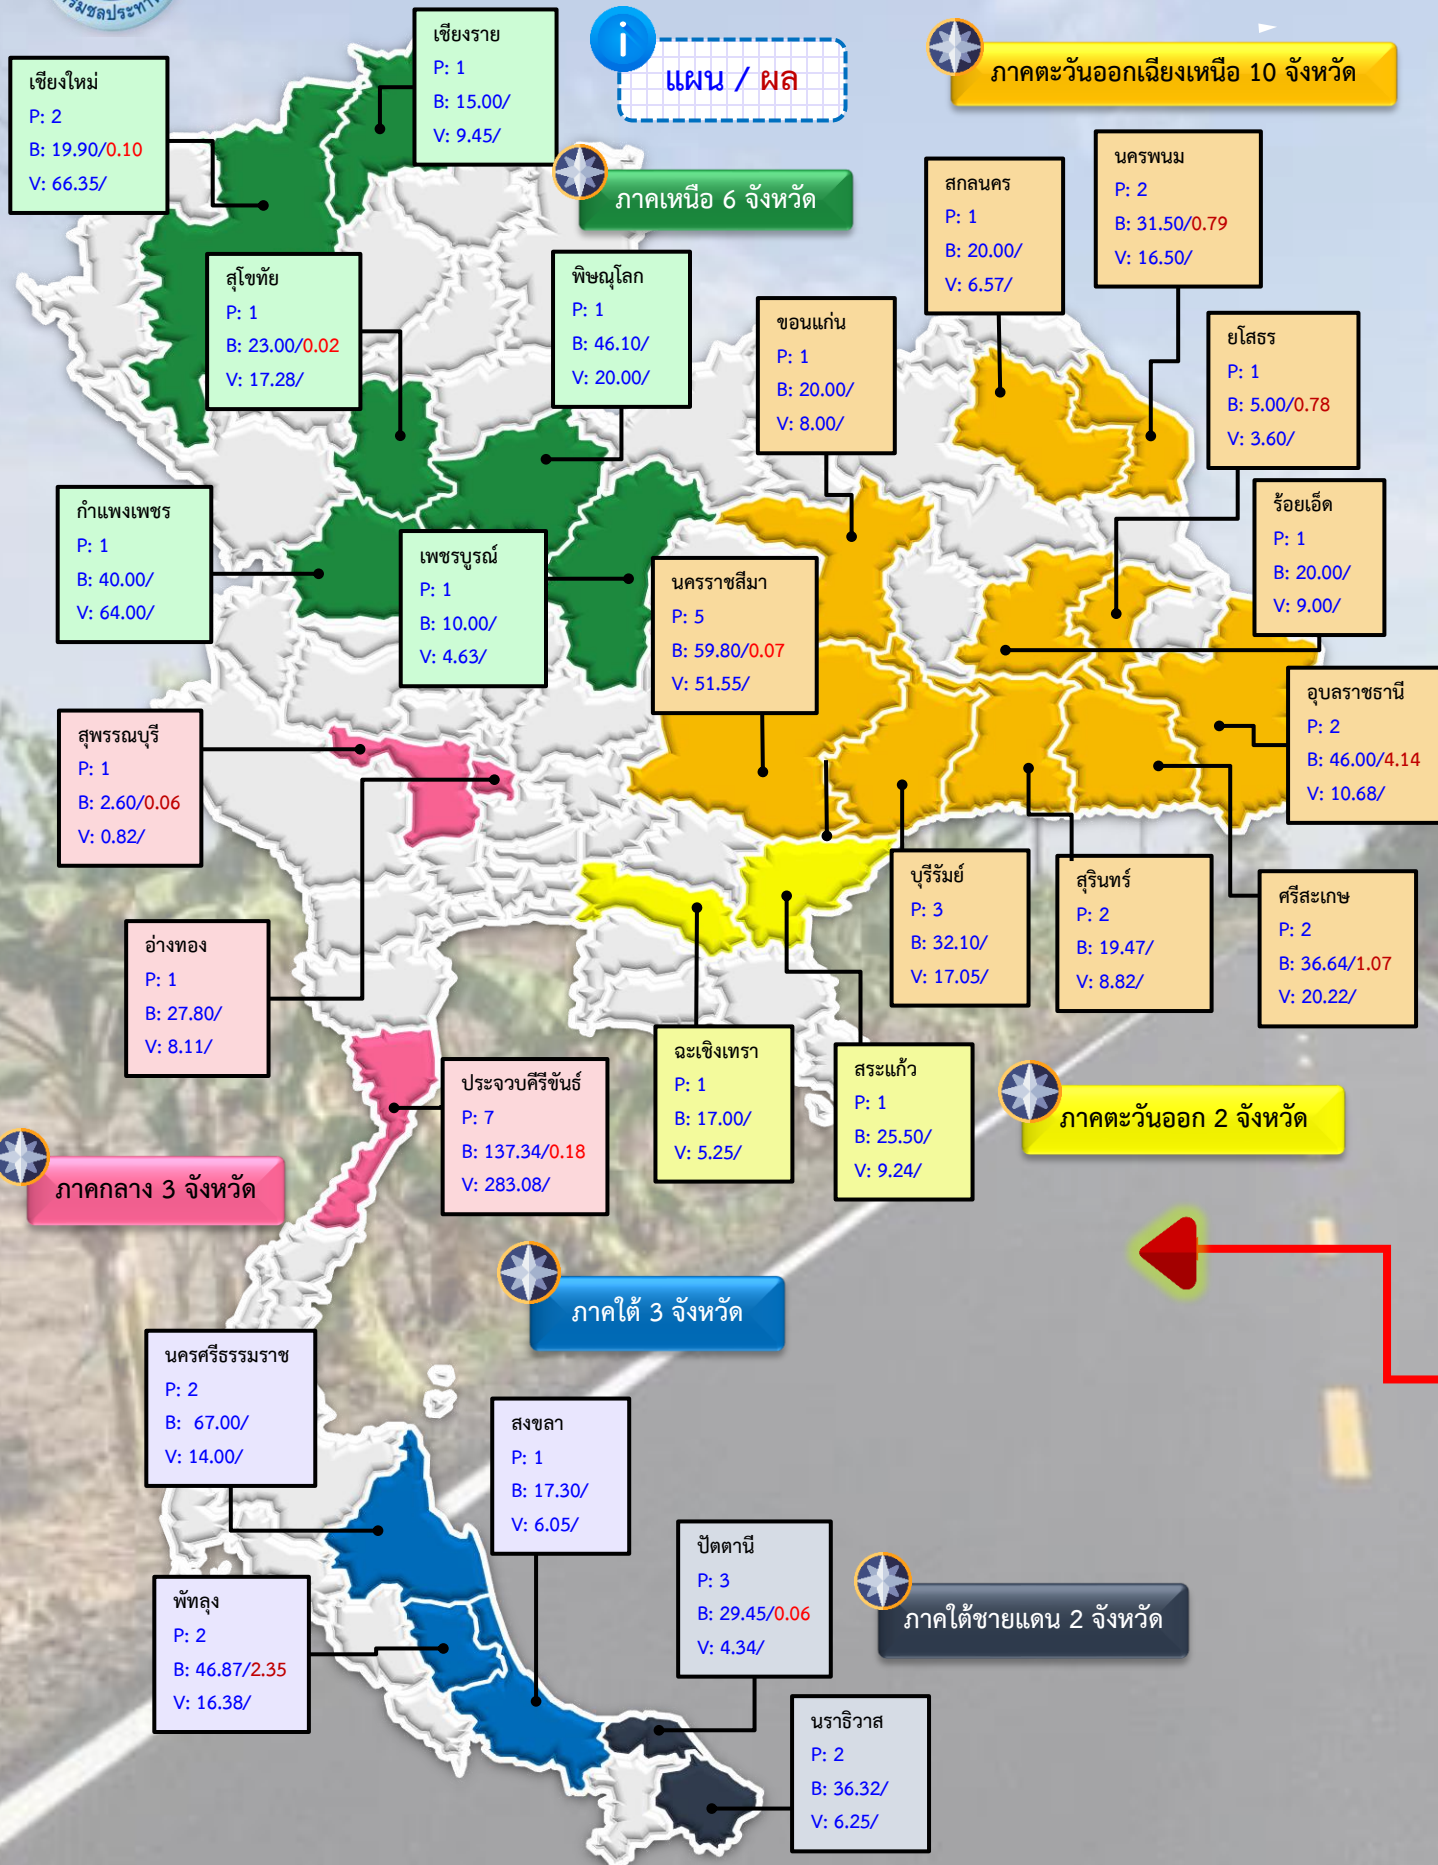

แผนการดำเนินงาน

ภาค	จำนวน (รายการ) P	งบประมาณ (ล้านบาท) B	น้ำยางชั้น (ตัน) V
รวม 26 จ.	48	851.68	687.22
เหนือ	7	154.00	181.71
ตะวันออกเฉียงเหนือ	20	290.51	151.99
กลาง	9	167.74	292.01
ตะวันออก	2	42.50	14.49
ใต้	5	131.17	36.43
ใต้ชายแดน	5	65.77	10.59

ผลการดำเนินงาน

ประเภท	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 66 (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	851.68	48	687.22
ผล	9.63 (1.13%)	-	-

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 18 รายการ (ประกาศ TOR 2 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 5 รายการ เปิดซอง 3 รายการ อนุมัติรับราคา 8 รายการ) และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 30 รายการ

