



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖
ที่ กพง ๐๖/๔๔๓/๒๕๖๖ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ค. ๗๒๙๐/11๓.๒.๕๕
เรื่อง ข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖) ๖๒1810
เรียน ผอ.ผง. สำเนา ผงผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สรุปรายงานความก้าวหน้า โดยแยกตามปีงบประมาณ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๔ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๑,๘๓๖.๖๘ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๑,๖๓๔.๒๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๖๐๔.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๙ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้ยางพารา ๘๙๘.๐๔ ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา ๑,๓๕๓.๒๑ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๕๐.๖๘ ผลการดำเนินงานในภาพรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๖ รายการ และยกเลิก จำนวน ๘ รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๘ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๘๕๑.๖๘ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๗๒๘.๖๙ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๖๔๑.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้ยางพารา ๖๘๗.๒๒ ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา ๑,๐๕๗.๐๕ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๕๓.๘๒ ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๙ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๘ ก.ย. ๒๕๖๖

-ทราบ

เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.ร.ท.ด.ท. ๑-๙ มอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายชนันต์ สมบูรณ์)

ผส.บอ

โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานที่ดำเนินการโดยนายช่างพารามาเป็นส่วนผสมของงานถนน เพื่อการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนบนคันคลอง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้อย่างพาราในงานด้านชลประทาน รวมทั้งสิ้น 134 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1,836.68 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,634.22 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,604.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.19 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 898.04 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 1,353.21 ตัน คิดเป็นร้อยละ 150.68 ผลการดำเนินงานในภาพรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 126 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ ทั้งนี้ จำแนกตามประเภท ดังนี้

- Para Asphalt Concrete จำนวน 130 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,605.81 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,576.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.16 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 792.54 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 1,246.07 ตัน คิดเป็นร้อยละ 157.22 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 122 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- Para Soil Cement จำนวน 4 รายการ งบประมาณจัดสรร 28.41 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 28.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 105.50 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 107.14 ตัน คิดเป็นร้อยละ 101.55 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ

2. งบประมาณ ...

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพารา ในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานเป็นงานซ่อมแซม ปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน และถนนทางเข้าหัวงาน โครงการชลประทาน ประเภท Para Asphalt Concrete รวมทั้งสิ้น 48 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 851.68 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 728.69 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 641.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.00 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 687.22 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 1,057.05 ตัน คิดเป็นร้อยละ 153.82 ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 39 รายการ



การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยาสูบในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2566

กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566





การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเที่ยวชมหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ที่ดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


พ.ร.บ. 2565


| ประเภท | งบประมาณเงินอุดหนุน (ล้านบาท) | จำนวน (รายการ) | น้ำยางชั้น (ตัน) |
|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| แผน | 1,634.22 | 134 | 898.04 |
| ผล | 1,604.70 (98.19%) | 126 | 1,353.21 (150.68%) |

| Para Asphalt Concrete | | Para Soil Cement | | | | |
|-----------------------|--------------------|------------------|--------|--------------------|----------------|------------------|
| ประเภท | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวน (รายการ) | ประเภท | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวน (รายการ) | น้ำยางชั้น (ตัน) |
| แผน | 1,605.81 | 130 | แผน | 28.41 | 4 | 105.50 |
| ผล | 1,576.30 (98.16%) | 122 | ผล | 28.40 (99.96%) | 4 | 107.14 (101.55%) |



หมายเหตุ : ยกเลิก 8 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการเงินกู้ พ.ศ. 2563 และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



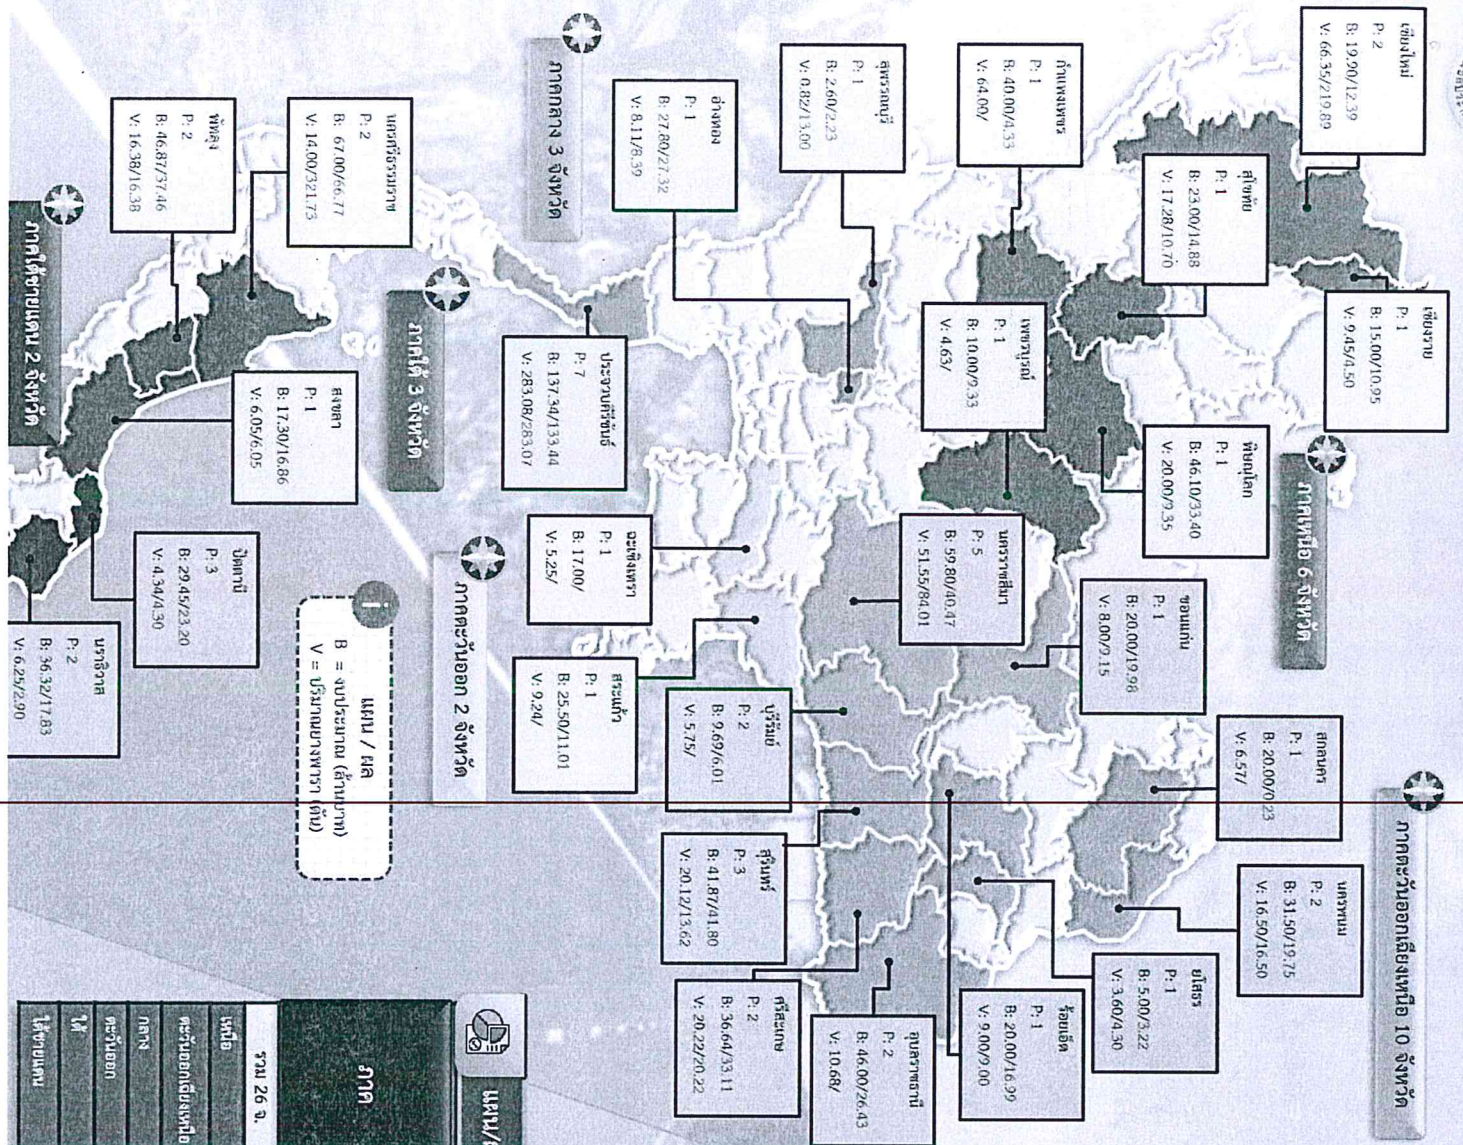

หมายเหตุ / หมายเหตุ
 B = งบประมาณ (ล้านบาท)
 V = ปริมาณเกษตรกร (คน)

ผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมการใช้ชีวนทรีย์ในหน่วยงานภาครัฐ

จำนวน (รายการ)
 แผน = 48 รายการ
 ผล = 39 รายการ
 = 81.25 %

งบประมาณ (ล้านบาท)
 งบดำเนินงานเปลี่ยนแปลง = 728.69 ล้านบาท
 เบิกจ่าย = 641.23 ล้านบาท
 = 88.00 %

นโยบายเชิงต้น (ต้น)
 แผน = 687.22 ต้น
 ผล = 1,057.05 ต้น
 = 153.82 %

แผน/ผลการดำเนินงาน

| ภาค | จำนวน (รายการ) | | งบประมาณ (ล้านบาท) | | | | นำจ่ายต้น (ต้น) | | |
|--------------------|----------------|----|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|--------|
| | แผน | ผล | งบดำเนินงาน | งบช่วยเหลือ | งบช่วยเหลือ | งบช่วยเหลือ | งบช่วยเหลือ | งบช่วยเหลือ | |
| รวม 26 จ. | 48 | 39 | 851.68 | 728.69 | 641.23 | 88.00 | 687.22 | 1,057.05 | 153.82 |
| เหนือ | 7 | 5 | 154.00 | 107.44 | 85.28 | 79.37 | 181.71 | 244.44 | 134.52 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | 20 | 17 | 290.50 | 240.14 | 207.98 | 86.61 | 151.99 | 156.80 | 103.16 |
| กลาง | 9 | 9 | 167.74 | 163.92 | 162.99 | 99.44 | 292.01 | 304.45 | 104.26 |
| ตะวันออก | 2 | 2 | 42.50 | 37.49 | 22.86 | 60.97 | 14.49 | | |
| ใต้ | 5 | 4 | 131.17 | 121.17 | 121.09 | 99.93 | 36.43 | 344.16 | 944.72 |
| ไม่ทราบ | 5 | 4 | 65.77 | 58.53 | 41.03 | 70.10 | 10.59 | 7.20 | 67.99 |
