



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๒๕/๒๕๖๗ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๑๑๔๖/๒๐.พ.๖๗

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗)

๑๒๕๘๕
ผ.ช.พ. ๗๒

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว
ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๖ ก.พ. ๒๕๖๗

-ทราบ

ไปรษณีย์ ผอ.ส่วน., ผอ.ส.ค., ทน.๑-๙ มอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายชเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.ชอ.

๖ ก.พ. ๒๕๖๗

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ จำนวน 5 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 34,058.11 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 15,529.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.60 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 4,408 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 196 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.45 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 709 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.08 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1,920 รายการ คิดเป็นร้อยละ 43.89 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,582 รายการ คิดเป็นร้อยละ 35.89 และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.02 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบประมาณ จำนวน 19,534.84 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 7,719.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.52 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 4,462.36 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 2,161.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.44 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 15,072.48 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 5,557.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.87 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,639 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 74 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.52 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 197 รายการ คิดเป็นร้อยละ 12.02 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1,207 รายการ คิดเป็นร้อยละ 73.64 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 161 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.82

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กักไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ จำนวน 7,479.60 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 3,789.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.67 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน 3,689.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.33 จำนวนรายการทั้งสิ้น 744 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 392 รายการ คิดเป็นร้อยละ 52.69 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 352 รายการ คิดเป็นร้อยละ 47.31

3. งบกลาง พ.ศ. 2566 งบประมาณ จำนวน 5,138.65 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 3,885.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.61 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,206 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 252 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.90 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 953 รายการ คิดเป็นร้อยละ 79.02 และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.08 คือ ซ่อมแซมกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากอาคารบังคับน้ำคลองบ้านผู้ใหญ่บุญญาถึงอาคารบังคับน้ำวัดเชิงเลน ความยาว 590 เมตร เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น เสนอราคา

4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณ จำนวน 1,201.99 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 15.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.31 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 732 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 122 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 494 รายการ คิดเป็นร้อยละ 67.48 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 116 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15.85

5. กองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณ จำนวน 703.03 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 118.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.91 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 81 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 18 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.69 และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 69 รายการ คิดเป็นร้อยละ 79.31



กรมส่งเสริมการเกษตร



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567



รายละเอียดข้อมูล

- 1 วัตถุประสงค์ดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- 2 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
 - 2.1 วัตถุประสงค์ของหน้าที่ผู้พิมพ์ งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 ไปพลางก่อน (ภาพรวม)
 - 2.2 วัตถุประสงค์ของหน้าที่ผู้พิมพ์ งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 ไปพลางก่อน จำแนกตามสำนัก/กอง
 - 2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน งบประมาณรายจ่าย ไปพลางก่อน
 - 2.4 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566
 - 2.5 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566
- 3 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กินไว้เบิกเหลือ
- 4 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- 5 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- 6 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



รายละเอียดงบประมาณ




ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)


รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	
รวมทั้งสิ้น	34,058.11	15,529.02	45.60	4,408	196	709	1,920	1,582	
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	19,534.84	7,719.21	39.52	1,639	74	197	1,207	161	
1.1 งบรายจ่ายประจำ	4,462.36	2,161.74	48.44						
1.2 งบรายจ่ายลงทุน	15,072.48	5,557.47	36.87	1,639	74	197	1,207	161	
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กั้นไว้เบิกเหลือในปี	7,479.60	3,789.66	50.67	744			392	352	
3. งบกลาง พ.ศ. 2566	5,138.65	3,885.53	75.61	1,206			252	953	
3.1 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	4,207.98	3,157.28	75.03	1,154			226	927	
- โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เทินหลวงน้อย (สนับสนุนโครงการหลวงตลอด)	8.86	7.77	87.70	1				1	
- โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็วช่วยระบบไฮดรอลิค	395.50			2			2		
- โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี 2565	2,954.40	2,741.72	92.80	1,142			216	925	
- โครงการจัดหารถปั้นจั่นลอยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane)ทดแทนงบประมาณที่ถูกปรับไปตามกฎหมาย	48.96	48.96	100.00	1				1	
- โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ)	300.00	0.63	0.210	1			1		
- โครงการแก้ไขปัญหาคูทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่	500.26	358.20	71.60	7			7		
3.2 โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2566	930.67	728.25	78.25	52			26	26	
4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2567	1,201.99	15.77	1.31	732	122	494		116	
5. กองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2567	703.03	118.85	16.91	87		18	69		

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบ พ.ร.บ. 2.1 สรุปผลการทอหณผู้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 ไปพลางก่อน (ภาพรวม)

ข้อมูลจาก : ฦ ลีฬ



ผลการดำเนินงาน

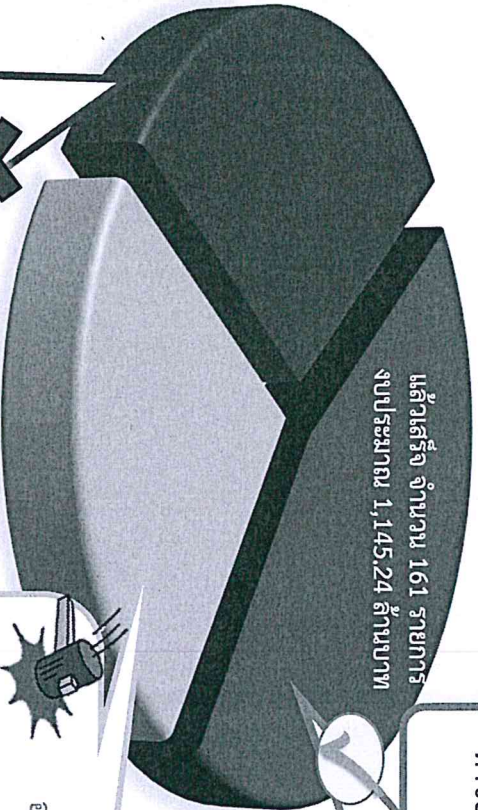

ทำซื้อผูกพันแล้ว จำนวน 1,368 งบประมาณ 865.65 ล้านบาท

- อยู่ระหว่างกระบวนการจัด จำนวน 197 รายการ (งบประมาณ 444.23 ล้านบาท)
- อนุมัติแผน 146 รายการ งบปร
 - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 15 รายการ งบปร
 - เปิดซอง 6 รายการ งบปร
 - อนุมัติรับราคา 30 รายการ งบปร

✗ ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

✓ กอหณผู้ผูก



- ส่วนกลาง

ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา

รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 269 รายการ
งบประมาณ 810.09 ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ	ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวม	1,634	14,416.62	218	759.25	15	21.61	36	29.23	1,365	13,606.54
พวก.	99	5,507.94	7	104.96			1	0.85	91	5,402.12
สพญ.	121	4,307.44	21	214.08	2	0.27			98	4,093.09
สคก.	163	75.15	7	1.28					156	73.87
สพอ.	94	202.48	68	161.83			4	1.36	22	39.30
สบก.	27	302.07							27	302.07
สจค.	6	1.22	2	0.40					4	0.82
สคก.	1	32.72							1	32.72
สสส.	22	251.40							22	251.40
สอศ.	13	250.45							13	250.45
สผค.	32	1,569.19	5	42.77					27	1,526.42

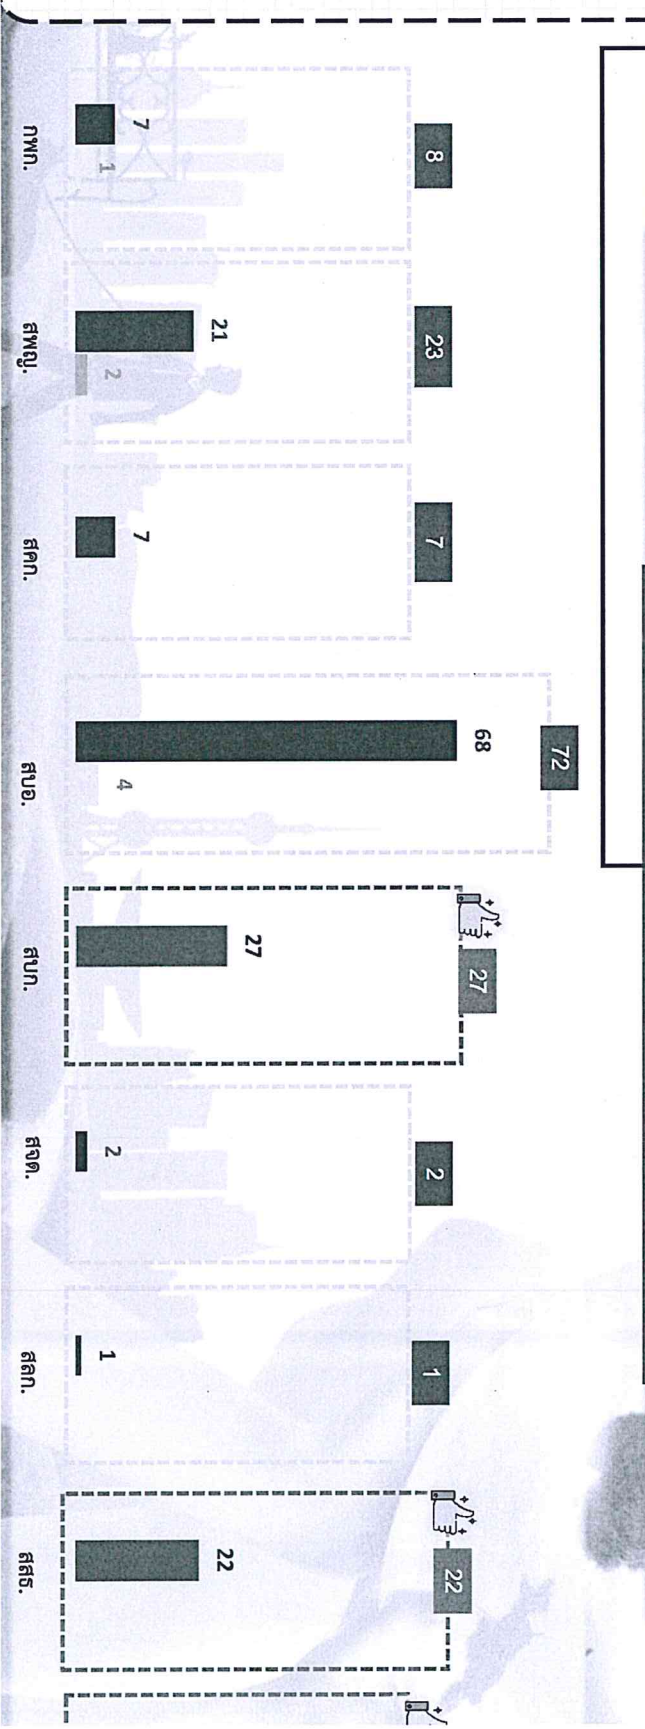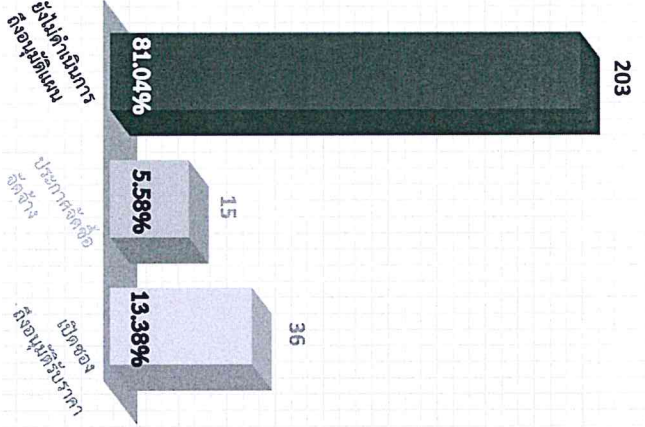


รวม 269 รายการ 712 ล้านบาท

ยังไม่ทํานิติกรัง
ยังไม่ทํานิติกรัง 269 รายการ

สถานี	จำนวนรายการ ทั้งสิ้น	งบประมาณ	ยังไม่ทํานิติกรัง อนุมัติแผน		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดของ ถึงอนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สชป. 1	33	50.65	6	9.02					27	41.64
สชป. 2	21	239.02	2	2.09					19	236.92
สชป. 3	56	243.65	4	3.91	4	4.30	3	4.15	45	231.30
สชป. 4	40	120.58	7	16.66			4	5.81	29	98.11
สชป. 5	40	155.81	4	5.99	2	6.12		1.12	34	143.71
สชป. 6	43	69.75	3	6.83					39	61.80
สชป. 7	31	40.52	5	6.56					26	33.96
สชป. 8	52	81.99	5	6.58					47	75.41
สชป. 9	80	182.42	11	22.68	3	6.79			66	152.95

ยังไม่ทํานิติกรัง
ยังไม่ทํานิติกรัง 269 รายการ

สถานี	จำนวนรายการ ทั้งสิ้น	งบประมาณ	ยังไม่ทํานิติกรัง อนุมัติแผน		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดของ ถึงอนุมัติรับราคา	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สชป. 10	149	92.31	17	13.06			13	4.86
สชป. 11	97	178.12	28	9.43	3	3.91	1	0.15
สชป. 12	97	72.29						
สชป. 13	89	70.67	3	1.50	1	0.23	2	1.76
สชป. 14	46	60.26	11	19.63			7	9.16
สชป. 15	82	57.60						
สชป. 16	61	157.61	2	110.00				
สชป. 17	39	43.31						


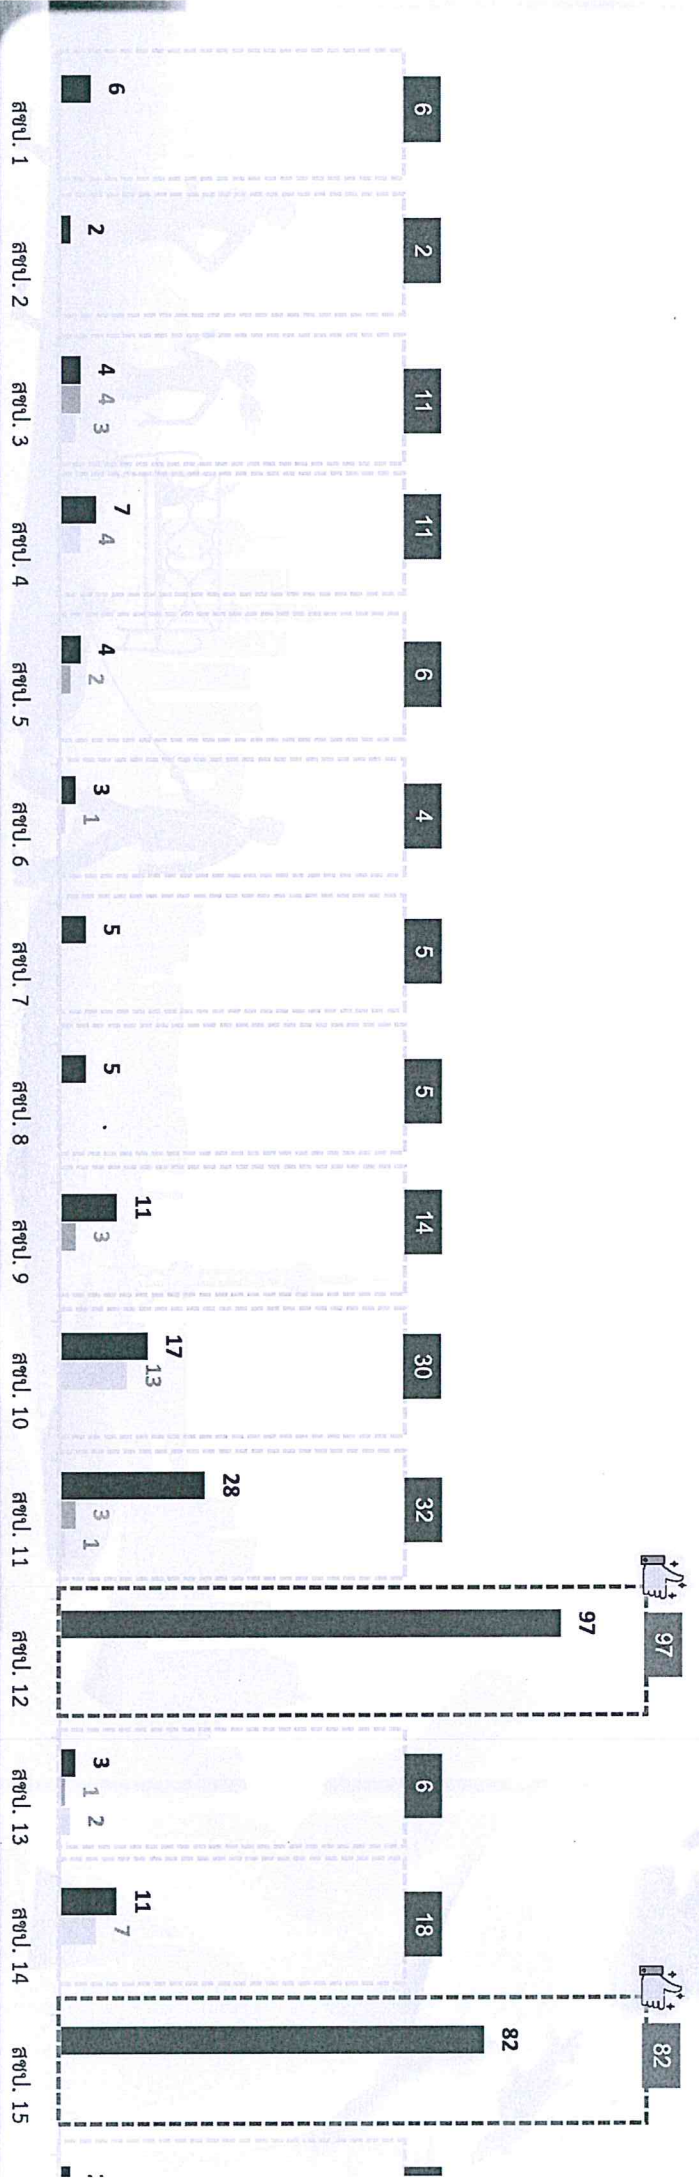


2.3

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567




--- เป้าหมายเบิกจ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาส 2

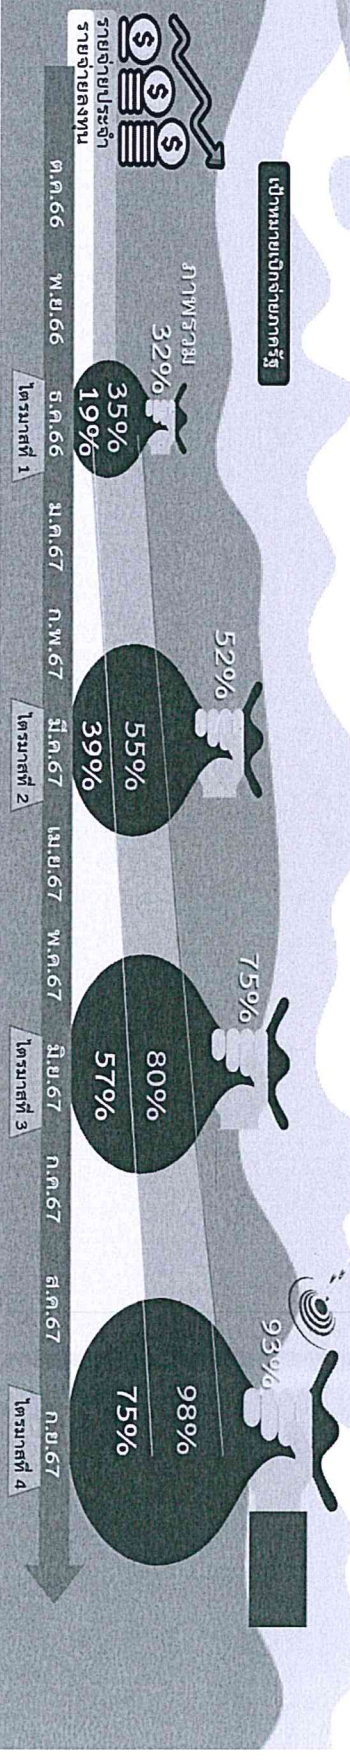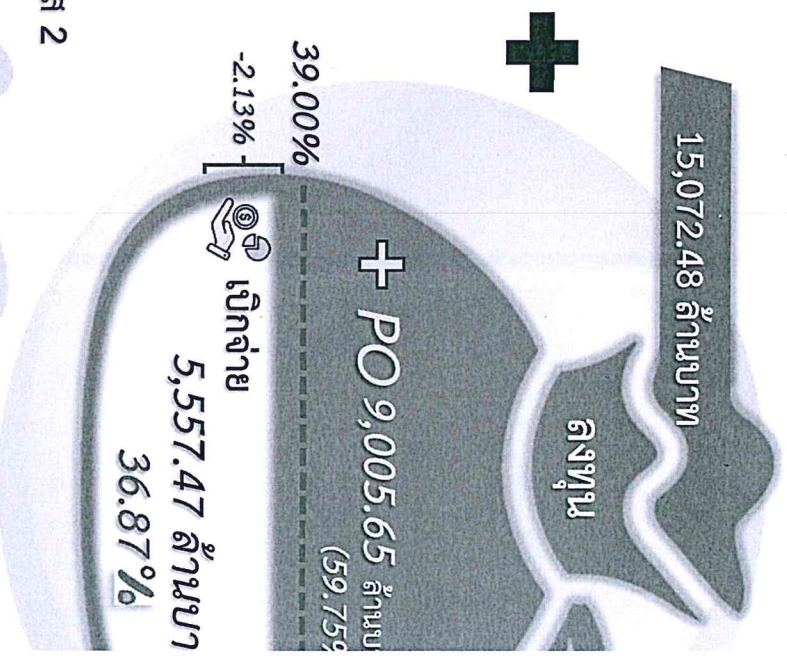

2.4

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณความร่วมมือของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566 ไปพลางๆ

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567

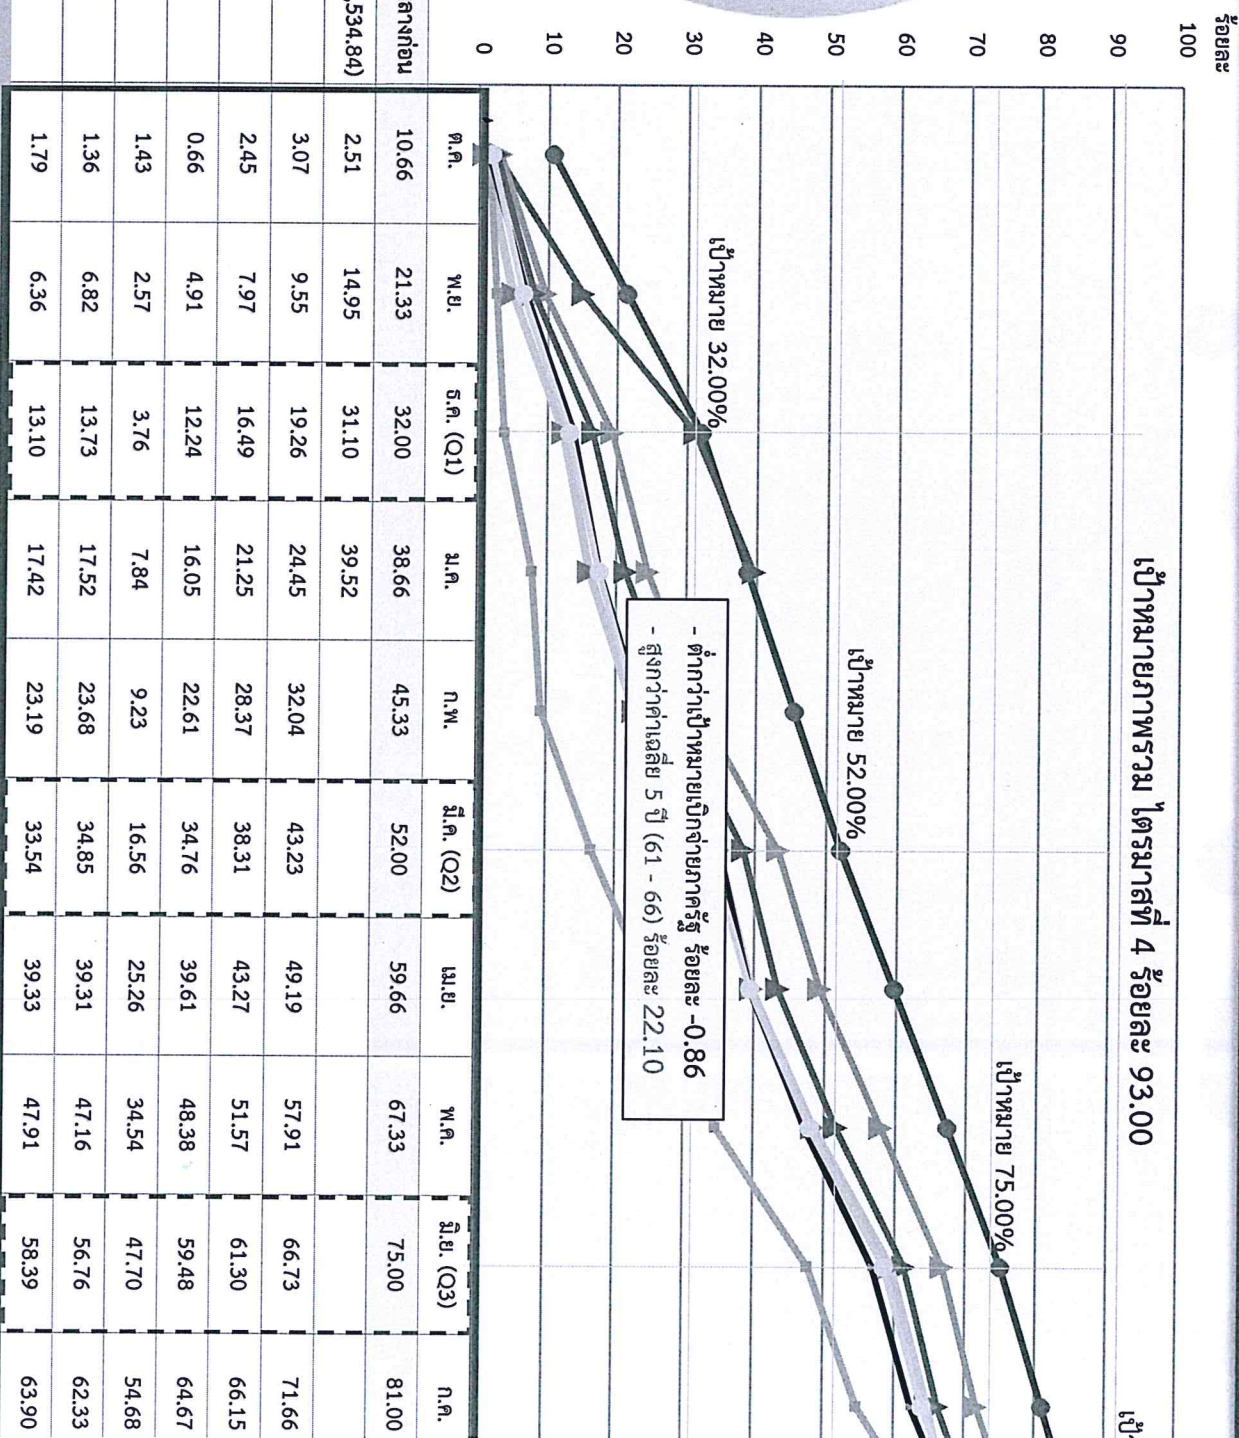

2.5


สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566 ไปพลางๆ

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567

ร้อยละ


100

เป้าหมายงบรายจ่ายลงทุน ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 75.00

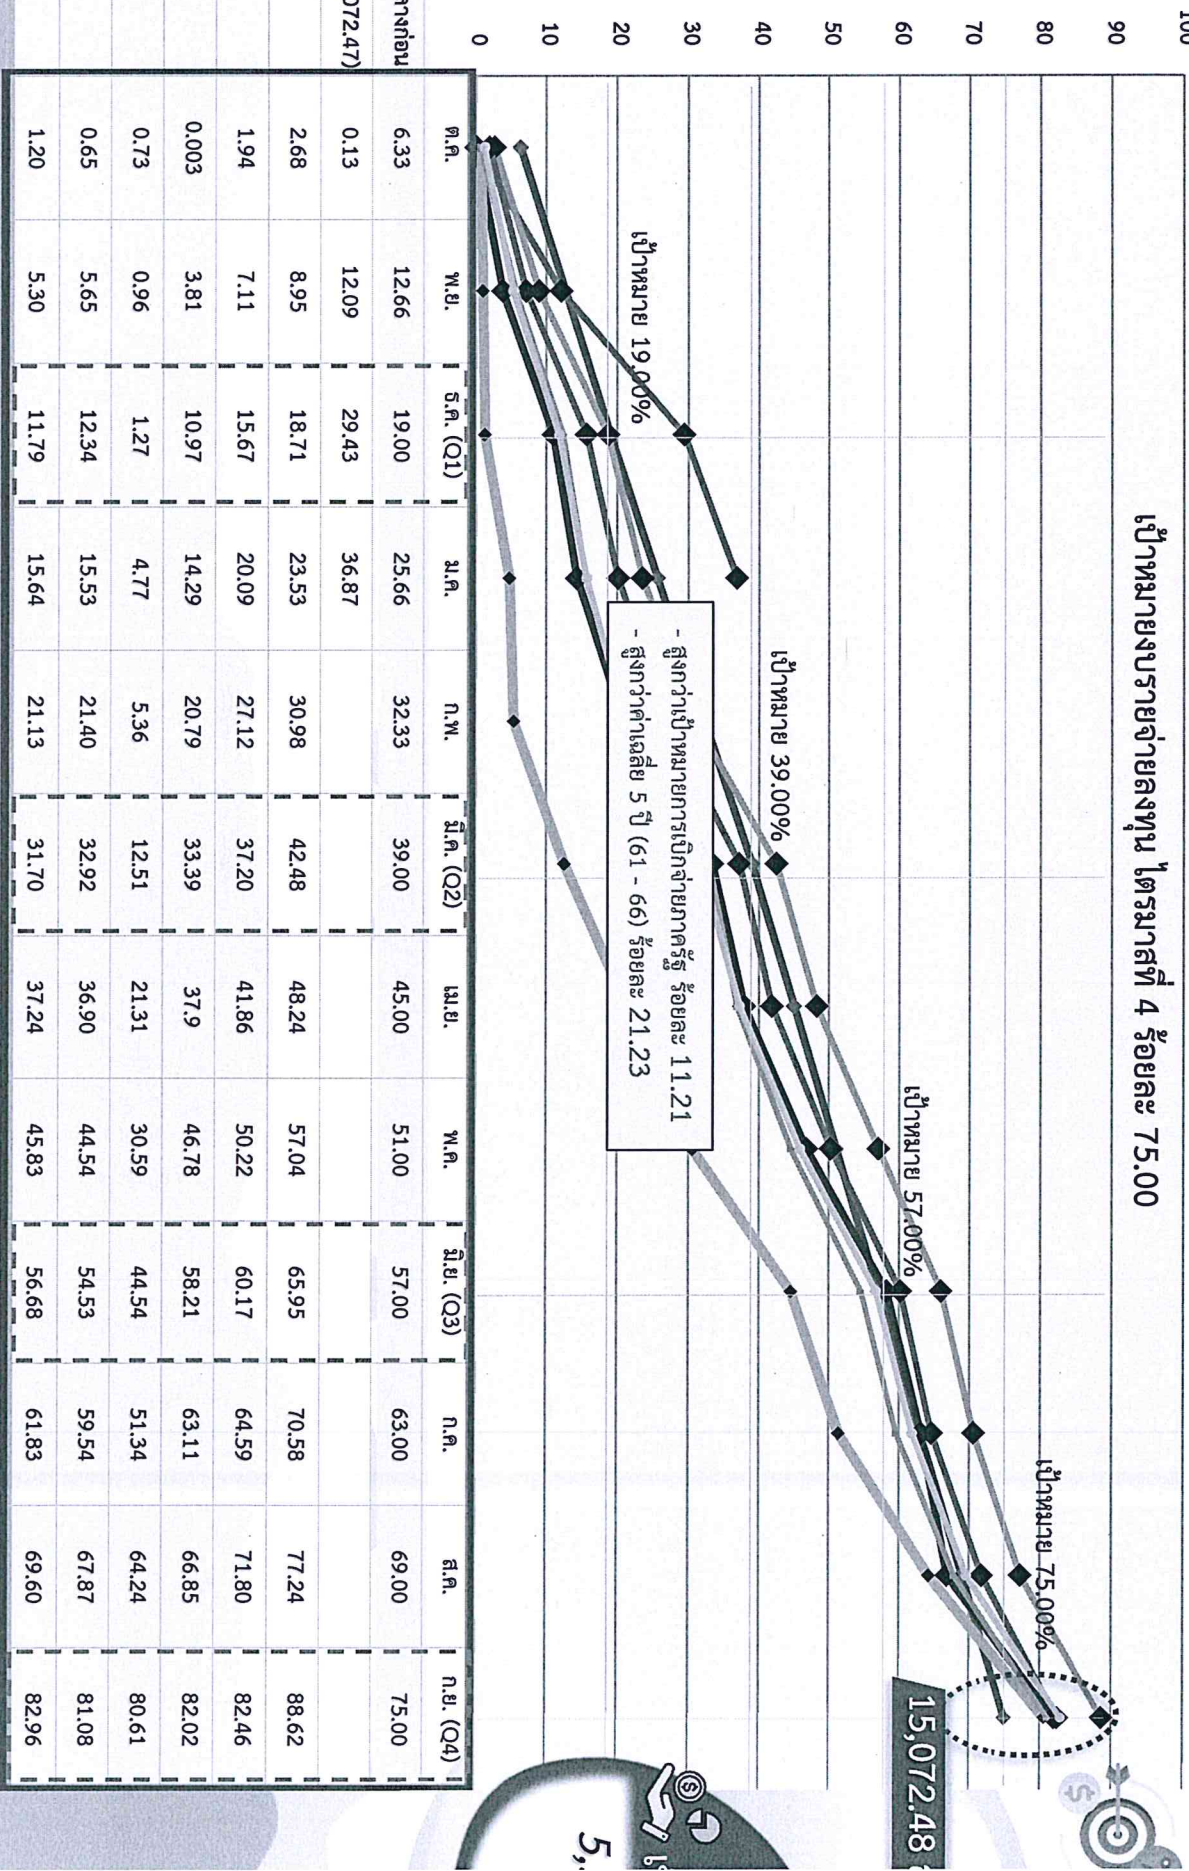

ภาพรวม


งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับเบิกเหลือเป็น

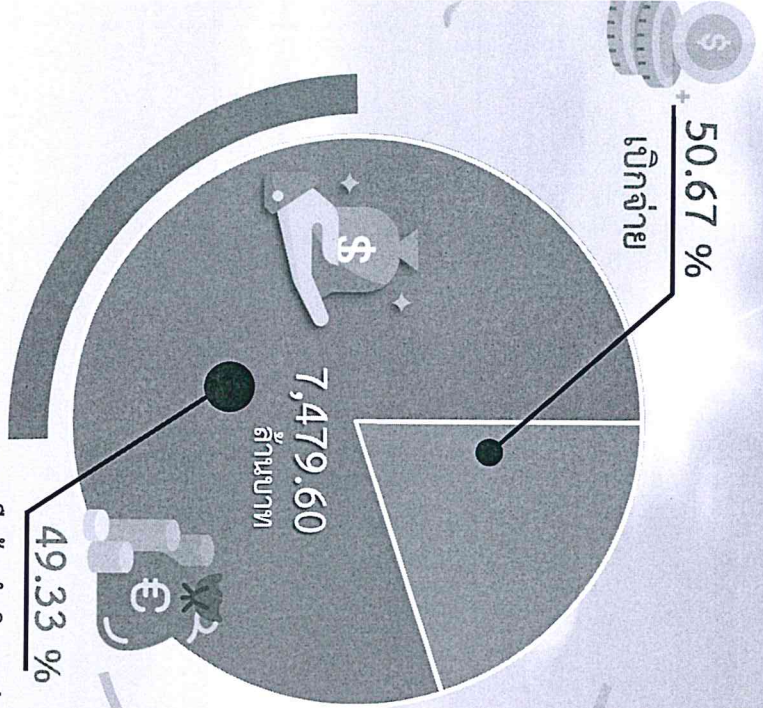

แผน/ผลการเบิกจ่าย (รายเดือน)

แผน	รวม	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67
งบประมาณ	7,479.60	797.71	2,033.71	1,248.99	796.57	765.38	651.81	385.30	227.91	223.67	107.31	68.10
เบิกจ่าย	3,789.66	797.71	1,399.12	1,090.73	502.10	765.38	651.81	385.30	227.91	223.67	107.31	68.10
คงเหลือต้องดำเนินการต่อ	3,689.94	-	-634.59	-158.26	-294.47	-	-	-	-	-	-	-

สถานะการดำเนินงาน 744 รายการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ 352 รายการ



อยู่ระหว่างก่อสร้าง 392 รายการ

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. ฝนตกชุก
4. ไฟไหม้

การดำเนินงาน

มติ ค.ร.ม./คำสั่งนายก ออนุมัติงบกลาง 66
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,206 รายการ
งบประมาณ 5,138.65 ล้านบาท
เบิกจ่าย 3,885.53 ล้านบาท
75.61 %

งบรายจ่ายงบกลางฉุกเฉิน งบพระราชดำริ (กปร)

งบประมาณ 4,207.98 ล้านบาท
เบิกจ่าย 3,157.28 ล้านบาท
75.03 %

งบประมาณ 930.67 ล้านบาท
เบิกจ่าย 728.25 ล้านบาท
78.25 %

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ 252 รายการ 20.90 %
แล้วเสร็จ 953 รายการ 79.02 %

ยกเลิก 1 รายการ 0.08 %

พื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = 2,238,553 ไร่ 80.67 %
ครัวเรือน 422,447 ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = 369,880 ครัวเรือน 87.56 %



โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	งบเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	หมายเหตุ
1 รายการ	8.86	7.77	100%	เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 87.75
2 รายการ	395.50	-	-	อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ 2 รายการ
1,142 รายการ	2,954.40	2,741.72	94.40%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 216 รายการ แล้วเสร็จ 925 รายการ ยกเลิก 1 รายการ
1 รายการ	48.96	48.96	100%	แล้วเสร็จ 1 รายการ
1 รายการ	300.00	0.63	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 รายการ
7 รายการ	500.26	358.20	57.69%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 7 รายการ
งบประมาณ 2566	17	17	100%	โครงการงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566
งบประมาณ 2566	3	3	100%	ใช้งบจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
งบประมาณ 2566	27	26	94.40%	พื้นที่รับประโยชน์ 2,600,739 ไร่ / 2,238,353 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 421,447 ครัวเรือน / 369,880 ครัวเรือน
งบประมาณ 2566	3	3	100%	ดำเนินการจัดหารถจักรยานยนต์ เพื่อการเตรียมความพร้อมเก็บเกี่ยวและบรรเทาทุกข์ ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
งบประมาณ 2566	24	24	100%	ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566
งบประมาณ 2566	106,000	106,000	100%	พื้นที่รับประโยชน์ 106,000 ไร่ / - ไร่
งบประมาณ 2566	11,80	68,000	576.27%	ปริมาณน้ำ 11.80 ล้าน ลบ.ม. / ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 68,000 ไร่ / - ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน / - ครัวเรือน

แผนการบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
การรับงบประมาณนั้นอาจทับซ้อนกับเงินอุดหนุน
(สนับสนุนโครงการหลวงเกษตร)

โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำ
แบบเคลื่อนที่เร็ว
จับด้วยระบบเปิดรอกลิก

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร
ชลประทานที่ได้รับความเสียหาย
เนื่องจากอุทกภัยปี 2565

รถปั่นฉ่ำเลี้ยงขาง ขนาด 50 ตัน
(All Terrain Crane) ทดแทน
งบประมาณที่ถูกขยับไปตามกฎหมาย

โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง
(โครงการชนของชาวลู)

โครงการแก้ไขปัญหาคูทากภัย
ระยะเร่งด่วนในพื้นที่ที่เสียหายใหญ่



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project)

5
เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณ 1,201.99 ล้านบาท
(งบจัดสรร 512.32 ล้านบาท)
เบิกจ่าย 15.77 ล้านบาท (1.31%)



ผลการดำเนินงาน : 732 รายการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ 116
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 494
ยังไม่ได้ดำเนินการ 122

6
งานกองทุน
ที่ดิน

จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 46 รายการ

งบประมาณ 346.70 ล้านบาท = เบิกจ่าย 46.71 ล้านบาท (13.47%)
(งบจัดสรร 346.70 ล้านบาท)
ผลการดำเนินงาน → อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 12 รายการ
→ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 34 รายการ
ผลสัมฤทธิ์
▪ พื้นที่เกษตรกรรม 20,526 ไร่ / - ไร่
▪ ครบเงื่อนไขประโยชน์ 1,637 ครัวเรือน / - ครัวเรือน

จัดระบบน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 41 รายการ

งบประมาณ 356.33 ล้านบาท = เบิกจ่าย 72.14 ล้านบาท (งบจัดสรร 356.39 ล้านบาท)
ผลการดำเนินงาน → อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 6 รายการ
→ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 35 รายการ
ผลสัมฤทธิ์
▪ พื้นที่เกษตรกรรม 16,016 ไร่ / - ไร่
▪ ครบเงื่อนไขประโยชน์ 1,346 ครัวเรือน / - ครัวเรือน

ภาพรวม
งบประมาณ 703.03 ล้านบาท
(งบจัดสรร 700.09 ล้านบาท)
= เบิกจ่าย 118.85 ล้านบาท (16.91%)



ผลการดำเนินงาน : 87 รายการ
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 18 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 69 รายการ
ผลสัมฤทธิ์ที่ระดับพื้นที่เกษตรกรรม 36,542 ไร่ / -
ครัวเรือนรับประโยชน์ 2,983 ครัวเรือน
