



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖ ณ.บ. ๖๐๙๒
 ที่ กพง ๐๖/๑๘๗/๒๕๖๗ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ๓๓๖๓๑๒/๕๖๓.๒.๖๗
 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 เรียน ผอ.ผง. งบ๘๘๑

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๑๓๘.๖๕๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๑๒๘.๘๐๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๕ ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น ๑,๒๐๖ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๑๑๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ ๙๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๘ และยกเลิก ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๔๕๗.๓๓๒๑๑ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑๑๕.๘๘๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๔ ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น ๒๖ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๒๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อชช. พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

ปลงจาก ชุด

(นางสาวปรารถนา ตู่ดำ)

ตป.๑ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

-ทราบ

(นางนิตยา ปานขำ)

ผชช.ผง. รักษาการแทน ผอ.ผง.

- ๕ เม.ย. ๒๕๖๗

เรียน ผอ.สชช., ผอ.ธ.ภาค, กท.๑-๕ ผอ.

เมื่อโปรดทราบ.

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

- ๕ เม.ย. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2566 - 2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2566 – 2567 มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2566 ได้รับความจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,138.6500 ล้านบาท (เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และคร่าวเรือรับประโยชน์ 422,447 คร่าวเรือ) ผลการเบิกจ่าย 4,128.8090 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.35 ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,206 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,110 รายการ คิดเป็นร้อยละ 92.04 (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,496,328 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 89.96 และคร่าวเรือรับประโยชน์ 404,747 คร่าวเรือ คิดเป็นร้อยละ 95.81) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ 95 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.88 และยกเลิก 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.08 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2567 ได้รับความจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 457.3321 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 115.8862 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.34 ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 26 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15.38 และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 22 รายการ คิดเป็นร้อยละ 84.62

ทั้งนี้ รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้

± งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย (สนับสนุนโครงการหลวงเลอตอ)

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 17 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และบริเวณใกล้เคียง

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 8.8600 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 7.7747 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.75

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่) ทั้งนี้ กรมได้รับความจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

2. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก

มติคณะรัฐมนตรี : 17 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย ภัยแล้ง หรือภัยอื่นๆ อันเกิดจากน้ำ และเพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำที่เพียงพอพร้อมปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมชลประทาน

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องจักรกลสูบน้ำที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงกับความต้องการใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พร้อมปฏิบัติงานในภารกิจของกรมชลประทานทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำ การเผชิญเหตุอุทกภัย แก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากอุทกภัย ภัยแล้ง การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 395.5000 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : -

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ทุกรายการ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

3. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี 2565

มติคณะรัฐมนตรี : 7 กุมภาพันธ์ 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร และระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และการใช้งานให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้ดีขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 2,600,739 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 421,447 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,954.3973 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 2,774.9213 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.52

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1,142 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,076 รายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,496,128 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 404,747 ครัวเรือน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 65 รายการ และยกเลิก 1 รายการ ซ่อมแซมกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากอาคารบังคับน้ำคลองบ้านผู้ใหญ่ปัญญาถึงอาคารบังคับน้ำวัดเชิงเลน ความยาว 590 เมตร เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

4. โครงการจัดการถ้ำน้ำจืดลอยน้ำ ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกพับไปตามกฎหมาย

สำนักรงบประมาณอนุมัติ : 3 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตลอดจนบริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องหาเครื่องจักรกลทดแทนและให้เพียงพอ สามารถใช้ในการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของกรมได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลให้เพียงพอกับการปฏิบัติการกิจของกรม รวมทั้งรองรับการป้องกัน แก้มิ และบรรเทาอุทกภัยจึงต้องจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก้มิ และบรรเทาอุทกภัย

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีรถปั้นจั่น เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้มิและบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 48.9600 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 48.9600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

5. โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ)

มติคณะรัฐมนตรี : 7 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อทดน้ำจากแม่น้ำปิงให้เข้าอาคารปากคลองส่งน้ำ คลองหนองขวัญ ซึ่งจะมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 84,000 ไร่ และเพื่อการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์บางส่วน อีกทั้งเพื่อให้ราษฎรมีสภาพเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากรายได้ของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 106,000 ไร่

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 300.0000 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 71.4813 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.83

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

6. โครงการแก้ไขปัญหาคอขวดกักน้ำในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่

มติคณะรัฐมนตรี : 14 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาคอขวดกักน้ำเจ้าพระยาในปี พ.ศ. 2566 รวมทั้งบรรเทาและป้องกันความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 68,000 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 500.2588 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 420.6191 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.08

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 7 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 4 รายการ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2566

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 930.6739 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 805.0526 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.50

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 52 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 29 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 23 รายการ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานและงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2566 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 4 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 และครั้งที่ 5 วันที่ 25 กันยายน 2566

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 18 มกราคม 2567

วัตถุประสงค์ : ดำเนินการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในรายการก่อสร้างต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 58.3650 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 58.3650 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 4 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ

2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2567

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 398.9671 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 57.5212 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.42

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 22 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างทุกรายการ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานและงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 มีนาคม 2567

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2566

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN

ตัวชี้วัดของโครงการ

การดำเนินงาน

มีมติ คร.ม./คำสั่งนายกรัฐมนตรี 66
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,206 รายการ
งบประมาณ 5,138.6500 ล้านบาท
เบิกจ่าย 4,128.8090 ล้านบาท
80.35 %

งบรายจ่ายงบกลางทุกเดือน งบประมาณรายจ่าย (กปร.)

งบประมาณ 4,207.9761 ล้านบาท
เบิกจ่าย 3,323.7564 ล้านบาท
87.75 %

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ 95 รายการ 7.88 %
แล้วเสร็จ 1,110 รายการ 92.04 %

ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = 2,496,328 ไร่ 89.96 %
ครัวเรือน 422,447 ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = 404,747 ครัวเรือน 95.81 %



1 รายการ 8.8600 ล้านบาท
เบิกจ่าย 7.7747 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.75

2 รายการ 395.5000 ล้านบาท
เบิกจ่าย - คิดเป็นร้อยละ -

1,142 รายการ 2,954.3973 ล้านบาท
เบิกจ่าย 2,774.9213 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.52

1 รายการ 48.9600 ล้านบาท
เบิกจ่าย 48.9600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

1 รายการ 300.0000 ล้านบาท
เบิกจ่าย 71.4813 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.83

7 รายการ 500.2588 ล้านบาท
เบิกจ่าย 420.6191 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.08

แล้วเสร็จ 1 รายการ 100 %

2 รายการ - %

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 65 รายการ 96.50 %
แล้วเสร็จ 1,076 รายการ
ยกเลิก 1 รายการ

แล้วเสร็จ 1 รายการ 100 %

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 รายการ 36.93 %

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 4 รายการ
แล้วเสร็จ 3 รายการ 75.13 %

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ / 200 ไร่

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ และสนับสนุนการป้องกันบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติจากภัย ก้นแห้ง หรือภัยอื่นๆ อันเกิดจากน้ำ และเพื่อให้มีเครือข่ายที่เพียงพอพร้อมปฏิบัติงานตามหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในชุมชน และตามภารกิจ

พื้นที่รับประโยชน์ 2,600,739 ไร่ / 2,496,128 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 421,447 ครัวเรือน / 404,747 ครัวเรือน

ดำเนินการจัดการพื้นที่รับน้ำ เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

พื้นที่รับประโยชน์ 106,000 ไร่ / - ไร่

ปริมาณน้ำ 11.80 ล้าน ลบ.ม. / - ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 66,000 ไร่ / - ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน / - ครัวเรือน

แผนงานบริหารเพื่อรองรับการเกิดอุทกภัยหรือภัยแล้งเป็นรายปีระบบส่งน้ำในพื้นที่รับน้ำในเขตลุ่มน้ำย่อย (ตำบลทุ่งทรายทรายกลางเขตอชอ)

โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแบบเคลื่อนที่เร็ว ชีวด้วยระบบโซลาร์เซลล์

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี 2565

รสนับจันต์ลอยาง ขนาด 50 ต้น (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกขโมยไปตามกฎหมาย

โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการของขงอชอ)

โครงการแก้ไขปัญหาลูกข่ายระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่






ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2567



ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project

งบกลาง 2567

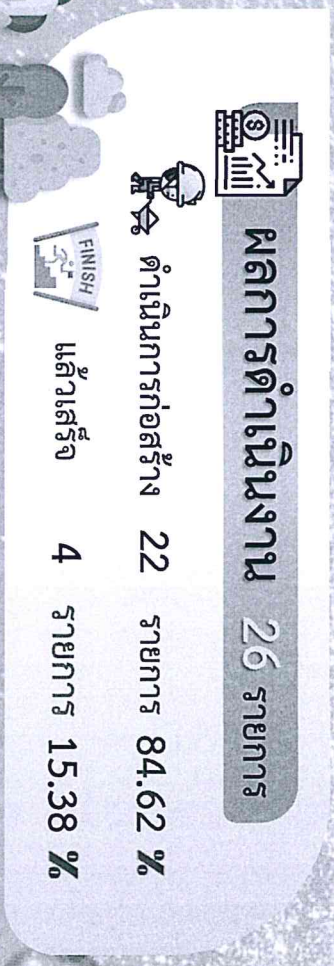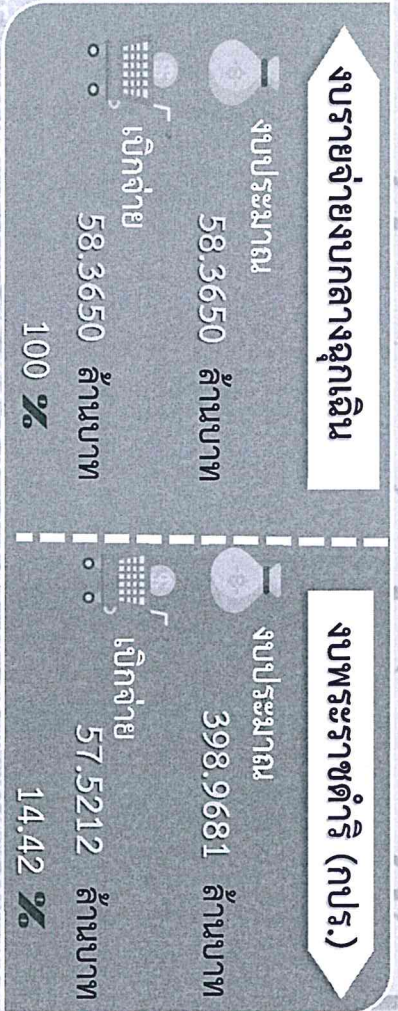

เป็นเงินชุดแยกต่างหากก่อสร้างตามสัญญาแบบรับราคาใต้ (ค่า K) ในรายการก่อสร้างต่าง ๆ

เงินชุดแยกต่างหากก่อสร้างตามสัญญาแบบรับราคาใต้ (ค่า K)

ดำเนินการก่อสร้างจัดหาแหล่งน้ำ ให้ประชาชนและ โครเนื่องมาจากโครงการอันเนื่องมาจาก (กปร.) ปร

