

รายงานสถานการณ์น้ำ


ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โทร. 02 669 2560 E-mail : wmsc.1460@gmail.com



วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566



สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (วันที่ 16 มิ.ย. 66 เวลา 06.00 น.)

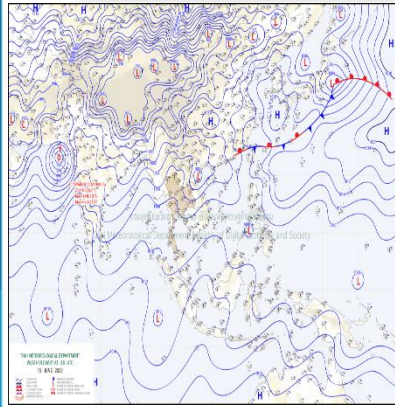


มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ในขณะที่ร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศเมียนมาและลาวตอนบน มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทย ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ โดยมีฝนตกหนัก บางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อ.สบ้าย้อย จ.สงขลา 51.0 มม. อ.ศิริมาต จ.สุโขทัย 50.0 มม. และ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 48.8 มม.

แหล่งที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

ปริมาณน้ำใช้การ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

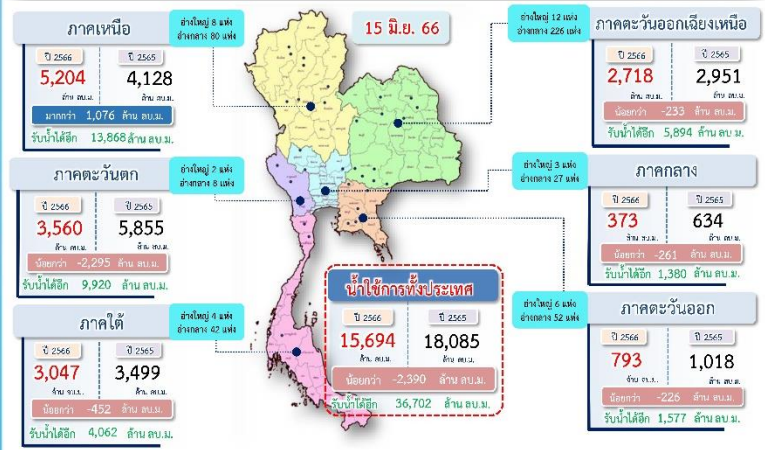

สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 66)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริกิตี แคว้น้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 16 มิถุนายน 2566

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		รับน้ำได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุ	ปริมาณน้ำ	% ใช้การ	วันที่	เมื่อวาน	วันที่	เมื่อวาน	
ภูมิพล	6,924	51	3,124	32	0.54	0.00	30.00	32.00	6,538
สิริกิตี	3,857	41	1,007	15	3.48	1.44	17.00	15.00	5,653
ภูมิพล+สิริกิตี	10,781	47	4,131	25	4.02	1.44	47.00	47.00	12,191
แคว้น้อยฯ	180	19	137	15	0.48	0.13	1.73	1.73	759
ป่าสักชลสิทธิ์	132	14	129	13	0.00	0.00	1.04	1.04	828
รวมทั้งหมด	11,093	45	4,397	24	4.50	1.57	49.77	49.77	13,778

*หมายเหตุ: () คือ เก็บความจุเกินกักเก็บ (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 66
โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลาการจ้างงาน 3-10 เดือน มีแผนการจ้างจำนวน 86,000 คน ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานไปแล้ว จำนวน 79,467 คน คิดเป็นร้อยละ 92.40



คุณภาพน้ำ (วันที่ 16 มิ.ย. 66 เวลา 07.00 น.)

(หน่วย : กรัม/ลิตร)

แม่น้ำ	สถานีเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม
เจ้าพระยา	ประปาสำแล จ.ปทุมธานี	0.25	0.18 (ปกติ)
	บางปะกง	ปตร.หาดยาง (ควบคุมตลอดทั้งปี)	1.00
ท่าจีน	ด้านนอกคลองจินดา	0.75	0.30 (ปกติ)
	ด้านในคลองจินดา	0.75	0.29 (ปกติ)
แม่กลอง	ปากคลองดำเนินสะดวก	2.00	0.25 (ปกติ)

ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2566 และผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2565/66

ผลจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2566 (1 พ.ค.66 - 31 ต.ค.66)
ข้อมูลผลจัดสรรน้ำ ณ วันที่ 15 มิ.ย.66

ทั้งประเทศ แผนจัดสรรน้ำ 14,851 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 5,378 ล้าน ลบ.ม. (37%)
แผนเพาะปลูกข้าวนาปี (14 มิ.ย.66) 16.98 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 7.58 ล้านไร่ (45%)
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนจัดสรรน้ำ 5,500 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 2,272 ล้าน ลบ.ม. (42%)
แผนเพาะปลูกข้าวนาปี (14 มิ.ย.66) 8.05 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 5.26 ล้านไร่ (65%)

ผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2565/66 (1 ม.ค.66 - 30 มิ.ย.66)
ข้อมูลผลจัดสรรน้ำ ณ วันที่ 15 มิ.ย.66

ลุ่มน้ำแม่กลอง แผนจัดสรรน้ำ 5,500 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 4,770 ล้าน ลบ.ม. (87%)
แผนเพาะปลูกข้าวนาปรัง (14 มิ.ย.66) 0.84 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 0.83 ล้านไร่ (98%)

กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ 2 ดำเนินการติดตั้งเครื่องกว้านบานระบายชนิดบานโค้งขนาด 6.00 x 4.00 เมตร ณ บริเวณอาคาร 3La - RMC ตำบลสันกลาง อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 ดำเนินการกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ขวา บริเวณพื้นที่ ตำบลรามะสัก อำเภอโศก จังหวัดอ่างทอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน
- โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 ดำเนินการนำรถแบคโฮ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ เนื่องจากอ่างเก็บน้ำมีสภาพตื้นเขิน ณ อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูฝน

