

# รายงานสถานการณ์น้ำ


ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โทร. 02 669 2560 E-mail : wmsc.1460@gmail.com



วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566



## สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (วันที่ 17 ส.ค. 66 เวลา 06.00 น.)

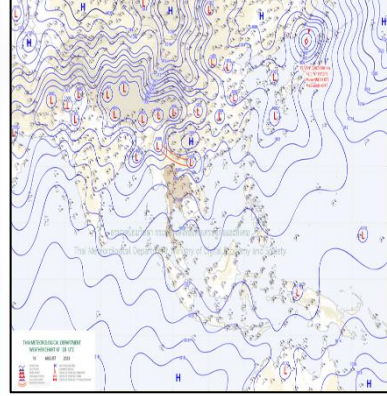


มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในขณะที่ร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออก

ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 105.0 มม. อ.ผาขาว จ.เลย 100.0 มม. และ อ.ปากชม จ.เลย 99.5 มม.

แหล่งที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

## ปริมาณน้ำใช้การ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

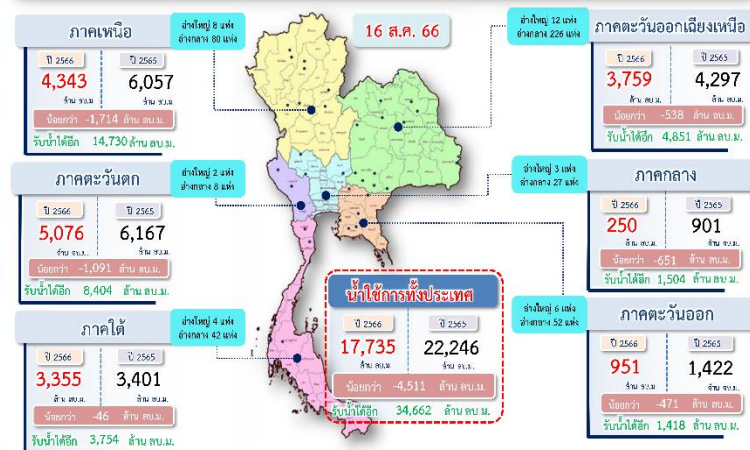

## สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 66)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 17 สิงหาคม 2566

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่าง	ปริมาณน้ำใช้การได้	ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง	ปริมาณน้ำระบาย	รับน้ำได้อีก				
	ปริมาณน้ำ	% ความจุ	ปริมาณน้ำ	% ใช้การ	วินาที	วินาที	เมื่อวาน	วินาที	
ภูมิพล	5,701	42	1,901	20	6.88	8.42	25.00	25.00	7,761
สิริกิติ์	4,339	46	1,489	22	30.56	28.95	12.86	13.01	5,171
ภูมิพล+สิริกิติ์	10,040	44	3,390	21	37.44	37.37	37.86	38.01	12,932
แควน้อยฯ	163	17	120	13	0.70	1.18	1.30	1.30	776
ป่าสักชลสิทธิ์	82	9	79	8	0.00	0.00	1.74	1.74	878
รวมทั้งหมด	10,285	41	3,589	20	38.14	38.55	40.90	41.05	14,586

หมายเหตุ: ( ) คือ สิ้นปริมาณจุดกึ่งกลาง (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

## โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 66

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลาการจ้างงาน 3-10 เดือน มีแผนการจ้างจำนวน 86,000 คน ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานไปแล้ว จำนวน 87,530 คน คิดเป็นร้อยละ 101.78



## คุณภาพน้ำ (วันที่ 17 ส.ค. 66 เวลา 07.00 น.)

(หน่วย : กรัม/ลิตร)

แม่น้ำ	สถานีเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม
เจ้าพระยา	ประปาสำแล จ.ปทุมธานี	0.25	0.21 (ปกติ)
			วันที่ 16 ส.ค.66 ค่าสูงสุด 0.28
บางปะกง	วัดบางคาง	1.00	0.04 (ปกติ)
ท่าจีน	ด้านนอกคลองจินดา	0.75	0.31 (ปกติ)
	ด้านในคลองจินดา	0.75	0.19 (ปกติ)
แม่กลอง	ปากคลองดำเนินสะดวก	2.00	0.15 (ปกติ)

## ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2566 และผลการเพาะปลูกข้าวนาปี

ผลจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค.66)

ทั้งประเทศ แผนจัดสรรน้ำ 14,851 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 12,108 ล้าน ลบ.ม. (82%)  
 กลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนจัดสรรน้ำ 5,500 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 5,010 ล้าน ลบ.ม. (91%)  
 กลุ่มน้ำแม่กลอง แผนจัดสรรน้ำ 3,800 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 884 ล้าน ลบ.ม. (23%)

## การเพาะปลูกข้าวนาปี (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ส.ค.66)

ทั้งประเทศ แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 16.98 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 14.05 ล้านไร่ (83%)  
 กลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 8.05 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 7.29 ล้านไร่ (91%)  
 กลุ่มน้ำแม่กลอง แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 0.88 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 0.37 ล้านไร่ (42%)

## กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน

- โครงการชลประทานพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และตรวจสอบความพร้อมใช้งานอาคารชลประทาน ณ ประตูดระบายน้ำคลองท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝน
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณเขื่อนพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 ดำเนินการกำจัดวัชพืช บริเวณด้านท้าย ประตูดระบายน้ำปากคลอง 13 (คลองตัน) หมู่ที่ 5 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝน

