

# รายงานสถานการณ์น้ำ


ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โทร. 02 669 2560 E-mail : wmsc.1460@gmail.com



วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566



## สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (วันที่ 18 มิ.ย. 66 เวลา 06.00 น.)

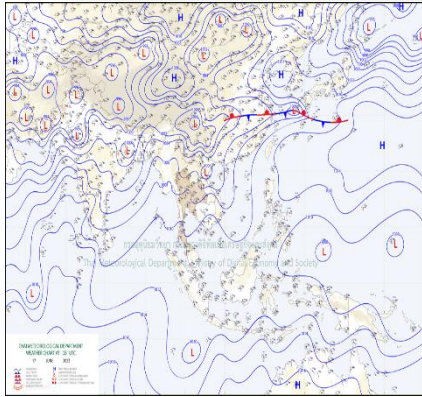


มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ส่วนมากบริเวณด้านรับมรสุม และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อ.สีเกา จ.ตรัง 134.0 มม. อ.วังยาง จ.นครพนม 133.8 มม. และ อ.ภูผินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 123.4 มม.

แหล่งที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

## ปริมาณน้ำใช้การ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

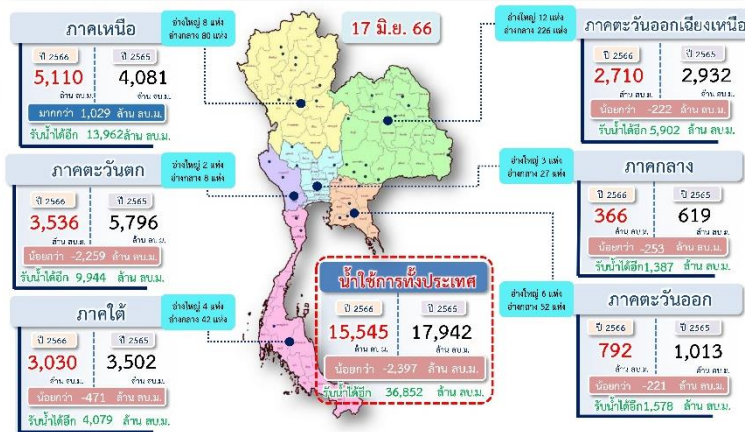

## สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 66)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 18 มิถุนายน 2566

| อ่างเก็บน้ำ      | ปริมาณน้ำในอ่างฯ | ปริมาณน้ำใช้การได้ | ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | รับน้ำได้อีก |          |        |          |        |
|------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------|--------|----------|--------|
|                  | ปริมาณน้ำ        | % ความจุ           | ปริมาณน้ำ           | % ใช้การ       | วัน          | เมื่อวาน | วันนี้ | เมื่อวาน | วันนี้ |
| ภูมิพล           | 6,862            | 51                 | 3,062               | 32             | 0.00         | 0.49     | 30.00  | 30.00    | 6,600  |
| สิริกิติ์        | 3,829            | 40                 | 979                 | 15             | 5.15         | 1.96     | 17.02  | 17.00    | 5,681  |
| ภูมิพล+สิริกิติ์ | 10,691           | 47                 | 4,041               | 25             | 5.15         | 2.45     | 47.02  | 47.00    | 12,281 |
| แควน้อยฯ         | 178              | 19                 | 135                 | 15             | 0.65         | 0.81     | 1.73   | 1.73     | 761    |
| ป่าสักชลสิทธิ์   | 131              | 14                 | 128                 | 13             | 0.40         | 0.83     | 1.05   | 1.04     | 829    |
| รวมทั้งสิ้น      | 11,000           | 44                 | 4,304               | 24             | 6.20         | 4.09     | 49.79  | 49.77    | 13,871 |

\*หมายเหตุ: ( ) คือ เห็นความจุเกินกักเก็บ (หน่วย - ล้าน ลบ.ม.)

## โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 66  
โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลาการจ้างงาน 3-10 เดือน มีแผนการจ้างจำนวน 86,000 คน ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานไปแล้ว จำนวน 79,467 คน คิดเป็นร้อยละ 92.40



## คุณภาพน้ำ (วันที่ 18 มิ.ย. 66 เวลา 07.00 น.)

(หน่วย : กรัม/ลิตร)

| แม่น้ำ    | สถานีเฝ้าระวัง                | เกณฑ์เฝ้าระวัง | ค่าความเค็ม                      |
|-----------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| เจ้าพระยา | ประปาสำแล จ.ปทุมธานี          | 0.25           | 0.18 (ปกติ)                      |
| บางปะกง   | ปตร.หาดยาง (ควบคุมตลอดทั้งปี) | 1.00           | 0.00 (ปกติ)<br>วันที่ 17 มิ.ย.66 |
| ท่าจีน    | ด้านนอกคลองจินดา              | 0.75           | 0.31 (ปกติ)                      |
|           | ด้านในคลองจินดา               | 0.75           | 0.31 (ปกติ)                      |
| แม่กลอง   | ปากคลองดำเนินสะดวก            | 2.00           | 0.54 (ปกติ)                      |

## ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2566 และผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2565/66

ผลจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2566 (1 พ.ค.66 - 31 ต.ค.66)  
ข้อมูลผลจัดสรรน้ำ ณ วันที่ 17 มิ.ย.66

ทั้งประเทศ แผนจัดสรรน้ำ 14,851 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 5,590 ล้าน ลบ.ม. (38%)  
แผนเพาะปลูกข้าวนาปี (14 มิ.ย.66) 16.98 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 7.58 ล้านไร่ (45%)  
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนจัดสรรน้ำ 5,500 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 2,372 ล้าน ลบ.ม. (44%)  
แผนเพาะปลูกข้าวนาปี (14 มิ.ย.66) 8.05 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 5.26 ล้านไร่ (65%)

ผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2565/66 (1 ม.ค.66 - 30 มิ.ย.66)  
ข้อมูลผลจัดสรรน้ำ ณ วันที่ 17 มิ.ย.66

ลุ่มน้ำแม่กลอง แผนจัดสรรน้ำ 5,500 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 4,820 ล้าน ลบ.ม. (88%)  
แผนเพาะปลูกข้าวนาปรัง (14 มิ.ย.66) 0.84 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 0.83 ล้านไร่ (98%)

## กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโสมง สำนักงานชลประทานที่ 5 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน บริเวณประตูระบายน้ำห้วยลาน และบริเวณสถานีสูบน้ำที่ 3 ตำบลน้ำโสม อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย สำนักงานชลประทานที่ 6 ดำเนินการขุดลอกตะกอนดินและซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บริเวณคลอง 3L-RMC กม.13+200 บ้านคุยโพธิ์ ตำบลปลิงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมการส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรหากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงฤดูฝน
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำกาศคลองนครเนื่องเขต ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงรักษาความสะอาดและลดปัญหาน้ำเน่าเสีย

