

รายงานสถานการณ์น้ำ


ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โทร. 02 669 2560 E-mail : wmsc.1460@gmail.com



วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566



สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (วันที่ 19 มิ.ย. 66 เวลา 06.00 น.)

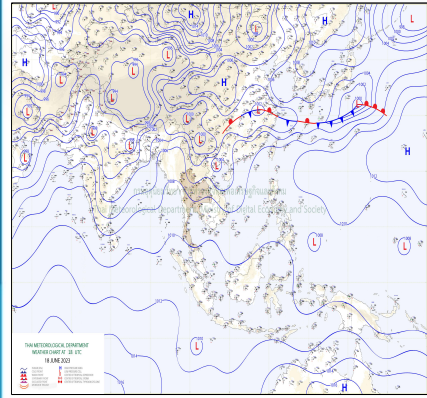


มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณด้านรับมรสุม

ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี 151.2 มม. อ.เต่างอย จ.สกลนคร 129.0 มม. และ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 128.0 มม.

แหล่งที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

ปริมาณน้ำใช้การ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

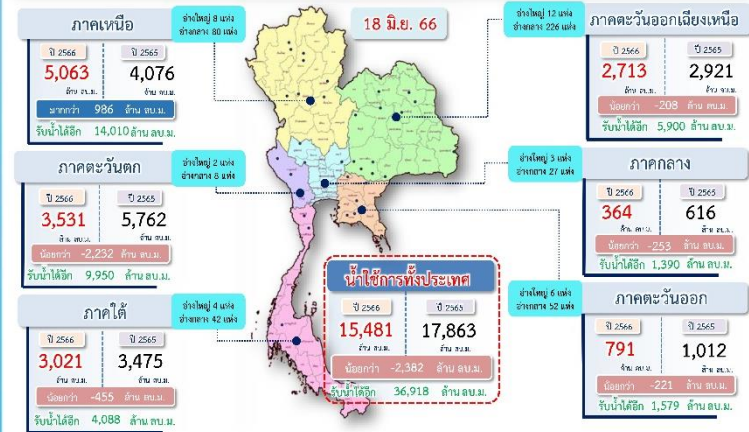

สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย. 66)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 19 มิถุนายน 2566

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ ปริมาณน้ำ % ความจุ	ปริมาณน้ำใช้การได้ ปริมาณน้ำ % ใช้การ	ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ	ปริมาณน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย	รับน้ำได้
ภูมิพล	6,831 51	3,031 31	0.00 0.00	30.00 30.00	6,631
สิริกิติ์	3,815 40	965 14	3.64 5.15	17.04 17.02	5,695
ภูมิพล+สิริกิติ์	10,646 46	3,996 24	3.64 5.15	47.04 47.02	12,326
แควน้อยฯ	177 19	134 15	0.97 0.65	1.73 1.73	762
ป่าสักชลสิทธิ์	130 13	127 13	0.00 0.40	1.04 1.05	830
รวมทั้งหมด	10,953 44	4,257 23	4.61 6.20	49.81 49.79	13,919

หมายเหตุ: () คือ ปริมาณจุดเก็บกัก (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 66

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลาการจ้างงาน 3-10 เดือน มีแผนการจ้างจำนวน 86,000 คน ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานไปแล้ว จำนวน 79,467 คน คิดเป็นร้อยละ 92.40



คุณภาพน้ำ (วันที่ 19 มิ.ย. 66 เวลา 07.00 น.)

(หน่วย : กรัม/ลิตร)

แม่น้ำ	สถานีเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม
เจ้าพระยา	ประปาสำแล จ.ปทุมธานี	0.25	0.18 (ปกติ)
บางปะกง	ปตร.หาดยาง (ควบคุมตลอดทั้งปี)	1.00	0.00 (ปกติ) วันที่ 18 มิ.ย.66
	ด้านนอกคลองจินดา	0.75	0.31 (ปกติ)
ท่าจีน	ด้านในคลองจินดา	0.75	0.30 (ปกติ)
	ปากคลองดำเนินสะดวก	2.00	0.46 (ปกติ)

ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2566 และผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2565/66

ผลจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2566 (1 พ.ค.66 - 31 ต.ค.66)
ข้อมูลผลจัดสรรน้ำ ณ วันที่ 18 มิ.ย.66

ทั้งประเทศ แผนจัดสรรน้ำ 14,851 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 5,696 ล้าน ลบ.ม. (39%)
แผนเพาะปลูกข้าวนปี (14 มิ.ย.66) 16.98 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 7.58 ล้านไร่ (45%)
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนจัดสรรน้ำ 5,500 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 2,421 ล้าน ลบ.ม. (45%)
แผนเพาะปลูกข้าวนปี (14 มิ.ย.66) 8.05 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 5.26 ล้านไร่ (65%)

ผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2565/66 (1 ม.ค.66 - 30 มิ.ย.66)
ข้อมูลผลจัดสรรน้ำ ณ วันที่ 18 มิ.ย.66

ลุ่มน้ำแม่กลอง แผนจัดสรรน้ำ 5,500 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 4,845 ล้าน ลบ.ม. (89%)
แผนเพาะปลูกข้าวนปี (14 มิ.ย.66) 0.84 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 0.83 ล้านไร่ (98%)

กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบว สำนักงานชลประทานที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามงานบำรุงรักษากำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำซี.81 ช่วง กม.0+000 - กม.1+000 บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำรอง สำนักงานชลประทานที่ 8 ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำน้ำรอง อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย และอ่างเก็บน้ำลำจังหัน จังหวัดบุรีรัมย์ ผลจากการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ทั้ง 4 อ่าง พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมชลประทาน
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาธารน้ำ-กระแสน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ดำเนินการนำเครื่องจักรกลรถขุดดินตะขบ ขุดลอกตะกอนดิน บริเวณปากคลองเชิงแส ตำบลเชิงแส อำเภอกะเสสิทธิ์ จังหวัดสงขลา เนื่องจากพื้นที่นี้มีสภาพดินเลนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

