

รายงานสถานการณ์น้ำ


ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โทร. 02 669 2560 E-mail : wmsc.1460@gmail.com



วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566



สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (วันที่ 20 ก.ค. 66 เวลา 06.00 น.)

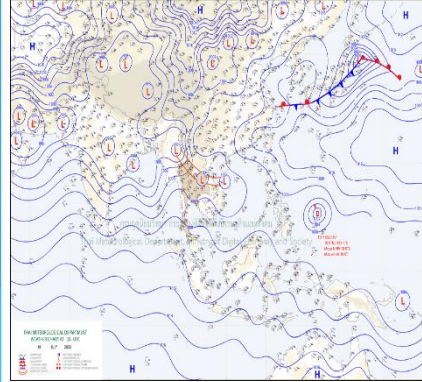


ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง

ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อ.เมืองพังงา จ.พังงา 152.0 มม. อ.ควนกาหลง จ.สตูล 132.0 มม. และ อ.สะเตกา จ.พังงา 105.0 มม.

แหล่งที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

ปริมาณน้ำใช้การ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

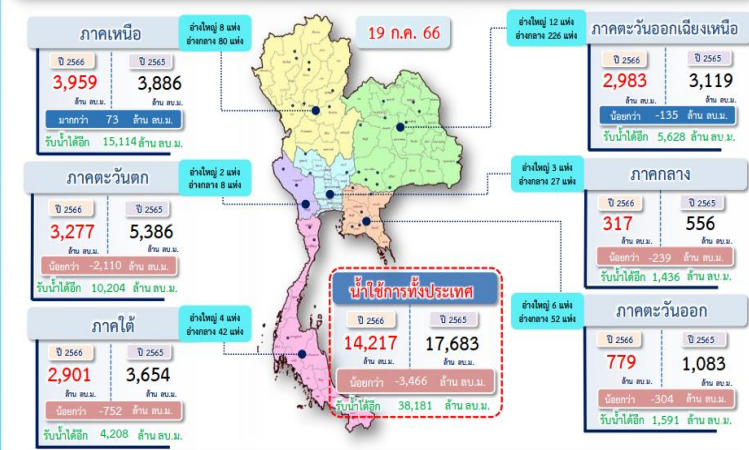

สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 66)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		รับน้ำได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุ	ปริมาณน้ำ	% ใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,993	45	2,193	23	0.00	1.49	22.00	22.00	7,469
สิริกิติ์	3,633	38	783	12	12.50	20.03	14.96	15.00	5,877
ภูมิพล+สิริกิติ์	9,626	42	2,976	18	12.50	21.52	36.96	37.00	13,346
แควน้อยฯ	156	17	113	13	1.28	1.01	1.73	1.73	783
ป่าสักชลสิทธิ์	109	11	106	11	0.36	0.36	1.04	1.04	851
รวมทั้งหมด	9,892	40	3,196	18	14.14	22.88	39.73	39.77	14,979

*หมายเหตุ: () คือ เป็นหน่วยลบกับปกติ

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 66
โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลาการจ้างงาน 3-10 เดือน มีแผนการจ้างจำนวน 86,000 คน ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานไปแล้ว จำนวน 85,771 คน คิดเป็นร้อยละ 99.73



คุณภาพน้ำ (วันที่ 20 ก.ค. 66 เวลา 07.00 น.)

(หน่วย : กรัม/ลิตร)

แม่น้ำ	สถานีเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม
เจ้าพระยา	ประปาสำแล จ.ปทุมธานี	0.25	0.20 (ปกติ)
	วัดบางคาง	1.00	0.08 (ปกติ)
ท่าจีน	ด้านนอกคลองจินดา	0.75	0.29 (ปกติ)
	ด้านในคลองจินดา	0.75	0.26 (ปกติ)
แม่กลอง	ปากคลองดำเนินสะดวก	2.00	0.16 (ปกติ)

ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2566 และผลการเพาะปลูกข้าวนาปี

ผลจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค.66)

ทั้งประเทศ แผนจัดสรรน้ำ 14,851 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 8,902 ล้าน ลบ.ม. (60%)
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนจัดสรรน้ำ 5,500 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 3,860 ล้าน ลบ.ม. (70%)
ลุ่มน้ำแม่กลอง แผนจัดสรรน้ำ 3,800 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 342 ล้าน ลบ.ม. (9%)

การเพาะปลูกข้าวนาปี (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค.66)

ทั้งประเทศ แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 16.98 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 11.66 ล้านไร่ (69%)
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 8.05 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 6.69 ล้านไร่ (83%)
ลุ่มน้ำแม่กลอง แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 0.88 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 0.24 ล้านไร่ (27%)

กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทานที่ 4 ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและเศษขยะที่กีดขวางทางน้ำ บริเวณตำบลลำกระด้างทอง อำเภอรามกระด้าง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน
- โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 ดำเนินการนำเรือขุดแบ็คโฮ (แบบบีปะ) จำนวน 2 ลำ เข้ากำจัดวัชพืช (ผักตบชวา) บริเวณสะพานบางขนาก ตำบลบางแดน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566
- โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 ดำเนินการรื้อสะพานข้ามคลองชุมพร (เก่า) และสิ่งที่ยังกีดขวางทางน้ำ บริเวณสะพานหน้าวัดพระขวาง ตำบลขุนกระโทก อำเภอมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อให้สามารถเร่งระบายน้ำที่เอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนได้เร็วขึ้น

