

รายงานสถานการณ์น้ำ


ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โทร. 02 669 2560 E-mail : wmsc.1460@gmail.com



วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566



สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (วันที่ 21 ส.ค. 66 เวลา 06.00 น.)

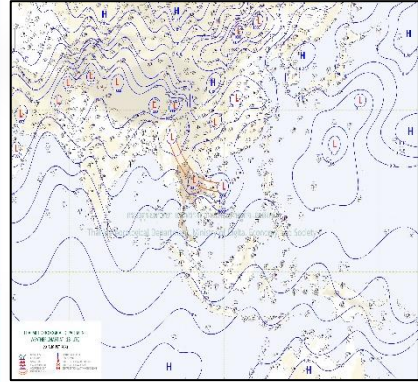


ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 119.9 มม. อ.เมืองจตุรดิตถ์ จ.จตุรดิตถ์ 111.0 มม. และ อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร 102.5 มม.

แหล่งที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

ปริมาณน้ำใช้การ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

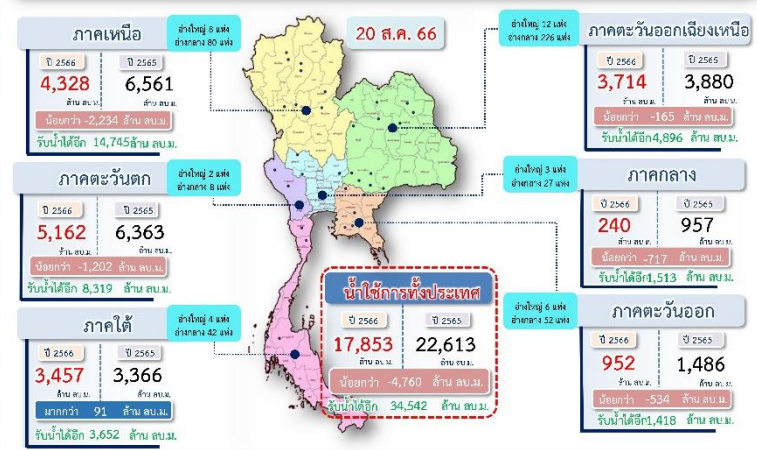

สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 66)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 21 สิงหาคม 2566

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่าง		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง		ปริมาณน้ำระบาย		รับน้ำได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุ	ปริมาณน้ำ	% ใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,630	42	1,830	19	9.95	8.19	25.00	25.00	7,832
สิริกิติ์	4,392	46	1,542	23	22.15	25.22	12.95	12.58	5,118
ภูมิพล+สิริกิติ์	10,022	44	3,372	21	32.10	33.41	37.95	37.58	12,950
แควน้อยฯ	161	17	118	13	0.55	0.89	1.30	1.30	778
ป่าสักชลสิทธิ์	75	8	72	8	0.00	0.00	1.04	1.04	885
รวมทั้งหมด	10,258	41	3,562	20	32.65	34.30	40.29	39.92	14,613

หมายเหตุ: () คือ ปริมาณขุดเก็บปกติ (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 66
โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลาการจ้างงาน 3-10 เดือน มีแผนการจ้างจำนวน 86,000 คน ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานไปแล้ว จำนวน 90,539 คน คิดเป็นร้อยละ 105.28



คุณภาพน้ำ (วันที่ 21 ส.ค. 66 เวลา 07.00 น.)

(หน่วย : กรัม/ลิตร)

แม่น้ำ	สถานีเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม
เจ้าพระยา	ประปาสำแล จ.ปทุมธานี	0.25	0.20 (ปกติ)
			วันที่ 20 ส.ค.66 ค่าสูงสุด 0.23
บางปะกง	วัดบางคาง	1.00	0.05 (ปกติ)
ท่าจีน	ด้านนอกคลองจินดา	0.75	0.29 (ปกติ)
	ด้านในคลองจินดา	0.75	0.27 (ปกติ)
แม่กลอง	ปากคลองดำเนินสะดวก	2.00	0.16 (ปกติ)

ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2566 และผลการเพาะปลูกข้าวนาปี

ผลจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค.66)

ทั้งประเทศ แผนจัดสรรน้ำ 14,851 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 12,590 ล้าน ลบ.ม. (85%)
 กลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนจัดสรรน้ำ 5,500 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 5,172 ล้าน ลบ.ม. (94%)
 กลุ่มน้ำแม่กลอง แผนจัดสรรน้ำ 3,800 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 983 ล้าน ลบ.ม. (26%)

การเพาะปลูกข้าวนาปี (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค.66)

ทั้งประเทศ แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 16.98 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 14.40 ล้านไร่ (85%)
 กลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 8.05 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 7.34 ล้านไร่ (91%)
 กลุ่มน้ำแม่กลอง แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 0.88 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 0.48 ล้านไร่ (55%)

กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง สำนักงานชลประทานที่ 5 ดำเนินการตรวจสอบเครื่องกักบานระบาย (Spillway) และได้ทำการตรวจสอบสภาพตัวเขื่อนและอาคารประกอบเขื่อนห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองลากฮ้อน ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รวมถึงรักษาความสะอาดและลดปัญหาน้ำเน่าเสีย
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาธารโนด-กระแสดินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ดำเนินการนำเครื่องจักรกลรถขุดตีนตะขาบช่วงแขนยาว ขุดลอกตะกอนดิน ณ บริเวณปากคลองโรง ตำบลโรง อำเภอกะแสดสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรในพื้นที่

