

# รายงานสถานการณ์น้ำ


ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โทร. 02 669 2560 E-mail : wmsc.1460@gmail.com



วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566



สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (วันที่ 28 ส.ค. 66 เวลา 06.00 น.)

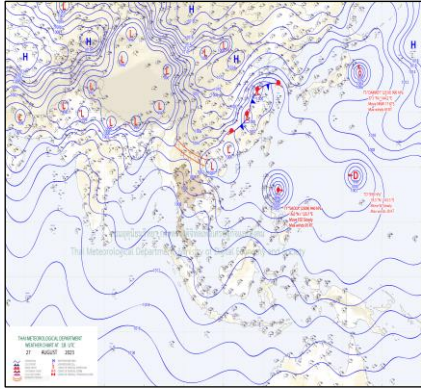


ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 86.2 มม. อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 70.0 มม. และ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 66.0 มม.

แหล่งที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

## ปริมาณน้ำ ใช้งาน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

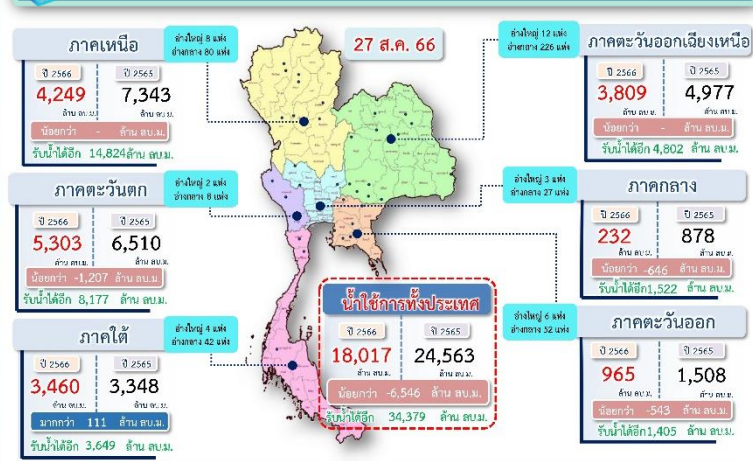

## สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 66)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 28 สิงหาคม 2566

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ	ปริมาณน้ำใช้การได้	ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ	ปริมาณน้ำระบาย	รับน้ำได้อีก				
	ปริมาณน้ำ	% ความจุ	ปริมาณน้ำ	% ใช้การ	วันที่	เมื่อวาน	วันที่	เมื่อวาน	วันที่
ภูมิพล	5,517	41	1,717	18	4.20	8.46	25.00	25.00	7,945
สิริกิติ์	4,429	47	1,579	24	16.75	17.00	12.72	12.98	5,081
ภูมิพล+สิริกิติ์	9,946	43	3,296	20	20.95	25.46	37.72	37.98	13,026
แควน้อยฯ	159	17	116	13	0.88	1.33	1.30	1.30	780
ป่าสักชลสิทธิ์	67	7	64	7	0.73	0.00	1.04	1.04	893
รวมทั้งหมด	10,172	41	3,476	19	22.56	26.79	40.06	40.32	14,699

หมายเหตุ: ( ) คือ เติบความจุเก็บกักปกติ (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

## โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 66

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลาการจ้างงาน 3-10 เดือน มีแผนการจ้างจำนวน 86,000 คน ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานไปแล้ว จำนวน 90,539 คน คิดเป็นร้อยละ 105.28



คุณภาพน้ำ (วันที่ 28 ส.ค. 66 เวลา 07.00 น.)

(หน่วย : กรัม/ลิตร)

แม่น้ำ	สถานีเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม
เจ้าพระยา	ประปาสำแล จ.ปทุมธานี	0.25	0.21 (ปกติ) วันที่ 27 ส.ค.66 ค่าสูงสุด 0.25
	วัดบางคาง	1.00	0.06 (ปกติ)
ท่าจีน	ด้านนอกคลองจินดา	0.75	0.27 (ปกติ)
	ด้านในคลองจินดา	0.75	N/A
แม่กลอง	ปากคลองดำเนินสะดวก	2.00	0.16 (ปกติ)

## ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2566 และผลการเพาะปลูกข้าวนาปี

ผลจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ส.ค.66)

ทั้งประเทศ แผนจัดสรรน้ำ 14,851 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 13,350 ล้าน ลบ.ม. (90%)  
 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนจัดสรรน้ำ 5,500 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 5,429 ล้าน ลบ.ม. (99%)  
 ลุ่มน้ำแม่กลอง แผนจัดสรรน้ำ 3,800 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 1,143 ล้าน ลบ.ม. (30%)

## การเพาะปลูกข้าวนาปี (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค.66)

ทั้งประเทศ แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 16.98 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 14.76 ล้านไร่ (87%)  
 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 8.05 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 7.43 ล้านไร่ (92%)  
 ลุ่มน้ำแม่กลอง แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 0.88 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 0.59 ล้านไร่ (67%)

## กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน

- โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองก่องแก้ว ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เพื่อป้องกันและลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้น้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภค
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำนอง สำนักงานชลประทานที่ 8 ดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ ช่วงกม.ที่ 30+500 - 31+500 ของคลอง LMC ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำไปยังเกษตรกรบริเวณพื้นที่ปลายคลองกม.ที่ 38+880
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ชนิดหอยโข่งขับ จำนวน 1 เครื่อง บริเวณงานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางทะเลตัวโน ตำบลหาดเจ้า อำเภอมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

