

# รายงานสถานการณ์น้ำ


ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โทร. 02 669 2560 E-mail : wmsc.1460@gmail.com



วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566



## สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (วันที่ 3 พ.ค. 66 เวลา 06.00 น.)

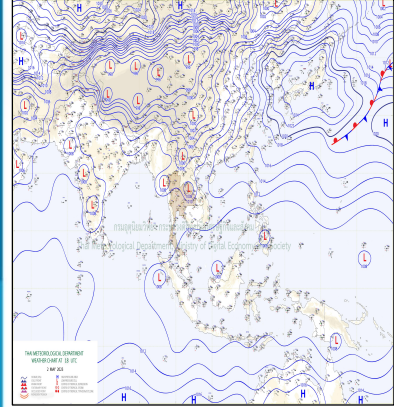


ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ประกอบกับลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งเกิดขึ้นได้ สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อ.เมืองสตูล จ.สตูล 99.8 มม. อ.สองแคว จ.น่าน 90.0 มม. และ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 86.0 มม.

แหล่งที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

## ปริมาณน้ำใช้การ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

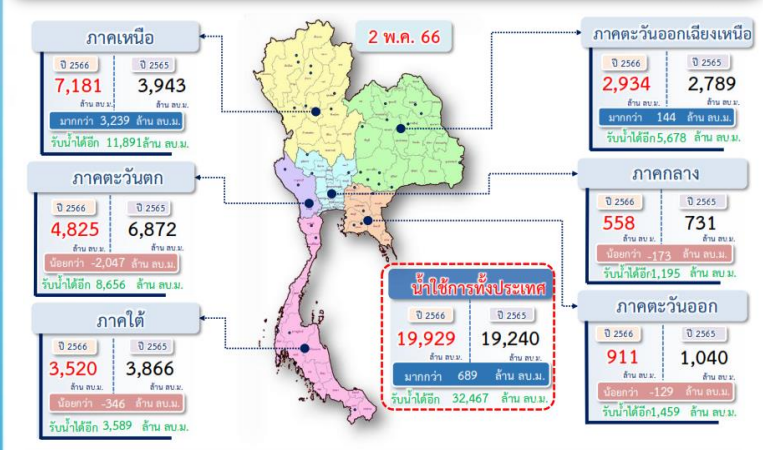

## สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค. 66)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		รับน้ำได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุ	ปริมาณน้ำ	% ใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	8,175	61	4,375	45	0.00	0.00	30.00	30.00	5,287
สิริกิติ์	4,441	47	1,591	24	0.00	2.20	16.97	17.01	5,069
ภูมิพล+สิริกิติ์	12,616	55	5,966	37	0.00	2.20	46.97	47.01	10,356
แควน้อยฯ	282	30	239	27	0.00	0.00	3.46	3.46	657
ป่าสักชลสิทธิ์	226	24	223	23	0.30	1.07	3.04	3.04	734
รวมทั้งหมด	13,124	53	6,428	35	0.30	3.27	53.47	53.50	11,747

หมายเหตุ: ( ) คือ เกินความจุเก็บกักปกติ (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

## โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย. 66

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลาการจ้างงาน 3-10 เดือน มีแผนการจ้างจำนวน 86,000 คน ปัจจุบันมีการจ้างงานไปแล้ว จำนวน 72,922 คน คิดเป็นร้อยละ 84.79



## คุณภาพน้ำ (วันที่ 3 พ.ค. 66 เวลา 07.00 น.)

(หน่วย : กรัม/ลิตร)

แม่น้ำ	สถานีเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม
เจ้าพระยา	ประปาสำแล จ.ปทุมธานี	0.25	0.15 (ปกติ)
บางปะกง	วัดบางแตน	1.00	0.12 (ปกติ)
ท่าจีน	ด้านนอกคลองจินดา	0.75	0.23 (ปกติ)
	ด้านในคลองจินดา	0.75	0.21 (ปกติ)
แม่กลอง	ปากคลองดำเนินสะดวก	2.00	0.14 (ปกติ)

## ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2566 และผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2565/66

### ผลจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ค.66)

ทั้งประเทศ แผนจัดสรรน้ำ 14,851 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 267 ล้าน ลบ.ม. (2%) แผนเพาะปลูกข้าวนปี (26 เม.ย.66) 16.97 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 0.16 ล้านไร่ (1%)

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนจัดสรรน้ำ 5,500 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 105 ล้าน ลบ.ม. (2%) แผนเพาะปลูกข้าวนปี (26 เม.ย.66) 8.05 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 0.16 ล้านไร่ (2%)

### ผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2565/66 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ค.66)

ลุ่มน้ำแม่กลอง แผนจัดสรรน้ำ 5,500 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 3,521 ล้าน ลบ.ม. (65%) แผนเพาะปลูกข้าวนปี (26 เม.ย.66) 0.84 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 0.83 ล้านไร่ (98%)

## กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 ดำเนินการกำจัดวัชพืช ณ บริเวณประตูระบายน้ำเปรมเหนือรังสิต ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่
- ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 15 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง บริเวณ อำเภอปากน้ำ อำเภอนครหลวง จังหวัดนครหลวง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเพาะปลูก เนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้พื้นที่เกษตรกรประสบภัยแล้ง
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ดำเนินการขุดลอกตะกอนดิน ณ บริเวณปากคลองมหามาร ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำให้ไหลเวียนระหว่างคลองกับทะเลสาบสงขลาต่อไป

