

รายงานสถานการณ์น้ำ


ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โทร. 02 669 2560 E-mail : wmsc.1460@gmail.com



วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566



สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (วันที่ 30 มิ.ย. 66 เวลา 06.00 น.)

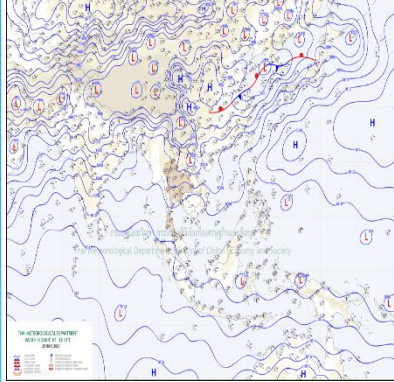


ร่องมรสุมกำลังอ่อนพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้

ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 97.5 มม. อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 93.4 มม. และ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 89.5 มม.

แหล่งที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

ปริมาณน้ำใช้การ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

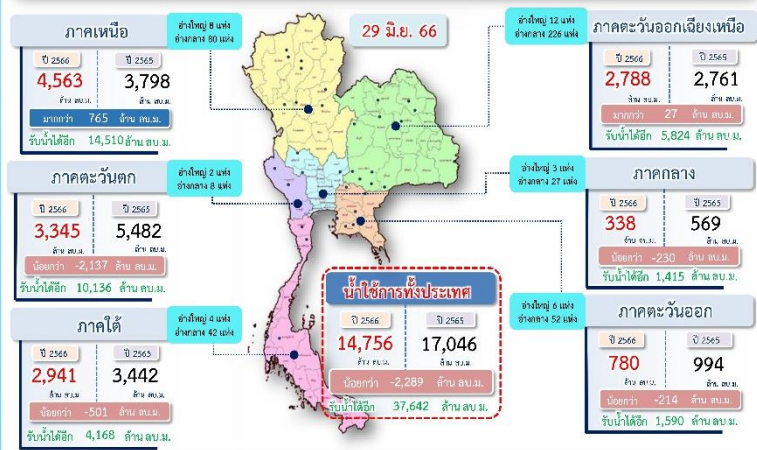

สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 66)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริกิตี แควน้อยยา และป่าสักฯ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ ปริมาณน้ำ % ความจุ	ปริมาณน้ำใช้การได้ ปริมาณน้ำ % ใช้การ	ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ วันที่	ปริมาณน้ำระบาย วันที่	รับน้ำได้อีก
ภูมิพล	6,476 48	2,676 28	1.76 0.00	32.00 32.00	6,986
สิริกิตี	3,722 39	872 13	18.59 20.16	14.88 14.92	5,788
ภูมิพล+สิริกิตี	10,198 44	3,548 22	20.35 20.16	46.88 46.92	12,774
แควน้อยยา	170 18	127 14	1.45 0.73	1.30 1.30	769
ป่าสักชลสิทธิ์	126 13	123 13	0.82 0.82	1.04 1.04	834
รวมทั้งหมด	10,494 42	3,798 21	22.62 21.71	49.21 49.26	14,377

หมายเหตุ: () คือ ปริมาณจุดรับปกติ (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 66

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลาการจ้างงาน 3-10 เดือน มีแผนการจ้างจำนวน 86,000 คน ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานไปแล้ว จำนวน 82,059 คน คิดเป็นร้อยละ 95.42



คุณภาพน้ำ (วันที่ 30 มิ.ย. 66 เวลา 07.00 น.)

(หน่วย : กรัม/ลิตร)

แม่น้ำ	สถานีเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม
เจ้าพระยา	ประปาสำแล จ.ปทุมธานี	0.25	0.19 (ปกติ)
บางปะกง	ปตร.หาดยาง (ควบคุมตลอดทั้งปี)	1.00	0.00 (ปกติ) วันที่ 29 มิ.ย.66
	ด้านนอกคลองจินดา	0.75	0.33 (ปกติ)
ท่าจีน	ด้านในคลองจินดา	0.75	0.30 (ปกติ)
	ปากคลองดำเนินสะดวก	2.00	0.12 (ปกติ)

ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2566 และผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2565/66

ผลจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2566 (1 พ.ค.66 - 31 ต.ค.66) ข้อมูลผลจัดสรรน้ำ ณ วันที่ 29 มิ.ย.66

ทั้งประเทศ แผนจัดสรรน้ำ 14,851 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 6,870 ล้าน ลบ.ม. (46%) แผนเพาะปลูกข้าวนาปี (28 มิ.ย.66) 16.98 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 9.65 ล้านไร่ (57%)

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนจัดสรรน้ำ 5,500 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 2,945 ล้าน ลบ.ม. (54%) แผนเพาะปลูกข้าวนาปี (28 มิ.ย.66) 8.05 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 6.10 ล้านไร่ (76%)

ผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2565/66 (1 ม.ค.66 - 30 มิ.ย.66) ข้อมูลผลจัดสรรน้ำ ณ วันที่ 29 มิ.ย.66

ลุ่มน้ำแม่กลอง แผนจัดสรรน้ำ 5,500 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 5,096 ล้าน ลบ.ม. (93%) แผนเพาะปลูกข้าวนาปรัง (28 มิ.ย.66) 0.84 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 0.83 ล้านไร่ (98%)

กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สำนักงานชลประทานที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงและงานซ่อมแซมระบบชลประทาน บริเวณคลองส่งน้ำประจวบรายน้ำโพธิ์เตี้ย ประจวบรายน้ำนาทม ประจวบรายน้ำโคกแฝก และฝายขาบในเขตอำเภอเมือง และอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อวางแผนกำจัดวัชพืชและการส่งน้ำในคลองให้มีประสิทธิภาพ
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ที่บริเวณสถานีประจวบรายน้ำอ้อมน้อย ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมในช่วงสถานการณ์น้ำหลาก
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขี้เหล็ก สำนักงานชลประทานที่ 12 ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองส่งน้ำ 3 - 1 ขวา บริเวณพื้นที่ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดู

