

รายงานสถานการณ์น้ำ


ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โทร. 02 669 2560 E-mail : wmsc.1460@gmail.com



วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566



สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (วันที่ 5 ส.ค. 66 เวลา 06.00 น.)

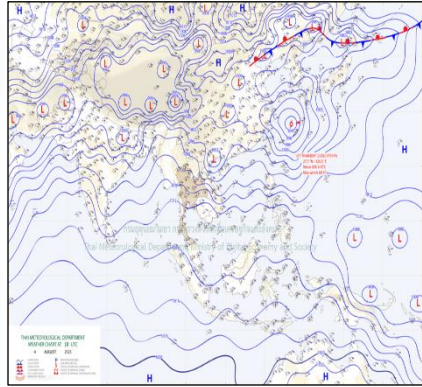


มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อ.นาคี จ.ปราจีนบุรี 130.0 มม. อ.ปัว จ.น่าน 121.5 มม. และ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 98.5 มม.

แหล่งที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

ปริมาณน้ำใช้การ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

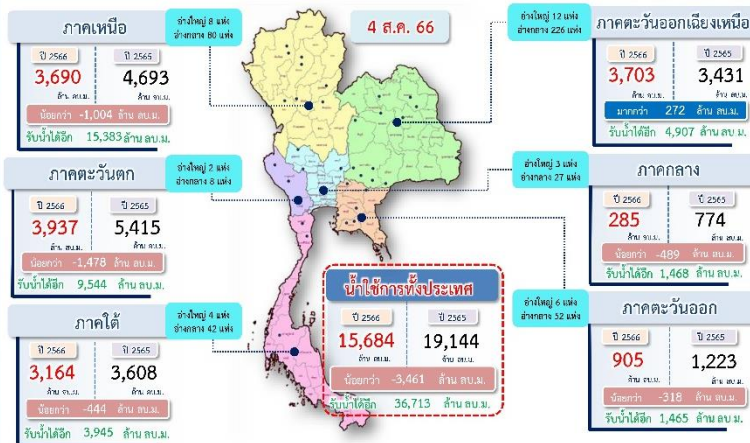

สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ส.ค. 66)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 5 สิงหาคม 2566

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		รับน้ำได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุ	ปริมาณน้ำ	% ใช้การ	วัน	เมื่อวาน	วัน	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,735	43	1,935	20	21.73	20.35	20.00	20.00	7,727
สิริกิติ์	3,687	39	837	13	23.90	16.51	12.82	13.00	5,823
ภูมิพล+สิริกิติ์	9,423	41	2,773	17	45.63	36.86	32.82	33.00	13,549
แควน้อยฯ	158	17	115	13	2.50	2.40	1.30	1.30	781
ป่าสักชลสิทธิ์	102	11	99	10	1.19	0.00	1.04	1.04	858
รวมทั้งหมด	9,683	39	2,987	16	49.32	39.26	35.16	35.34	15,188

*หมายเหตุ: () คือ เก็บความจุเก็บกักปกติ (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร



(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 66

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลาการจ้างงาน 3-10 เดือน มีแผนการจ้างจำนวน 86,000 คน ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานไปแล้ว จำนวน 87,530 คน คิดเป็นร้อยละ 101.78



คุณภาพน้ำ (วันที่ 5 ส.ค. 66 เวลา 07.00 น.)

(หน่วย : กรัม/ลิตร)

แม่น้ำ	สถานีเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม
เจ้าพระยา	ประปาสำแล จ.ปทุมธานี	0.25	0.22 (ปกติ) วันที่ 4 ส.ค.66 ค่าสูงสุด 0.24
	บางปะกง	วัดบางคาง	1.00
ท่าจีน	ด้านนอกคลองจินดา	0.75	0.38 (ปกติ)
	ด้านในคลองจินดา	0.75	0.33 (ปกติ)
แม่กลอง	ปากคลองดำเนินสะดวก	2.00	0.18 (ปกติ)

ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2566 และผลการเพาะปลูกข้าวนาปี

ผลจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ส.ค.66)

ทั้งประเทศ แผนจัดสรรน้ำ 14,851 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 10,639 ล้าน ลบ.ม. (72%)
 กลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนจัดสรรน้ำ 5,500 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 4,525 ล้าน ลบ.ม. (82%)
 กลุ่มน้ำแม่กลอง แผนจัดสรรน้ำ 3,800 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 664 ล้าน ลบ.ม. (17%)

การเพาะปลูกข้าวนาปี (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค.66)

ทั้งประเทศ แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 16.98 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 13.50 ล้านไร่ (80%)
 กลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 8.05 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 7.15 ล้านไร่ (89%)
 กลุ่มน้ำแม่กลอง แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 0.88 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 0.28 ล้านไร่ (32%)

กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน

- โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำชลประทานแก้มลิงบ้านสบต้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนงานที่วางไว้
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขวังยาง-หนองขวัญ สำนักงานชลประทานที่ 4 ดำเนินการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ ณ ประตูโพเอน ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร และประตูกลางคลอง MC กม.12+336 ตำบลวังขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้การส่งน้ำในฤดูฝนเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
- โครงการชลประทานหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5 ลงพื้นที่ติดตามการกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำห้วยหลวง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการระบายน้ำออกจากลำห้วยหลวงลงสู่แม่น้ำโขงในช่วงฤดูฝน

