

รายงานสถานการณ์น้ำ


ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โทร. 02 669 2560 E-mail : wmsc.1460@gmail.com



วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566



สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (วันที่ 8 ก.ค. 66 เวลา 06.00 น.)

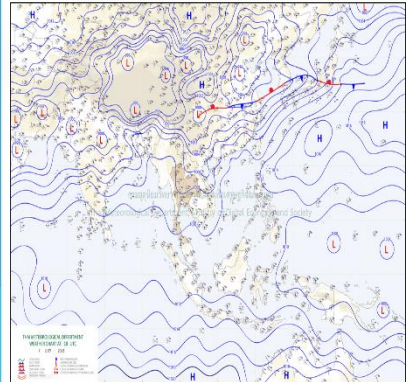


ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทั้งนี้เนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออก เคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง และภาคตะวันออก ประกอบกับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุม ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อ.เวียงจันทน์ 109.2 มม. อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 88.4 มม. และ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 86.0 มม.

แหล่งที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

ปริมาณน้ำ **ใช้กม** อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

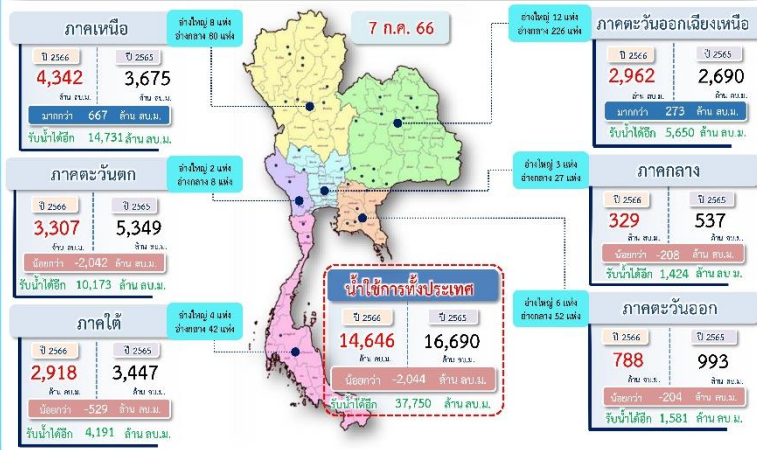

สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค. 66)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 8 กรกฎาคม 2566

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ ปริมาณน้ำ % ความจุ	ปริมาณน้ำใช้การได้ ปริมาณน้ำ % ใช้การ	ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ วันนี้	ปริมาณน้ำระบาย วันนี้	ปริมาณน้ำระบาย เมื่อวาน	รับน้ำได้อีก
ภูมิพล	6,253 46	2,453 25	3.66	3.07	30.00	7,209
สิริกิติ์	3,716 39	866 13	6.43	10.85	14.90	5,794
ภูมิพล+สิริกิติ์	9,969 43	3,319 20	10.09	13.92	44.90	13,003
แควน้อยฯ	165 18	122 14	0.59	0.89	1.30	774
ป่าสักชลสิทธิ์	119 12	116 12	0.37	0.37	1.04	841
รวมทั้งหมด	10,253 41	3,557 20	11.05	15.18	47.39	14,618

หมายเหตุ: () คือ เก็บความจุเก็บกักปกติ (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 66
โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลาการจ้างงาน 3-10 เดือน มีแผนการจ้างจำนวน 86,000 คน ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานไปแล้ว จำนวน 82,059 คน คิดเป็นร้อยละ 95.42



คุณภาพน้ำ (วันที่ 8 ก.ค. 66 เวลา 07.00 น.)

(หน่วย : กรัม/ลิตร)

แม่น้ำ	สถานีเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม
เจ้าพระยา	ประปาสำแล จ.ปทุมธานี	0.25	0.19 (ปกติ) วันที่ 7 ก.ค.66 ค่าสูงสุด 0.22
	บางปะกง	ปตร.หาดยาง (ควบคุมตลอดทั้งปี)	0.00 (ปกติ) วันที่ 7 ก.ค.66
ท่าจีน	ด้านนอกคลองจินดา	0.75	0.31 (ปกติ)
	ด้านในคลองจินดา	0.75	0.31 (ปกติ)
แม่กลอง	ปากคลองดำเนินสะดวก	2.00	0.22 (ปกติ)

ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2566 และผลการเพาะปลูกข้าวนาปี

ผลจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค.66)

ทั้งประเทศ แผนจัดสรรน้ำ 14,851 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 7,720 ล้าน ลบ.ม. (52%)
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนจัดสรรน้ำ 5,500 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 3,344 ล้าน ลบ.ม. (61%)
ลุ่มน้ำแม่กลอง แผนจัดสรรน้ำ 3,800 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 133 ล้าน ลบ.ม. (2%)

การเพาะปลูกข้าวนาปี (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ค.66)

ทั้งประเทศ แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 16.98 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 10.63 ล้านไร่ (57%)
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 8.05 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 6.43 ล้านไร่ (80%)
ลุ่มน้ำแม่กลอง แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 0.88 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 0.23 ล้านไร่ (25%)

กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน

- โครงการชลประทานพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการงานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหัวตงเหนือ ตำบลหัวตง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อให้สามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย
- โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายระยะที่ 2 กม.2+680 – กม.3+700 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยปลาหางตอนล่าง ตำบลปลาไหล อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน สำนักงานชลประทานที่ 13 ดำเนินการกำจัดผักตบชวาคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย บริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำ กม.73+700 เขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำ

