




รายงานสรุปสถานการณ์และการเฝ้าระวัง วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2569

1. การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่อากาศ

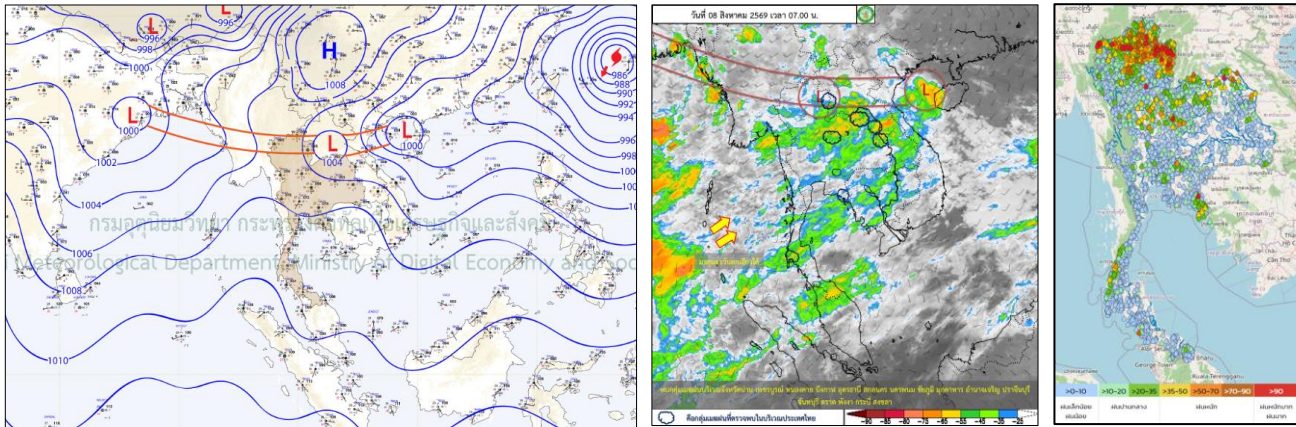


แผนที่อากาศผิวพื้นและพยากรณ์อากาศ (วันที่ 8 ส.ค. 69) ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า (วันที่ 8 ส.ค. – 14 ส.ค. 69) ในช่วงวันที่ 8 - 11 ส.ค. 69 ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ส่วนในช่วงวันที่ 12 - 14 ส.ค. 69 ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักในภาคเหนือ และภาคกลาง เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาว ตอนบน และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง

ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 2 ส.ค. 69 ข้อมูลรายสัปดาห์จากกรมอุตุนิยมวิทยา ปริมาณฝนทั้งประเทศ **ต่ำกว่าค่าปกติ 8%** ค่าปกติ 800.7 มม. ปริมาณฝน 740.6 มม. แบ่งเป็น ภาคเหนือ ต่ำกว่าค่าปกติ 5% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่ำกว่าค่าปกติ 5% ภาคกลาง ต่ำกว่าค่าปกติ 19% ภาคตะวันออก ต่ำกว่าค่าปกติ 12% ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ต่ำกว่าค่าปกติ 28% และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สูงกว่าค่าปกติ 13%

โดยปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาสูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ (1) ต.ซอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณฝน 263.0 มม. (2) ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ปริมาณฝน 211.5 มม. และ (3) ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ปริมาณฝน 207.4 มม.

สถานการณ์เอลนีโญ/ลานีญา ปี 2569

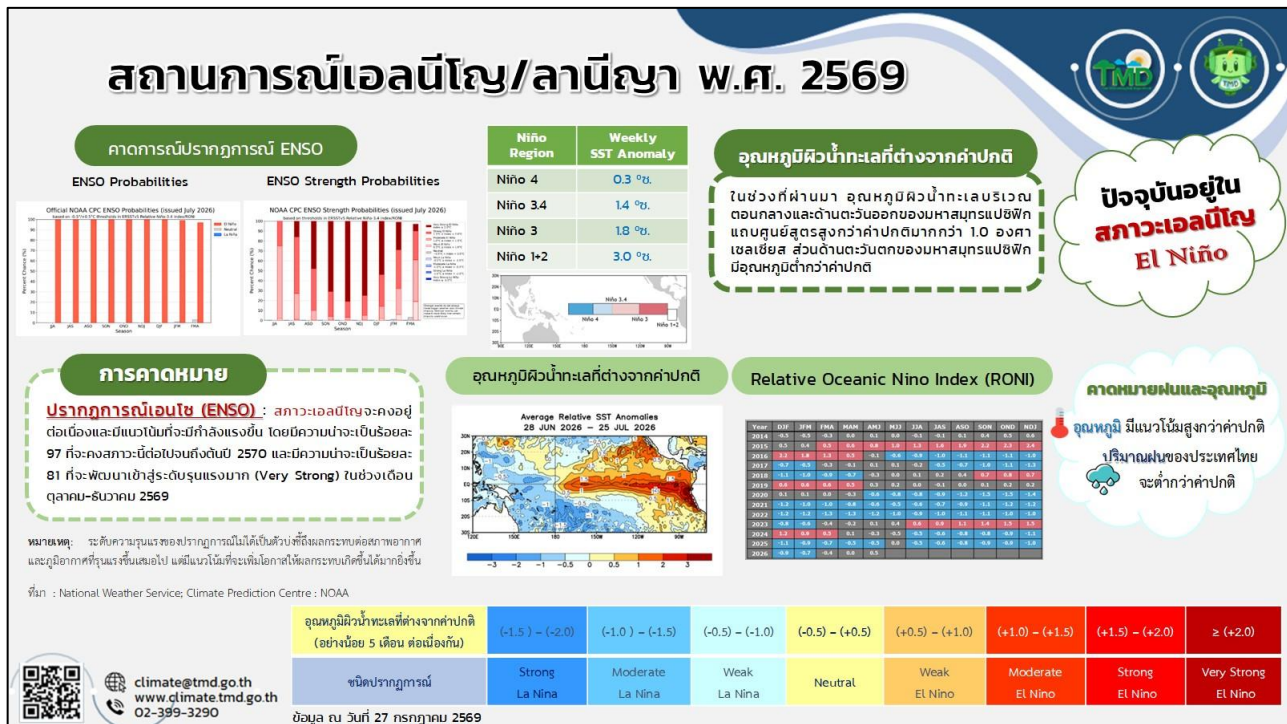

■ ปริมาณน้ำน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30% มีจำนวน 8 แห่ง คือ (1) แควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก (2) แม่มอก จ.ลำปาง (3) มูลบน จ.นครราชสีมา (4) ป่าสักชลสิทธิ์ จ.สระบุรี (5) กระเสียว จ.สุพรรณบุรี (6) คลองสี่แยก จ.ฉะเชิงเทรา (7) นฤปดินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี (8) ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

■ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่ปริมาณน้ำเกิน Upper Rule Curve (URC) จำนวน 4 แห่ง คือ (1) แม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ (2) กว๊าน จ.ลำปาง (3) น้ำพุ จ.สกลนคร (4) สิรินคร จ.อุบลราชธานี

■ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่ปริมาณน้ำต่ำกว่า lower Rule Curve (LRC) จำนวน 3 แห่ง คือ (1) แม่มอก จ.ลำปาง (2) จุฬารัตน์ จ.ชัยภูมิ (3) วชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี

○ สถานการณ์ 4 เชื้อนหลักกลุ่มน้ำเจ้าพระยา (8 ส.ค. 69) ปริมาณน้ำในอ่าง 4 อ่างรวม = 12,869 ล้าน ลบ.ม. (52%) (ปี 2568 = 17,171 ล้าน ลบ.ม.) น้อยกว่าปีก่อน 4,301 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การ = 6,161 ล้าน ลบ.ม. (34%) เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 92 ล้าน ลบ.ม. (ปี 2568 = 10,463 ล้าน ลบ.ม.) น้อยกว่าปีก่อน 4,302 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก = 11,914 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 8 สิงหาคม 2569											
อ่างเก็บน้ำ	ความจุ ที่ รน.	ความจุ ใช้การ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		รับน้ำได้อีก
			ปริมาณน้ำ	% ความจุ	ปริมาณน้ำ	% ใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	13,462	9,662	7,076	53	3,276	34	21.73	25.31	10.00	10.00	6,386
สิริกิตี	9,510	6,660	5,386	57	2,536	38	75.07	62.85	9.93	9.77	4,124
ภูมิพล+สิริกิตี	22,972	16,322	12,462	54	5,812	36	96.80	88.16	19.93	19.77	10,510
แควน้อยฯ	939	896	251	27	208	23	7.76	7.41	2.16	2.16	688
ป่าสักชลสิทธิ์	872	857	155	18	140	16	12.35	8.94	1.30	1.30	717
รวมทั้งหมด	24,783	18,075	12,869	52	6,161	34	116.91	104.51	23.39	23.23	11,914

*หมายเหตุ : () คือ เก็บความจุเก็บกักปกติ / ปรับความจุเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ วันที่ 22 มิ.ย.69

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

2.3 สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 461 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค. 69)

อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ที่ปริมาณน้ำมากกว่า 100 % จำนวน 26 แห่ง ปริมาณน้ำระหว่าง 80-100 % จำนวน 48 แห่ง ปริมาณน้ำระหว่าง 50-80 % จำนวน 188 แห่ง ปริมาณน้ำระหว่าง 31-50 % จำนวน 124 แห่ง และปริมาณน้ำน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 % จำนวน 75 แห่ง

2.4 การจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC

การจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ สนับสนุน การผลิตน้ำประปา รักษาระบบนิเวศน์ การเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ปริมาณน้ำในอ่างอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีปริมาณน้ำเก็บกัก ณ วันที่ 7 ส.ค. 69 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่ง ดังนี้

เขื่อน	ความจุอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น % ความจุ	ไหลเข้าอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)	ระบาย (ล้าน ลบ.ม.)
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่					
คลองสิียด จ.ฉะเชิงเทรา	420	73	17%	0.54	0.12
บางพระ จ.ชลบุรี	117	51	43%	-	0.27
หนองปลาไหล จ.ระยอง	164	86	53%	0.09	0.61
ประแสร์ จ.ระยอง	295	191	65%	3.00	0.75
อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง					
คลองระบม จ.ฉะเชิงเทรา	55	19	33%	0.03	0.01
คลองประแกด จ.จันทบุรี	60	56	93%	1.67	0.88
แก่งหางแมว จ.จันทบุรี	81	54	67%	1.19	0.02
หนองค้อ จ.ชลบุรี	21	11	52%	0.02	0.04
คลองหลวงรัชชโลทร จ.ชลบุรี	98	26	27%	0.05	0.24
ดอกกราย จ.ระยอง	71	49	69%	0.26	0.18
คลองใหญ่ จ.ระยอง	40	25	62%	0.24	0.41
5 อ่างฯ พัทยา จ.ชลบุรี	40	20	50%	0.02	0.08

และมีการสูบน้ำ วันที่ 6 ส.ค. 69 ดังนี้

ลำดับ	แนวผันน้ำ	แผนการ สูบน้ำ (ลบ.ม.)	ปี พ.ศ.	สูบ/ผัน (ลบ.ม./วัน)	สะสม (ลบ.ม.)	หมายเหตุ
1	สูบน้ำคลองพระองค์ฯ – อ่างฯ บางพระ	70,000,000	ผลปี 2568	-	52,261,521 (74%)	1 ก.ค. – 31 ธ.ค.68
		70,000,000	ผลปี 2569	488,951	18,418,247 (26%)	ม.ค.69 - ปัจจุบัน
2	สูบน้ำแม่น้ำบางปะกง – อ่างฯ บางพระ	22,000,000	ผลปี 2568	-	9,804,000 (45%)	17 ก.ค. - 16 ต.ค.68
		-	ผลปี 2569	190,456	3,810,059	ม.ค. 69 - ปัจจุบัน
3	สูบน้ำคลองพานทอง – อ่างฯ บางพระ	-	ผลปี 2568	-	11,315,495	6 มิ.ย. – 31 ธ.ค.68
		-	ผลปี 2569	-	-	-
4	สูบน้ำอ่างฯ ประแสร์ – อ่างฯ คลองใหญ่	23,000,000	ผลปี 2568	-	20,976,126 (91%)	1 ม.ค. – 31 ธ.ค.68
		32,500,000	ผลปี 2569	211,847	45,883,259	1 ม.ค.69 – ปัจจุบัน
5	สูบน้ำอ่างฯ คลองใหญ่ – อ่างฯ หนองปลาไหล	-	ผลปี 2568	-	83,695,000	1 ม.ค. – 31 ธ.ค.68
		-	ผลปี 2569	369,000	64,993,000	1 ม.ค. – ปัจจุบัน
6	สูบน้ำคลองสะพาน – อ่างฯ ประแสร์	-	ผลปี 2568	-	14,627,011	3 พ.ค. – 11 ก.ย.68
		-	ผลปี 2569	407,543	14,694,982	พ.ค.69 - ปัจจุบัน
7	สูบน้ำคลองวังโตนด - อ่างฯประแสร์	-	ผลปี 2568	-	-	-
		-	ผลปี 2569	378,000	1,215,000	ม.ค. 69 - ปัจจุบัน
8	สูบลำน้ำวัดชะหารไร่ - อ่างฯหนองปลาไหล	-	ผลปี 2568	-	2,103,649	ม.ค.68 – 13 ก.ย.68
		-	ผลปี 2569	หยุดสูบ	1,741,455	ม.ค. 69- ปัจจุบัน

เขื่อนระบายน้ำกลางแม่น้ำชี 6 แห่ง

เขื่อน	ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ระดับน้ำหน้าเขื่อน (ม.รทก.)	คิดเป็น % ความจุ	ระบาย (ลบ.ม./วินาที)	เปิดบาน (ระยะ ม. X จำนวนบาน)
เขื่อนชนบท จ.ขอนแก่น	16	+157.92	44%	0.37	0.01x1
เขื่อนมหาสารคาม จ.มหาสารคาม	24	+146.85	81%	94.84	0.20x5,0.30x1
เขื่อนวังยาง จ.กาฬสินธุ์	34	+136.68	75%	137.43	0.35x6
เขื่อนร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	16	+130.90	79%	232.49	0.70x6
เขื่อนยโสธร จ.ยโสธร	19	+123.81	74%	526.19	2.40x8
เขื่อนธาตุน้อย จ.อุบลราชธานี	56	+115.36	88%	457.04	3.00x8

สถานการณ์น้ำท่า มีน้ำล้นตลิ่ง 1 สถานี บริเวณสถานี E.92 อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

5.2 กลุ่มน้ำมูล

ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 6 แห่ง

เขื่อน	ความจุอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น % ความจุ	ไหลเข้าอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม./วัน)	ระบาย (ล้าน ลบ.ม./วัน)
เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา	314	100	32%	1.90	0.52
เขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา	155	56	36%	-	0.42
เขื่อนมูลบน จ.นครราชสีมา	141	42	30%	0.31	0.09
เขื่อนลำแชะ จ.นครราชสีมา	275	90	33%	1.45	0.81
เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์	121	40	33%	0.03	0.12
เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี	1,966	1,388	71%	21.48	11.48

เขื่อนระบายน้ำกลางแม่น้ำมูล 4 แห่ง

เขื่อน	ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ระดับน้ำหน้าเขื่อน (ม.รทก.)	คิดเป็น % ความจุ	ระบาย (ลบ.ม./วินาที)	เปิดบาน (ระยะ ม. X จำนวนบาน)
เขื่อนพิมาย จ.นครราชสีมา	3.6	+151.99	100%	-	ปิดบาน
เขื่อนราษีไศล จ.ศรีสะเกษ	74	+117.13	65%	71.04	0.10x7
เขื่อนห้วยนา จ.ศรีสะเกษ	65	+110.86	75%	99.30	0.20x12,0.30x2
เขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี	225	+101.47	N/A	1,563.89	แขวนบาน

สถานการณ์น้ำท่า ที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี มีการติดตามที่สถานีวัดน้ำ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนลงแม่น้ำโขง ที่ระดับตลิ่ง +113.50 ม.รทก. มีความจุลำนํ้า 3,200 ลบ.ม./วินาที (กรมชลประทานเสริมกำแพงปิดช่องว่าง) ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ +109.37 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 925.10 ลบ.ม./วินาที คิดเป็น 29% ของความจุลำนํ้า (ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งเสริมคัน 4.13 เมตร ปริมาณน้ำน้อยกว่าความจุ 2,274.90 ลบ.ม./วินาที)

สถานการณ์น้ำท่า อยู่ในสภาวะปกติ

6. สถานการณ์ลุ่มน้ำโขง

ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง

เขื่อน	ความจุอ่าง (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น % ความจุ	ไหลเข้าอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม./วัน)	ระบาย (ล้าน ลบ.ม./วัน)
เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี	136	61	45%	2.68	1.20
เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร	520	239	46%	4.67	-

ประตูระบายน้ำ 7 แห่ง ริมแม่น้ำโขง

เขื่อน	อัตราการระบายสูงสุด (ล้าน ลบ.ม./วัน)	ระบาย (ลบ.ม./วินาที)	เปิดบาน (ระยะ ม. X จำนวนบาน)
ปตร.ห้วยโมง จ.หนองคาย	118	116.35	5.50x4
ปตร.ห้วยหลวง จ.หนองคาย	86	152.40	ยกบานพื้นน้ำx3
ปตร.ห้วยคต จ.บึงกาฬ	78	40.66	ยกบานพื้นน้ำx4
ปตร.ห้วยบางขาด จ.บึงกาฬ	19	75.57	ยกบานพื้นน้ำx4
ปตร.สุรัสวดี จ.สกลนคร	20	123.12	1.50x3
ปตร.ธรมิตินฤมิตร จ.นครพนม	104	244.06	แขวนบาน

สถานการณ์น้ำท่าในแม่น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	+สูง/-ต่ำกว่าตลิ่ง (ม.รทก.)
สถานีเชียงแสน จ.เชียงราย	+369.91	+364.28	-5.63
สถานีเชียงคาน จ.เลย	+210.12	+205.79	-4.33
สถานีหนองคาย จ.หนองคาย	+165.85	+162.63	-3.22
สถานีนครพนม จ.นครพนม	+144.68	+143.15	-1.53
สถานีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร	+136.72	+134.64	-2.08
สถานีโขงเจียม จ.อุบลราชธานี	+103.53	+101.32	-2.21

สถานการณ์น้ำท่า อยู่ในสภาวะปกติ

7. สถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลอง

ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง

เขื่อน	ความจุอ่าง (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น % ความจุ	ไหลเข้าอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)	ระบาย (ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี	17,745	13,888	78%	7.39	17.29
เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี	8,860	4,521	51%	21.55	8.01

ระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนแม่กลอง 61 ลบ.ม./วินาที กรณีระบาย 800 ลบ.ม./วินาที จึงมีผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณท้ายน้ำ

สถานการณ์น้ำท่า อยู่ในสภาวะปกติ

8. สถานการณ์น้ำภาคใต้

ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง

เขื่อน	ความจุอ่าง (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น % ความจุ	ไหลเข้าอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)	ระบาย (ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี	710	273	38%	1.94	1.36
เขื่อนปรามบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์	391	95	24%	0.17	0.31
เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี	5,639	3,501	62%	9.34	3.57
เขื่อนบางลาง จ.ยะลา	1,454	838	58%	3.60	3.47

ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 44 แห่ง (7 ส.ค. 69) ความจุรวม 727 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน 288 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 40% โดยอ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำมากกว่า 100 % จำนวน 3 แห่ง ปริมาณน้ำระหว่าง 80 - 100% จำนวน 3 แห่ง ปริมาณน้ำระหว่าง 50 - 80 % จำนวน 11 แห่ง ปริมาณน้ำระหว่าง 31 - 50 % จำนวน 10 แห่ง และปริมาณน้ำน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 % จำนวน 17 แห่ง

9. แผน-ผลการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2569

กรมชลประทาน วางแผนจัดสรรน้ำจากโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูฝนปี 2569 (วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 – 31 ตุลาคม 2569) ดังนี้

- **ทั่วประเทศ** ปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 จำนวน 21,398 ล้าน ลบ.ม. **มีความต้องการใช้น้ำ 32,237 ล้าน ลบ.ม. วางแผนจัดสรรน้ำจำนวน 14,956 ล้าน ลบ.ม.** โดยจัดลำดับความสำคัญตามกิจกรรม ดังนี้ การเกษตร 7,045 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 6,221 ล้าน ลบ.ม. การอุปโภค-บริโภค 1,435 ล้าน ลบ.ม. และอุตสาหกรรม 255 ล้าน ลบ.ม. **วางแผนการเพาะปลูกข้าวนาปี จำนวน 16.97 ล้านไร่**
- **ลุ่มน้ำเจ้าพระยา** ปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 จำนวน 7,533 ล้าน ลบ.ม. **มีความต้องการใช้น้ำ 10,653 ล้าน ลบ.ม. วางแผนจัดสรรน้ำ จำนวน 4,500 ล้าน ลบ.ม.** โดยจัดลำดับความสำคัญตามกิจกรรม ดังนี้ การเกษตร 2,664 ล้าน ลบ.ม. การรักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 1,266 ล้าน ลบ.ม. และอุปโภค-บริโภค 570 ล้าน ลบ.ม. **วางแผนการเพาะปลูกข้าวนาปี จำนวน 8.08 ล้านไร่**
- **ลุ่มน้ำแม่กลอง** (วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 – 31 ธันวาคม 2569) ปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 จำนวน 4,211 ล้าน ลบ.ม. **มีความต้องการใช้น้ำ 3,999 ล้าน ลบ.ม. วางแผนจัดสรรน้ำ จำนวน 4,000 ล้าน ลบ.ม.** โดยจัดลำดับความสำคัญตามกิจกรรม ดังนี้ อุปโภค-บริโภค 490 ล้าน ลบ.ม. การรักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 1,340 ล้าน ลบ.ม. และการเกษตร 2,170 ล้าน ลบ.ม. **วางแผนการเพาะปลูกข้าวนาปี จำนวน 0.89 ล้านไร่**

สรุปแผน-ผลจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2569 การเพาะปลูกข้าวนาปี (1 พ.ค. 69 – 31 ต.ค. 69)							
ลุ่มน้ำ	การจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2569 (ล้าน ลบ.ม.)			การเพาะปลูกข้าวนาปี (ล้านไร่)			
	ข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค. 69			ข้อมูล ณ วันที่ 5 ส.ค. 69			
	แผน	ผล	คงเหลือ	แผน	ผล	เพิ่มจากสัปดาห์ที่แล้ว	เก็บเกี่ยว
ทั่วประเทศ	14,956	12,401 (83%)	2,555 (17%)	16.97	14.21 (84%)	0.65	0.11
เจ้าพระยา	4,500	4,775 (106%)	เกินแผนฯ 275 (6%)	8.08	7.41 (92%)	0.16	0.05
แม่กลอง (1 ก.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68)	4,000	764 (19%)	3,236 (81%)	0.89	0.32 (34%)	0.13	-

10. การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ

- พื้นที่บางระกำ กรมชลประทานเริ่มส่งน้ำเข้าระบบชลประทาน วันที่ 15 มี.ค. 69 เกษตรกรเริ่มการเพาะปลูกข้าวนาปี วันที่ 1 เม.ย. 69 คาดว่าสิ้นสุดการส่งน้ำ วันที่ 31 ก.ค. 69 ทั้งนี้ กรมชลประทานวางแผนให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวนาปีแล้วเสร็จภายในกลางเดือนสิงหาคม 2569 เพื่อเตรียมรองรับน้ำหลาก **พื้นที่คาดการณ์ 0.28 ล้านไร่ ปัจจุบัน (5 ส.ค. 69) เพาะปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 0.28 ล้านไร่ (100%) เก็บเกี่ยวแล้ว 0.45 ล้านไร่ (16%)**
- พื้นที่ลุ่มต่ำ 10 ท่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง กรมชลประทานส่งน้ำเข้าระบบชลประทาน วันที่ 15 เม.ย. 69 เกษตรกรเริ่มการเพาะปลูกข้าวนาปี วันที่ 1 พ.ค. 69 คาดว่าสิ้นสุดการส่งน้ำ วันที่ 31 ส.ค. 69 ทั้งนี้ กรมชลประทานวางแผนให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวนาปีแล้วเสร็จภายในกลางเดือนกันยายน 2569 เพื่อเตรียมรองรับน้ำหลาก **พื้นที่คาดการณ์ 0.92 ล้านไร่ ปัจจุบัน (5 ส.ค. 69) เพาะปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 0.92 ล้านไร่ (100%) เก็บเกี่ยวแล้ว 420 ไร่ (0.05%)**

11. คุณภาพน้ำ วันที่ 8 ส.ค. 69 เวลา (07.00 น.).

กรมชลประทานดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) บริเวณพื้นที่เฝ้าระวัง 4 แม่น้ำสายหลัก ประกอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง ค่าความเค็ม ณ จุดเฝ้าระวังอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้ง 4 แม่น้ำ มีรายละเอียดดังนี้

แม่น้ำ	สถานีเฝ้าระวัง/ควบคุม	เกณฑ์เฝ้าระวัง (กรัม/ลิตร)	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)
แม่น้ำเจ้าพระยา	ประปาสำแล จ.ปทุมธานี	0.25	0.14 (ปกติ)
		วันที่ 7 ส.ค. 69 ค่าความเค็มสูงสุด 0.14 กรัมต่อลิตร	
แม่น้ำบางปะกง	วัดบางคาง	1.00	0.04 (ปกติ)
แม่น้ำท่าจีน	ด้านนอกคลองจินดา	0.75	0.24 (ปกติ)
	ด้านในคลองจินดา	0.75	0.43 (ปกติ)
แม่น้ำแม่กลอง	อัมพวา	2.00	0.12 (ปกติ)

12. การให้ความช่วยเหลือเครื่องจักร-เครื่องมือ สำหรับช่วงฤดูฝน ปี 2569

กรมชลประทาน เตรียมความพร้อมเครื่องจักร - เครื่องมือ ไว้ดังนี้ เครื่องสูบน้ำ 1,914 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 367 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 203 เครื่อง และเครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 3,248 หน่วย รวมทั้งสิ้น 5,732 หน่วย ปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 69 **ดำเนินการช่วยเหลือแล้ว 42 จังหวัด เครื่องจักร-เครื่องมือรวม 403 หน่วย** แบ่งเป็น **เครื่องสูบน้ำ 323 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 1 คัน เครื่องผลักดันน้ำ 4 เครื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ 75 หน่วย** (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค. 69)

13. การคาดการณ์ปริมาณน้ำ ณ วันที่ 1 พ.ย. 69 **กรณีฝนคาดการณ์ 6 เดือน TMD** (คาดการณ์ ณ วันที่ 14 ก.ค. 69)

ลุ่มน้ำ	น้ำเก็บกัก	น้ำใช้การ	เทียบน้ำใช้การ
ทั้งประเทศ (1 พ.ย. 69)	52,081 (73%)	28,504 (60%)	ปี 69 น้อยกว่า ปี 68 10,881
เจ้าพระยา (1 พ.ย. 69)	19,247 (78%)	12,539 (69%)	ปี 69 น้อยกว่า ปี 68 4,705
แม่กลอง (1 ม.ค. 70)	18,653 (70%)	5,376 (40%)	ปี 69 น้อยกว่า ปี 68 4,767

หน่วย ล้าน ลบ.ม.

14. โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อการช่วยเหลือเกษตรกร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 กรมชลประทาน รวมระยะเวลาการจ้างแรงงาน 12 เดือน (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569)

หลักเกณฑ์การจ้างแรงงาน ประกอบด้วย (1) เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินโครงการ (2) สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ (3) ประชาชนทั่วไป และผู้ใช้แรงงานทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย/ภัยแล้ง (4) เกษตรกรลูกหนี้โครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) (5) ประชาชน และผู้ใช้แรงงานทั่วไปในพื้นที่ (6) หากแรงงานที่ต้องการในพื้นที่เป้าหมายมีไม่เพียงพอ ให้พิจารณาจ้างเกษตรกร/แรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงจากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับ แผนการจ้างแรงงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 84,512 คน วงเงิน 5,824.55 ล้านบาท ปัจจุบัน (31 ก.ค. 69) มีการจ้างแรงงานไปแล้ว 72,767 คน วงเงิน 3,209.99 ล้านบาท

15. พื้นที่ประสบอุทกภัย 2569

จากอิทธิพลของ ร่องมรสุม/มรสุม ที่พัดผ่านประเทศไทย มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งสิ้น **24 จังหวัด** ดังนี้

○ จังหวัดที่เข้าสู่ภาวะปกติ **13 จังหวัด** ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด เพชรบูรณ์ เพชรบุรี ระนอง ภูเก็ต กระบี่ และตรัง

○ จังหวัดที่ประสบอุทกภัย **11 จังหวัด** ได้แก่ จังหวัดน่าน แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร สระบุรี ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม สกลนคร อุดรธานี พิจิตร และอำนาจเจริญ

ลำดับ	วันเริ่มอุทกภัย	สขป.	ลุ่มน้ำ	จังหวัด	อำเภอ (จำนวน)	รายชื่ออำเภอ	จุดประสบภัย							พื้นที่ประสบภัย	
							สันตติ่ง	ลำน้ำที่น้ำสันตติ่ง	น้ำป่าไหลหลาก	ท่วมซ้ำ	ในเขตชลประทาน	นอกเขตชลประทาน	ระดับน้ำ (ม.)	ไร่	ครัวเรือน
1	7 ส.ค. 69	2	น่าน	น่าน	1	เวียงสา	✓	แม่น้ำน่าน				✓	0.30		
2	7 ส.ค. 69	1	สกลนคร	แม่ฮ่องสอน	1	เมืองแม่ฮ่องสอน	✓	ห้วยฮ้าง ห้วยแม่สุยะ				✓	0.30		
3	6 ส.ค. 69	7	โขงตะวันออกเฉียงเหนือ	มุกดาหาร	2	เมืองมุกดาหาร นิคมคำสร้อย				✓		✓	0.20 - 0.30	2,298	
4	6 ส.ค. 69	10	ป่าสัก	สระบุรี	1	เสาไห้				✓	✓		0.40 - 0.60	200	
5	5 ส.ค. 69	6	ชี	ร้อยเอ็ด	2	เสลภูมิ โพนทอง	✓	ลำน้ำซัง (E.92)				✓	0.20 - 0.80	5,980	
6	4 ส.ค. 69	7	ชี	ยโสธร	2	เลิงกา เมืองยโสธร	✓	ลำเขบาย ลำน้ำซัง				✓	0.30 - 0.50	2,726	195
7	4 ส.ค. 69	7	โขงตะวันออกเฉียงเหนือ	นครพนม	3	ศรีสงคราม เมืองนครพนม โพนสวรรค์	✓	ลำน้ำอูน แม่น้ำโขง ห้วยหวาย		✓		✓	0.30 - 1.00	1,400	
8	4 ส.ค. 69	5	โขงตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	1	อากาศอำนวย	✓	ห้วยยาม				✓	0.10 - 0.30	500	
9	4 ส.ค. 69	5	โขงตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	1	บ้านผือ	✓	ห้วยโมง ห้วยฟ้า				✓	0.20 - 0.30	3,500	
10	2 ส.ค. 69	3	น่าน	พิจิตร	1	นครไทย	✓	แม่น้ำแควน้อย				✓	0.30	490	5
11	31 ก.ค. 69	7	ชี	อำนาจเจริญ	1	ลืออำนาจ	✓	ลำเขบก		✓		✓	0.10 - 0.30	110	
รวม					16		9		0	4	1	10		17,204	200

16. การประเมินแนวโน้มสถานการณ์ภัยแล้งและการเตรียมความพร้อม ปี 2569

กรมชลประทานได้ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำร่วมกับแนวโน้มสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง พบว่าในช่วงฤดูฝนปี 2569 ประเทศไทยยังมีฝนตกในหลายพื้นที่ และบางช่วงมีฝนตกหนักเฉพาะแห่ง แต่ภาพรวมปริมาณฝนสะสมยังต่ำกว่าค่าปกติ ประกอบกับปัจจุบันอยู่ในสภาวะเอลนีโญและมีแนวโน้มกำลังแรงขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงฝนทิ้งช่วง และผลกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนต่ำกว่าปกติและอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ทั้งนี้ กรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและแผนเพาะปลูก โดยให้ความสำคัญกับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นลำดับแรก ควบคู่กับการรักษาระบบนิเวศ การสนับสนุนภาคเกษตรตามแผน และการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาทั้งสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงและฝนตกหนักเฉพาะพื้นที่ ลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการผลิตให้ได้มากที่สุด
