

# รายงานสถานการณ์น้ำ


ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โทร. 02 669 2560 E-mail : wmsc.1460@gmail.com



วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566



## สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (วันที่ 14 ก.ค. 66 เวลา 06.00 น.)

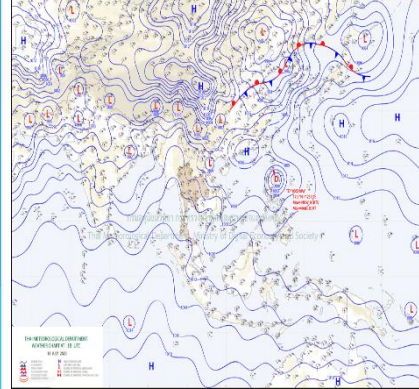


มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้

ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 92.0 มม. อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 70.2 มม. และ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 66.0 มม.

แหล่งที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

## ปริมาณน้ำใช้การ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

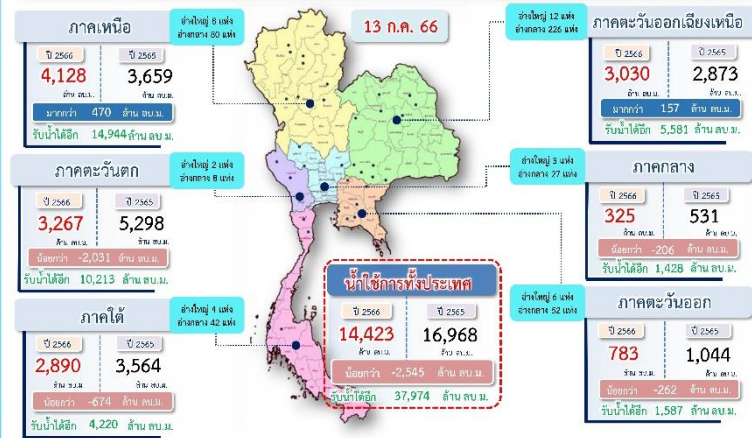

## สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ค. 66)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		รับน้ำได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุ	ปริมาณน้ำ	% ใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	6,126	46	2,326	24	12.70	9.75	22.00	22.00	7,336
สิริกิติ์	3,657	38	807	12	6.48	7.99	14.99	15.00	5,853
ภูมิพล+สิริกิติ์	9,783	43	3,133	19	19.18	17.74	36.99	37.00	13,189
แควน้อยฯ	160	17	117	13	0.83	1.47	1.73	1.73	779
ป่าสักชลสิทธิ์	115	12	112	12	0.79	0.36	1.04	1.04	845
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>10,057</b>	<b>40</b>	<b>3,361</b>	<b>18</b>	<b>20.80</b>	<b>19.57</b>	<b>39.76</b>	<b>39.77</b>	<b>14,814</b>

หมายเหตุ: ( ) คือ เก็บความจุถึงกับปกติ (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

## โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร



(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 66

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลาการจ้างงาน 3-10 เดือน มีแผนการจ้างจำนวน 86,000 คน ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานไปแล้ว จำนวน 85,771 คน คิดเป็นร้อยละ 99.73



## คุณภาพน้ำ (วันที่ 14 ก.ค. 66 เวลา 07.00 น.)

(หน่วย : กรัม/ลิตร)

แม่น้ำ	สถานีเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม
เจ้าพระยา	ประปาสำแล จ.ปทุมธานี	0.25	0.19 (ปกติ) วันที่ 13 ก.ค.66 ค่าสูงสุด 0.22
	บางปะกง	ปตร.หาดยาง (ควบคุมตลอดทั้งปี)	1.00
ท่าจีน	ด้านนอกคลองจินดา	0.75	0.34 (ปกติ)
	ด้านในคลองจินดา	0.75	0.29 (ปกติ)
แม่กลอง	ปากคลองดำเนินสะดวก	2.00	0.15 (ปกติ)

## ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2566 และผลการเพาะปลูกข้าวนาปี

### ผลจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค.66)

ทั้งประเทศ แผนจัดสรรน้ำ 14,851 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 8,325 ล้าน ลบ.ม. (56%)  
 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนจัดสรรน้ำ 5,500 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 3,613 ล้าน ลบ.ม. (66%)  
 ลุ่มน้ำแม่กลอง แผนจัดสรรน้ำ 3,800 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 241 ล้าน ลบ.ม. (6%)

### การเพาะปลูกข้าวนาปี (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค.66)

ทั้งประเทศ แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 16.98 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 11.66 ล้านไร่ (69%)  
 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 8.05 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 6.69 ล้านไร่ (83%)  
 ลุ่มน้ำแม่กลอง แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 0.88 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 0.24 ล้านไร่ (27%)

## กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน

- โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่วะเด่นชัย ตำบลแม่วะ อำเภอดงเจน จังหวัดลำปาง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักงานชลประทานที่ 3 ดำเนินการนารถแบคโฮ และเรือต้นฝัก มากำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ ในคลองระบายน้ำ DR7 ช่วง กม. 6+000 บริเวณท้องที่หมู่ 10 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพื่อให้สามารถระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามการสูบน้ำจากสถานีสูบน้ำลำปลายมาศ เข้ามาเติมให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อผลิตน้ำประปาในเขตเมือง และเตรียมรับสถานการณ์ในกรณีฝนทิ้งช่วง



สายด่วน 1460  
ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ



สามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ที่ <http://wmsc.rid.go.th/>

