

รายงานสถานการณ์น้ำ


ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โทร. 02 669 2560 E-mail : wmsc.1460@gmail.com



วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566



สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (วันที่ 26 มิ.ย. 66 เวลา 06.00 น.)

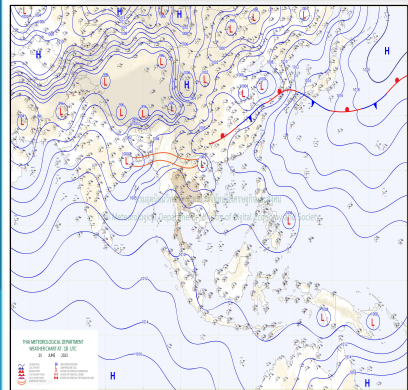


ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อ.สอง จ.แพร่ 143.0 มม. อ.เชียงของ จ.เชียงราย 126.0 มม. และ อ.ชะวอด จ.นครศรีธรรมราช 113.2 มม.

แหล่งที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

ปริมาณน้ำใช้การ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

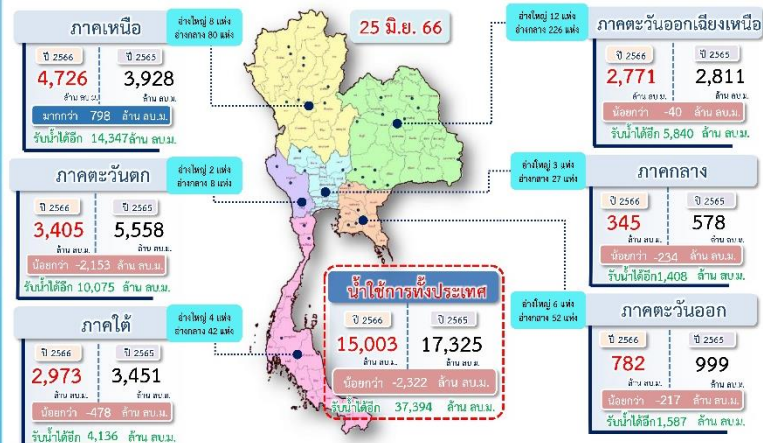

สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิ.ย. 66)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ	ปริมาณน้ำใช้การได้	ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ	ปริมาณน้ำระบาย	รับน้ำได้อีก				
	ปริมาณน้ำ	% ความจุ	ปริมาณน้ำ	% ใช้การ	วัน	เมื่อวาน	วัน	เมื่อวาน	วัน
ภูมิพล	6,603	49	2,803	29	0.00	0.00	25.00	30.00	6,859
สิริกิติ์	3,735	39	885	13	3.39	5.10	15.00	15.21	5,775
ภูมิพล+สิริกิติ์	10,338	45	3,688	23	3.39	5.10	40.00	45.21	12,634
แควน้อยฯ	172	18	129	14	0.57	1.04	1.30	1.30	767
ป่าสักชลสิทธิ์	126	13	123	13	0.40	0.82	1.04	1.04	834
รวมทั้งหมด	10,636	43	3,940	22	4.36	6.96	42.34	47.54	14,235

หมายเหตุ: () คือ เป็นความจุเก็บกักปกติ (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร



(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 66

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลาการจ้างงาน 3-10 เดือน มีแผนการจ้างจำนวน 86,000 คน ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานไปแล้ว จำนวน 82,059 คน คิดเป็นร้อยละ 95.42



คุณภาพน้ำ (วันที่ 26 มิ.ย. 66 เวลา 07.00 น.)

(หน่วย : กรัม/ลิตร)

แม่น้ำ	สถานีเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม
เจ้าพระยา	ประปาสำแล จ.ปทุมธานี	0.25	0.18 (ปกติ)
บางปะกง	ปตร.หาดยาง (ควบคุมตลอดทั้งปี)	1.00	0.00 (ปกติ) วันที่ 25 มิ.ย. 66
ท่าจีน	ด้านนอกคลองจินดา	0.75	0.27 (ปกติ)
	ด้านในคลองจินดา	0.75	0.27 (ปกติ)
แม่กลอง	ปากคลองดำเนินสะดวก	2.00	0.24 (ปกติ)

ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2566 และผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2565/66

ผลจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2566 (1 พ.ค.66 - 31 ต.ค.66)

ข้อมูลผลจัดสรรน้ำ ณ วันที่ 25 มิ.ย. 66

ทั้งประเทศ แผนจัดสรรน้ำ 14,851 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 6,445 ล้าน ลบ.ม. (44%)
แผนเพาะปลูกข้าวนปี (21 มิ.ย.66) 16.98 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 8.83 ล้านไร่ (52%)
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนจัดสรรน้ำ 5,500 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 2,757 ล้าน ลบ.ม. (51%)
แผนเพาะปลูกข้าวนปี (21 มิ.ย.66) 8.05 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 5.75 ล้านไร่ (71%)

ผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2565/66 (1 ม.ค.66 - 30 มิ.ย.66)

ข้อมูลผลจัดสรรน้ำ ณ วันที่ 25 มิ.ย. 66

ลุ่มน้ำแม่กลอง แผนจัดสรรน้ำ 5,500 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 5,010 ล้าน ลบ.ม. (92%)
แผนเพาะปลูกข้าวนปี (21 มิ.ย.66) 0.84 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 0.83 ล้านไร่ (98%)

กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน

- ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณท่าสูบน้ำบ้านหนองท่า ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรให้กับราษฎรในพื้นที่
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักงานชลประทานที่ 3 ดำเนินการกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสาย 76 ตั้งแต่ กม.30 + 200 ถึง กม. 30 + 600 บริเวณท้องที่หมู่ 5 ตำบลคลองคู่อ อำเภอดงพานหิน จังหวัดพิจิตร เพื่อให้สามารถส่งน้ำได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 ดำเนินการกำจัดวัชพืช (ผักตบชวา) ในแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณวัดมูลเหล็ก ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำสำหรับการเกษตร อุปโภค-บริโภค



สายด่วน 1460
ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ



สามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ที่
<http://wmsc.rid.go.th/>

