

รายงานสถานการณ์น้ำ


ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โทร. 02 669 2560 E-mail : wmsc.1460@gmail.com



วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566



สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (วันที่ 4 มิ.ย. 66 เวลา 06.00 น.)

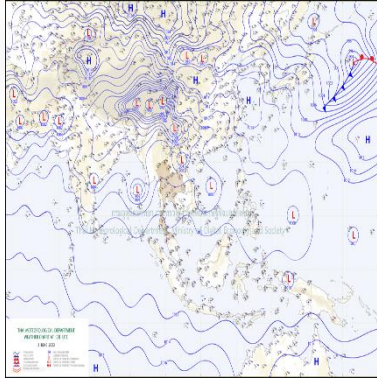


ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน

ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 127.5 มม. อ.ยะหา จ.ยะลา 109.0 มม. และ อ.สูง จ.ฉะเชิงเทรา 108.5 มม.

แหล่งที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

ปริมาณน้ำ **ใช้การ** อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

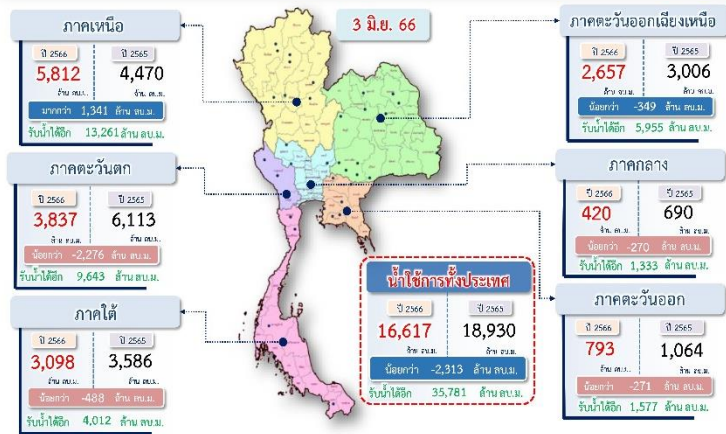

สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิ.ย. 66)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 4 มิถุนายน 2566

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		รับน้ำได้
	ปริมาณน้ำ	% ความจุ	ปริมาณน้ำ	% ใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	7,325	54	3,525	36	0.00	0.00	28.00	30.00	6,137
สิริกิติ์	4,022	42	1,172	18	2.63	2.63	14.97	15.01	5,488
ภูมิพล+สิริกิติ์	11,347	49	4,697	29	2.63	2.63	42.97	45.01	11,625
แควน้อยฯ	205	22	162	18	0.00	0.00	1.73	1.85	734
ป่าสักชลสิทธิ์	150	16	147	15	0.00	0.77	1.30	1.30	810
รวมทั้งหมด	11,702	47	5,006	28	2.63	3.40	46.00	48.17	13,169

*หมายเหตุ : () คือ เก็บความจุเก็บกักปกติ

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร



(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 66

โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลาการจ้างงาน 3-10 เดือน มีแผนการจ้างจำนวน 86,000 คน ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานไปแล้ว จำนวน 76,911 คน คิดเป็นร้อยละ 89.43



คุณภาพน้ำ (วันที่ 4 มิ.ย. 66 เวลา 07.00 น.)

(หน่วย : กรัม/ลิตร)

แม่น้ำ	สถานีเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม
เจ้าพระยา	ประปาสำแล จ.ปทุมธานี	0.25	0.17 (ปกติ)
	บางปะกง	ปตร.หาดยาง (ควบคุมตลอดทั้งปี)	1.00
ท่าจีน	ด้านนอกคลองจินดา	0.75	0.27 (ปกติ)
	ด้านในคลองจินดา	0.75	0.26 (ปกติ)
แม่กลอง	ปากคลองดำเนินสะดวก	2.00	0.21 (ปกติ)

ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2566 และผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2565/66

ผลจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2566 (1 พ.ค.66 - 31 ต.ค.66)

ข้อมูลผลจัดสรรน้ำ ณ วันที่ 3 มิ.ย.66

ทั้งประเทศ แผนจัดสรรน้ำ 14,851 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 4,054 ล้าน ลบ.ม. (28%)
แผนเพาะปลูกข้าวนปี (31 พ.ค.66) 16.98 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 4.60 ล้านไร่ (27%)
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนจัดสรรน้ำ 5,500 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 1,673 ล้าน ลบ.ม. (31%)
แผนเพาะปลูกข้าวนปี (31 พ.ค.66) 8.05 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 3.44 ล้านไร่ (43%)

ผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2565/66 (1 ม.ค.66 - 30 มิ.ย.66)

ข้อมูลผลจัดสรรน้ำ ณ วันที่ 3 มิ.ย.66

ลุ่มน้ำแม่กลอง แผนจัดสรรน้ำ 5,500 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 4,454 ล้าน ลบ.ม. (81%)
แผนเพาะปลูกข้าวนปี (31 พ.ค.66) 0.84 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 0.83 ล้านไร่ (98%)

กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน

- โครงการชลประทานพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และตรวจสอบความพร้อมใช้งานอาคารชลประทาน บริเวณฝายสามง่าม บ้านจะเข้ฝอม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม และฝายพญาวัง ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพื่อวางแผนปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อให้อาคารชลประทานพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพตลอดเวลา
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการชำรุดของสะพานทางเท้าเลียบบคลองประเวศบุรีรัมย์ บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรทางเท้า
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขางมณี สำนักงานชลประทานที่ 12 ดำเนินการกำจัดวัชพืชผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำในคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย บริเวณตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ และลดการแพร่ขยายพันธุ์ของวัชพืชผักตบชวา



สายด่วน 1460
ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ



สามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ที่
<http://wmsc.rid.go.th/>

