

รายงานสถานการณ์น้ำฉบับผู้บริหาร



ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โทร. 02 669 2560 E-mail : wmsc.1460@gmail.com


วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงย้อนหลัง (วันที่ 27 ก.ย.64 เวลา 06.00 น.)

ลำดับที่	สถานี	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝนสะสม (ม.ม.)
1	ตลาดเก่าตะกั่วป่า	ตะกั่วป่า	พังงา	166.2
2	บ้านบางทอง	ท้ายเหมือง	พังงา	139.5
3	บ้านดอกแดง	ตะกั่วป่า	พังงา	138.0
4	บ้านกะไหล	ตะกั่วทุ่ง	พังงา	133.5
5	บ้านหินลาด	คุระบุรี	พังงา	130.0

หมายเหตุ แหล่งที่มาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

ปริมาณน้ำ เกือบกัก อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย.64)

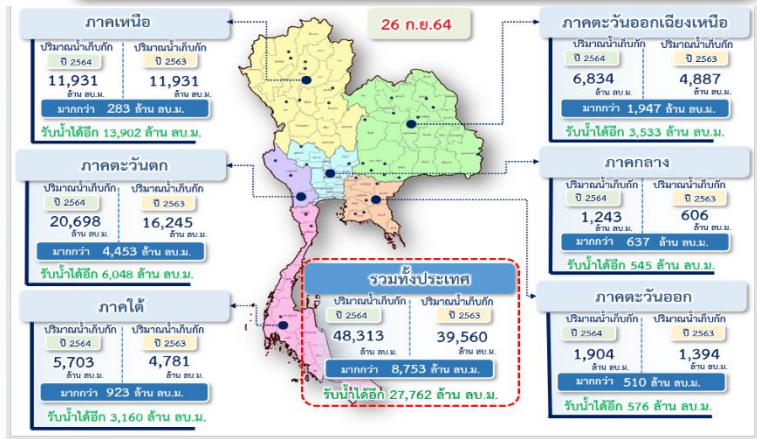

สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย.64)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 26 กันยายน 2564

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		รับน้ำได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุ	ปริมาณน้ำ	% ใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,966	44	2,166	22	109.77	114.86	0.50	0.50	7,496
สิริกิติ์	4,052	43	1,202	18	20.14	21.68	0.00	0.00	5,458
ภูมิพล+สิริกิติ์	10,018	44	3,368	21	129.91	136.54	0.50	0.50	12,955
แควน้อยฯ	757	81	714	80	19.12	22.62	1.12	1.12	182
ป่าสักชลสิทธิ์	601	63	598	63	87.32	30.30	0.00	0.00	359
รวมทั้งหมด	11,376	46	4,680	26	236.35	189.47	1.62	1.62	13,495

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพการเพาะปลูกข้าว (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย.64)

การเพาะปลูกข้าวนาปี ปี 2563/64
ทั้งประเทศ แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 1.90 ล้านไร่ **เพาะปลูกทั้งสิ้น 5.56 ล้านไร่**
เก็บเกี่ยวแล้ว 5.48 ล้านไร่ คงเหลือการเก็บเกี่ยว 0.08 ล้านไร่


การเพาะปลูกข้าวนาปี ปี 2564
ทั้งประเทศ แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 16.83 ล้านไร่ **เพาะปลูกแล้ว 15.12 ล้านไร่**
คิดเป็นร้อยละ 89.87 ของแผนฯ เก็บเกี่ยวแล้ว 5.01 ล้านไร่
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 7.97 ล้านไร่ **เพาะปลูกแล้ว 6.95 ล้านไร่**
คิดเป็นร้อยละ 87.29 ของแผนฯ เก็บเกี่ยวแล้ว 4.14 ล้านไร่



สถานการณ์น้ำท่า สถานีหลักกรมชลประทาน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย.64)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับตลิ่ง (เมตร)	ความจุ (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	(+)/สูง(-) ต่ำกว่าตลิ่ง (เมตร)
S.3	แม่ป่าสัก อ.พหลโยธิน จ.เพชรบูรณ์	6.00 น.	8.30	85.00	8.86	111.00	0.56
S.48	แม่ป่าสัก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์	5.00 น.	9.20	190.00	9.56	217.90	0.36
S.42	แม่ป่าสัก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์	5.00 น.	11.00	279.10	11.47	308.60	0.47
E.23	บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	6.00 น.	9.00	265.00	9.59	559.26	0.59
E.85	บ้านโนนหิน อ.ชุมพวง จ.ขอนแก่น	6.00 น.	5.26	25.00	6.10	32.10	0.84
E.29A	บ้านผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย	5.00 น.	9.00	167.00	11.82	340.45	2.82
E.5	บ้านโนนเปือย อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ	6.00 น.	11.50	186.10	12.16	689.40	0.66
M.173	บ้านโนนสะอาด อ.โคกโพธิ์ จ.นครราชสีมา	6.00 น.	6.60	70.00	6.86	122.00	0.26
M.184	บ้านซิม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	6.00 น.	5.00	100.00	5.68	141.60	0.68
W.24	แม่น้ำวัง อ.สามง่าม จ.ตาก	6.00 น.	7.85	504.00	8.13	519.40	0.28
W.4A	แม่น้ำวัง อ.สามง่าม จ.ตาก	6.00 น.	8.00	700.00	6.60	472.20	-1.40
C36	บ้านบางหลวงโคก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา	6.00 น.	4.00	420.00	5.63	724.00	1.63
C37	บ้านบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา	6.00 น.	3.80	148.00	4.25	172.00	0.45
Kgt.3	อ.กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	6.00 น.	8.79	543.00	9.52	626.40	0.73

สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัย กรมชลประทาน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย.64)

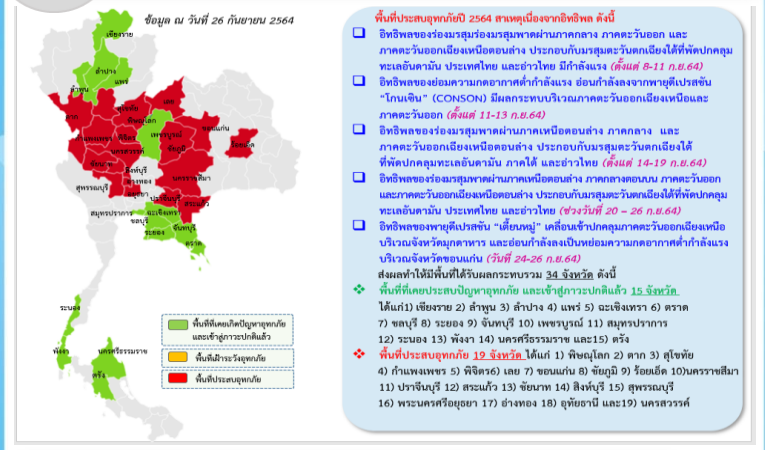

กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 12 เครื่อง บริเวณด้านท้ายเขื่อนร้อยเอ็ด ตำบลพระธาตุ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเร่งระบายน้ำในลำน้ำชีลงสู่แม่น้ำมูล และป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก
- ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณ ชุมชนวัดเสนาวงศ์ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุเตี้ยนหมู่

