



### สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (เวลา 06.00 น.)

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือ ตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีลม ตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปก คลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก ในขณะที่ร่องมรสุมพาด ผ่านอ่าวไทย และภาคใต้ตอนกลาง ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝน ตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้า กระนอง และลมกระโชกแรงบางพื้นที่




### ปริมาณฝนตกสะสม 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 5 ลำดับ

| อันดับ | ที่ตั้ง                             | ปริมาณฝน (มม.) |
|--------|-------------------------------------|----------------|
| 1      | ต.ทอ้งเนียน อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช  | 122.7          |
| 2      | ต.แม่เป็น อ.แม่เป็น จ.นครสวรรค์     | 96.5           |
| 3      | ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว  | 89.0           |
| 4      | ต.แปลงยาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา | 84.5           |
| 5      | ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก  | 77.6           |



### ปริมาณน้ำเก็บกักและใช้การ ในอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำนวน 496 แห่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 69

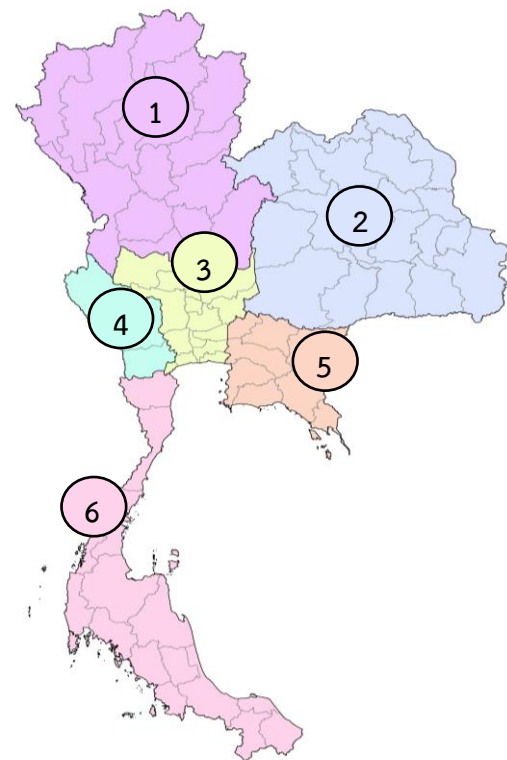


| ภาค                  | ความจุ | ปริมาณน้ำเก็บกัก | ปริมาณน้ำใช้การ |
|----------------------|--------|------------------|-----------------|
| 1 เหนือ              | 26,009 | 19,831 (76%)     | 12,996 (68%)    |
| 2 ตะวันออกเฉียงเหนือ | 10,577 | 7,635 (72%)      | 5,806 (66%)     |
| 3 กลาง               | 1,750  | 1,550 (89%)      | 1,448 (88%)     |
| 4 ตะวันตก            | 26,775 | 26,391 (99%)     | 13,103 (97%)    |
| 5 ตะวันออก           | 2,633  | 2,512 (95%)      | 2,355 (95%)     |
| 6 ใต้                | 8,922  | 6,407 (72%)      | 4,643 (65%)     |
| รวมทั้งประเทศ        | 76,666 | 64,326 (84%)     | 40,351 (77%)    |

\*หมายเหตุ %น้ำใช้การเทียบกับความจุเก็บกัก

\*หน่วย ล้าน ลบ.ม.



# การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

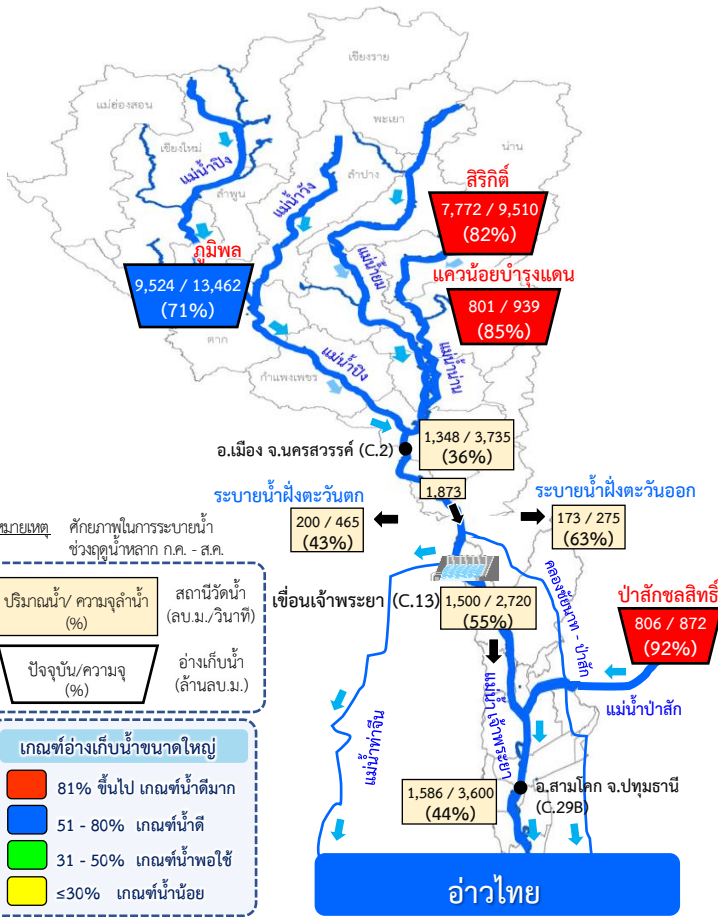

4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ความจุ 24,783 ล้าน ลบ.ม.)  
ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม **18,903** ล้าน ลบ.ม. (76%)  
เป็นน้ำใช้การ **12,196** ล้าน ลบ.ม. (67%)

ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ระบายจากเขื่อนภูมิพล สิริกิตี และเขื่อนน้อยฯ ไหลมารวมกันที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีวัดน้ำ C.2 ค่ายจिरประวัติ จ.นครสวรรค์ **ปัจจุบัน 1,348 ลบ.ม./วินาที** ไหลมารวมกับปริมาณน้ำ Side flow ทำให้มีปริมาณน้ำในการบริหารจัดการเหนือเขื่อนเจ้าพระยา **1,873ลบ.ม./วินาที** กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำ ดังนี้

- ระบายน้ำฝั่งตะวันออก คิดเป็น 63%ของศักยภาพ (173 ลบ.ม./วินาที)
- ระบายน้ำฝั่งตะวันตก คิดเป็น 43%ของศักยภาพ (200 ลบ.ม./วินาที)
- ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยา (C.13) คิดเป็น 55%ของศักยภาพ (1,500 ลบ.ม./วินาที)

นอกจากนี้ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสัก **10 ลบ.ม./วินาที** ไหลผ่านเขื่อนพระรามหก - ลบ.ม./วินาที ก่อนไหลมาบรรจบที่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานี C.29B อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เฉลี่ย **1,586 ลบ.ม./วินาที**



## การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2569

| พื้นที่                                | น้ำต้นทุน<br>ณ 1 พ.ค.69       | แผนจัดสรรน้ำ<br>1 พ.ค.69 – 31 ต.ค.69                                  | ผลจัดสรรน้ำ   | คงเหลือ                    |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| ทั้งประเทศ<br>การจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2569 | 21,398                        | 14,956<br>ความต้องการใช้น้ำ 32,237 ล้าน ลบ.ม.                         | 24,054 (161%) | เกินกว่าแผน<br>9,098 (61%) |
| เจ้าพระยา<br>การจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2569  | 7,533                         | 4,500<br>ความต้องการใช้น้ำ 10,653 ล้าน ลบ.ม.                          | 6,696 (149%)  | เกินกว่าแผน<br>2,196 (49%) |
| แม่กลอง<br>การจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2569    | น้ำต้นทุน ณ 1 ก.ค.69<br>4,211 | (1 ก.ค.69 – 31 ต.ค.69)<br>4,000<br>ความต้องการใช้น้ำ 3,999 ล้าน ลบ.ม. | 2,726 (68%)   | 1,274 (32%)                |

## การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝนปี 2569 (14 ต.ค. 69)

| ทั้งประเทศ  | ข้าวนาปี | พืชไร่ - พืชสวน | รวม   | เจ้าพระยา   | ข้าวนาปี | พืชไร่ - พืชสวน | รวม  |
|-------------|----------|-----------------|-------|-------------|----------|-----------------|------|
| แผนเพาะปลูก | 16.97    | 0.58            | 17.55 | แผนเพาะปลูก | 8.08     | 0.12            | 8.20 |
| ผลเพาะปลูก  | 15.88    | 0.42            | 16.30 | ผลเพาะปลูก  | 7.64     | 0.10            | 7.74 |
| เก็บเกี่ยว  | 7.78     | 0.08            | 7.86  | เก็บเกี่ยว  | 6.49     | 0.06            | 6.55 |

หน่วย : ล้านไร่



ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)



www.wmsc.rid.go.th



wmsc.1460@gmail.com





# สถานการณ์อุทกภัย ปี 2569

จากปริมาณฝนที่ตกหนักและตกสะสมในพื้นที่ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2569 เป็นต้นมา ส่งผลทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งสิ้น **61 จังหวัด** ดังนี้

จังหวัดที่เข้าสู่ภาวะปกติ 44 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ตาก กำแพงเพชรอุดรธานี เลย สกลนคร หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ จันทบุรี สุรินทร์ สระแก้ว ระยอง ตราดลพบุรี เพชรบูรณ์ สระบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท หนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และยะลา

จังหวัดที่ประสบอุทกภัย 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี นครนายก ปทุมธานี นครปฐม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี สิงห์บุรี นครสวรรค์ อ่างทอง อุทัยธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี

## การช่วยเหลือเครื่องจักร-เครื่องมืออุทกภัยปี 2569

เครื่องสูบน้ำ



956/1,914 ชุด

เครื่องผลักดันน้ำ



264/367 คัน

เครื่องจักรกล  
สนับสนุนอื่นๆ



116/3,248 หน่วย

รวม **1,341 หน่วย**

หมายเหตุ ผล/แผน

## ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำอุทกภัยปี 2569

จำนวนครั้ง  
ประชาสัมพันธ์



373 ครั้ง  
สะสม **14,942 ครั้ง**

ระหว่างวันที่ 12 – 18 ตุลาคม 2569  
จำนวนเกษตรกร  
ที่ได้รับการฟังประชาสัมพันธ์



728 คน  
สะสม **38,779 คน**



## กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือ

โครงการชลประทานนครสวรรค์ ร่วมกับส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 3 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง บริเวณตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่บ้านพักอาศัย และพื้นที่การเกษตร



ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 13 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 เครื่อง บริเวณตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ทุ่งสุลาลอง และบรรเทาผลกระทบและลดความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง



โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 ดำเนินการฟื้นฟูและก่อสร้างทางสัญจรชั่วคราว บริเวณตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเร่งซ่อมแซมและปรับปรุงเส้นทางที่ได้รับความเสียหาย ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้สัญจรข้ามระหว่างพื้นที่ได้เป็นการชั่วคราว



ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 15 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณตำบลคลองน้อย อำเภอปากพะนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

