



สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (เวลา 06.00 น.)

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบน และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่พายุโซนร้อน “นาร์รา” บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และด้านตะวันตกของภาคกลาง




ปริมาณฝนตกสะสม 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 5 ลำดับ

อันดับ	ที่ตั้ง	ปริมาณฝน (มม.)
1	ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา	124.5
2	ตลาดเก่าตะกั่วป่า ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	115.6
3	ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา	104.5
4	บ้านบางอี ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	101.0
5	ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	100.0



ปริมาณน้ำเก็บกักและใช้การ ในอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำนวน 496 แห่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 69

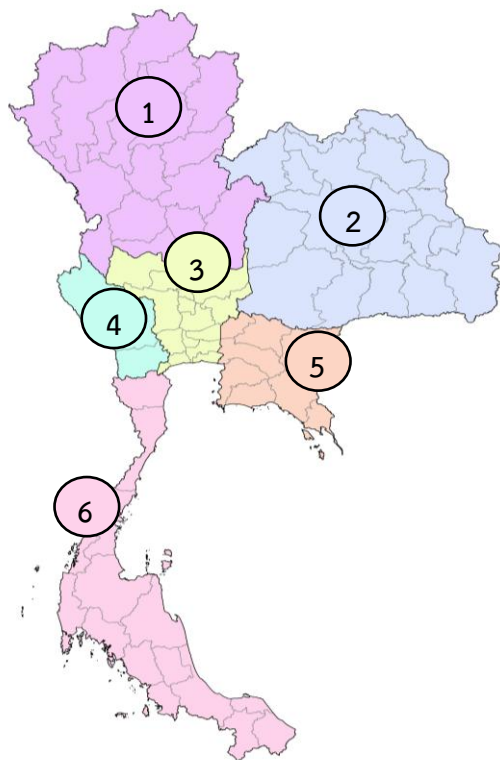


ภาค	ความจุ	ปริมาณน้ำเก็บกัก	ปริมาณน้ำใช้การ
1 เหนือ	26,009	15,901 (61%)	9,066 (47%)
2 ตะวันออกเฉียงเหนือ	10,577	5,297 (50%)	3,474 (40%)
3 กลาง	1,750	631 (36%)	523 (32%)
4 ตะวันตก	26,775	20,338 (76%)	7,050 (52%)
5 ตะวันออก	2,633	1,353 (51%)	1,196 (48%)
6 ใต้	8,922	5,156 (58%)	3,392 (47%)
รวมทั้งประเทศ	76,666	48,676 (63%)	24,707 (46%)

*หมายเหตุ %น้ำใช้การเทียบกับความจุเก็บกัก

*หน่วย ล้าน ลบ.ม.



การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

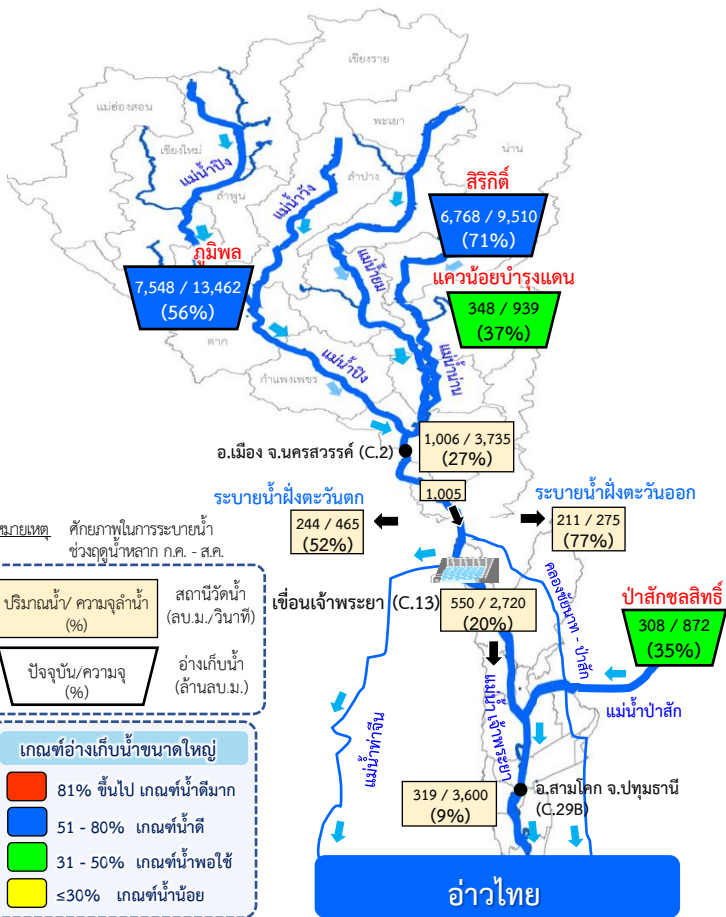

4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ความจุ 24,783 ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 14,973 ล้าน ลบ.ม. (60%)
เป็นน้ำใช้การ 8,265 ล้าน ลบ.ม. (46%)

ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ระบายจากเขื่อนภูมิพล สิริกิตี และแควน้อยฯ ไหลมารวมกันที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีวัดน้ำ C.2 ค่ายจิริประวัติ จ.นครสวรรค์ ปัจจุบัน 1,006 ลบ.ม./วินาที ไหลมารวมกับปริมาณน้ำ Side flow ทำให้มีปริมาณน้ำในการบริหารจัดการเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 1,005 ลบ.ม./วินาที กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำ ดังนี้

- ระบายน้ำฝั่งตะวันออก คิดเป็น 21% (211 ลบ.ม./วินาที)
- ระบายน้ำฝั่งตะวันตก คิดเป็น 24% (244 ลบ.ม./วินาที)
- ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยา (C.13) คิดเป็น 55% (550 ลบ.ม./วินาที)

นอกจากนี้ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสัก 15 ลบ.ม./วินาที ไหลผ่านเขื่อนพระรามหก 20 ลบ.ม./วินาที ก่อนไหลมาบรรจบที่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานี C.29B อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เฉลี่ย 319 ลบ.ม./วินาที



การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2569

พื้นที่	น้ำต้นทุน ณ 1 พ.ค.69	แผนจัดสรรน้ำ 1 พ.ค.69 – 31 ต.ค.69	ผลจัดสรรน้ำ	คงเหลือ
ทั้งประเทศ การจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2569	21,398	14,956 ความต้องการใช้น้ำ 32,237 ล้าน ลบ.ม.	14,342 (96%)	614 (4%)
เจ้าพระยา การจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2569	7,533	4,500 ความต้องการใช้น้ำ 10,653 ล้าน ลบ.ม.	5,143 (114%)	เกินกว่าแผน 643 (14%)
แม่กลอง การจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2569	น้ำต้นทุน ณ 1 ก.ค.69 4,211	(1 ก.ค.69 – 31 ธ.ค.69) 4,000 ความต้องการใช้น้ำ 3,999 ล้าน ลบ.ม.	1,096 (27%)	2,904 (73%)

การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝนปี 2569 (19 ส.ค. 69)

ทั้งประเทศ	ข้าวนาปี	พืชไร่ - พืชสวน	รวม	เจ้าพระยา	ข้าวนาปี	พืชไร่ - พืชสวน	รวม
แผนเพาะปลูก	16.97	0.58	17.55	แผนเพาะปลูก	8.08	0.12	8.20
ผลเพาะปลูก	14.84	0.39	15.23	ผลเพาะปลูก	7.53	0.10	7.63
เก็บเกี่ยว	0.90	0.22	1.12	เก็บเกี่ยว	0.60	0.01	0.61

หน่วย : ล้านไร่



สถานการณ์อุทกภัย ปี 2569

จากปริมาณฝนที่ตกหนักและตกสะสมในพื้นที่ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2569 เป็นต้นมา ส่งผลทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งสิ้น **28 จังหวัด** ดังนี้

จังหวัดที่เข้าสู่ภาวะปกติ 24 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง อุดรดิตถ์ สุโขทัย อุดรธานี เลย สกลนคร หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร จันทบุรี ตราด สระบุรี เพชรบุรี หนองบัวลำภู กระบี่ และตรัง

จังหวัดที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุบลราชธานี และนครพนม

การช่วยเหลือเครื่องจักร-เครื่องมืออุทกภัย ปี 2569

เครื่องสูบน้ำ



413/1,914 ชุด

เครื่องผลักดันน้ำ



22/367 คัน

เครื่องจักรกล
สนับสนุนอื่นๆ



78/3,248 หน่วย

รวม 513 หน่วย

หมายเหตุ ผล/แผน

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำอุทกภัย ปี 2569

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 23 สิงหาคม 2569

จำนวนครั้ง
ประชาสัมพันธ์



351 ครั้ง
สะสม 9,042 ครั้ง

จำนวนเกษตรกร
ที่ได้รับการฟังประชาสัมพันธ์



825 คน
สะสม 29,116 คน



กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือ

โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมดำเนินการฟื้นฟูเมืองน่าน หลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลาย ในพื้นที่บริเวณถนนข้าหลวง หน้าเขื่อนภูคา โรงเรียนสตรีศรีน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อให้กลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยบูรณาการร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาญชุมพล ร่วมกับ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 3 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง บริเวณพื้นที่ หมู่ 7 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสูบน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรที่รอการเก็บเกี่ยว



ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 4 ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในเขตพื้นที่ ตำบลคลองมะพลับ และตำบลศรีนคร อำเภอสรีนคร จังหวัดสุโขทัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และป้องกันผลกระทบจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง สำนักงานชลประทานที่ 5 ดำเนินการวางกระสอบทรายทำพนังกั้นน้ำ บริเวณลำห้วยอิง บ้านจำปา ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างแนวป้องกันน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรง และสามารถรองรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่

