เลขที่เอกสารในระบบ E กผง06/196/2565

สบอ 1798/2565

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๑๙๖/๒๕๖๕ **วันที่** ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

เรียน ผอ.ผง. สำเนา ผผง.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ สรุปรายงานความก้าวหน้า โดยแยกตามปีงบประมาณ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑๙ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๒,๐๕๐.๓๘ ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร ๑,๘๒๑.๐๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๗๒๓.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๓ ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้ยางพารา ๒,๐๖๘.๐๕ ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา ๒,๖๕๙.๐๘ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๒๘.๕๘ ผลการดำเนินงานในภาพรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๐๐ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ และยกเลิก จำนวน ๙ รายการ เนื่องจากราษฎรไม่มีความต้องการแล้ว และหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๑ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๑,๘๓๖.๖๘ ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร ๑,๗๔๙.๙๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑๓๓.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๑ ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้ยางพารา ๘๙๘.๐๔ ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา ๑๒๔.๕๒ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๗ ผลการดำเนินงานในภาพรวม ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๐ รายการ (สชป.๙ จำนวน ๑ รายการ สชป.๑๔ จำนวน ๘ รายการ และสชป.๑๕ จำนวน ๑ รายการ) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓๑ รายการ (อนุมัติแผน จำนวน ๑๙ รายการ เปิดซอง จำนวน ๕ รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน ๗ รายการ) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๗๕ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙ รายการ และยกเลิก จำนวน ๖ รายการ เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดรายการงานที่ยังไม่ดำเนินการมาด้วยแล้ว

(นางสาววราภรณ์ ทัตพงษ์ศรีธร)
ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รธบ. รธส. รธร. รธว. และผู้อำนวยการสำนัก/กอง
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)
ผอ.ผง.
๔ มี.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค, ทน.๑ - ๙ บอ. และ ผบท.บอ.
เพื่อโปรดทราบ

(นางฐิตาภา ทุมวงษา)
ผบท.บอ.
๗ มี.ค. ๒๕๖๕

ชัชวาลย์ ทนน. รก.ผอ.

โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานที่ดำเนินการโดยนำยางพารามาเป็นส่วนผสมของงานถนน เพื่อการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนบนคันคลอง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน รวมทั้งสิ้น 219 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2,050.38 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,821.06 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,723.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.63 แผนปริมาณการใช้ยางพารา 2,068.05 ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา 2,659.08 ตัน คิดเป็นร้อยละ 128.58 ผลการดำเนินงานในภาพรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 200 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ และยกเลิก จำนวน 9 รายการ ทั้งนี้ จำแนกตามประเภท ดังนี้

- Para Asphalt Concrete จำนวน 161 รายการ งบประมาณจัดสรร 1,332.78 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,323.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.31 แผนปริมาณการใช้ยางพารา 795.88 ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา 1,318.66 ตัน คิดเป็นร้อยละ 165.69 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 151 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ เนื่องจากราษฎรไม่มีความต้องการแล้ว และหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

- Para Soil Cement จำนวน 29 รายการ งบประมาณจัดสรร 153.95 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 140.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.58 แผนปริมาณการใช้ยางพารา 1,210.72 ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา 1,286.18 ตัน คิดเป็นร้อยละ 106.23 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 27 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คือ ซ่อมแซมถนนท้าย อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากที่ประชุมคณะทำงานกรรมการวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 3/2563 มีมติให้ชะลอแผนการดำเนินงาน โดยให้ส่วนความปลอดภัยเขื่อนของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จัดตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อศึกษาและสรุปรูปแบบในการแก้ไขและปรับปรุงเขื่อนห้วยยาง จังหวัดสระแก้ว อย่างเร่งด่วน

- โครงการขยายผลทุ่นยางพาราดักผักตบชวา (Para – Log Boom-I) จำนวน 1 รายการ งบประมาณจัดสรร 82.85 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 82.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ

- รายการงานโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 28 รายการ งบประมาณจัดสรร 251.48 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 175.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.95 แผนปริมาณการใช้ยางพารา 61.44 ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา 54.24 ตัน คิดเป็นร้อยละ 88.28 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานเป็นงานซ่อมแซม ปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน และถนนทางเข้าหัวงานโครงการชลประทาน รวมทั้งสิ้น 131 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1,836.68 ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร 1,749.96 ล้านบาท เบิกจ่าย 133.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.61 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้ยางพารา 898.04 ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา 124.52 ตัน คิดเป็นร้อยละ 13.87 ผลการดำเนินงานในภาพรวม ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 10 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 31 รายการ (อนุมัติแผน จำนวน 19 รายการ เปิดซอง จำนวน 5 รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน 7 รายการ) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 75 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 รายการ และยกเลิก จำนวน 6 รายการ โดยจำแนกตามประเภทงาน ได้แก่

- **Para Asphalt Concrete** จำนวน 127 รายการ งบประมาณ 1,802.41 ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร 1,715.87 ล้านบาท เบิกจ่าย 111.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.48 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้ยางพารา 792.54 ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา 50.36 ตัน คิดเป็นร้อยละ 6.35 ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 10 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 31 รายการ (อนุมัติแผน จำนวน 19 รายการ เปิดซอง จำนวน 5 รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน 7 รายการ) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 73 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 รายการ และยกเลิก จำนวน 6 รายการ เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว

- **Para Soil Cement** จำนวน 4 รายการ งบประมาณ 34.26 ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร 34.09 ล้านบาท เบิกจ่าย 22.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.62 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้ยางพารา 105.50 ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา 74.16 ตัน คิดเป็นร้อยละ 70.29 ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 รายการ

****

การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565

กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565

การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ร.บ. 2564			
ประเภท	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางข้น (ตัน)
แผน	1,821.06	219	2,068.05
ผล	1,723.32 (94.63%)	200	2,659.08 (128.58%)

Para Asphalt Concrete			
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางข้น (ตัน)
แผน	1,332.78	161	795.88
ผล	1,323.58 (99.31%)	151	1,318.66 (165.69%)

Para Soil Cement			
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางข้น (ตัน)
แผน	153.95	29	1,210.72
ผล	140.99 (91.58%)	27	1,286.18 (106.23%)

รายการโอนเปลี่ยนแปลง			
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางข้น (ข้น)
แผน	251.48	28	61.44
ผล	175.90 (69.95%)	21	54.24 (88.28%)

Para. - Log Boom-I		
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)
แผน	82.85	1
ผล	82.85 (100%)	1

หมายเหตุ : ยกเลิกจำนวน 9 รายการ เนื่องจากราษฎรไม่มีความต้องการแล้ว และหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

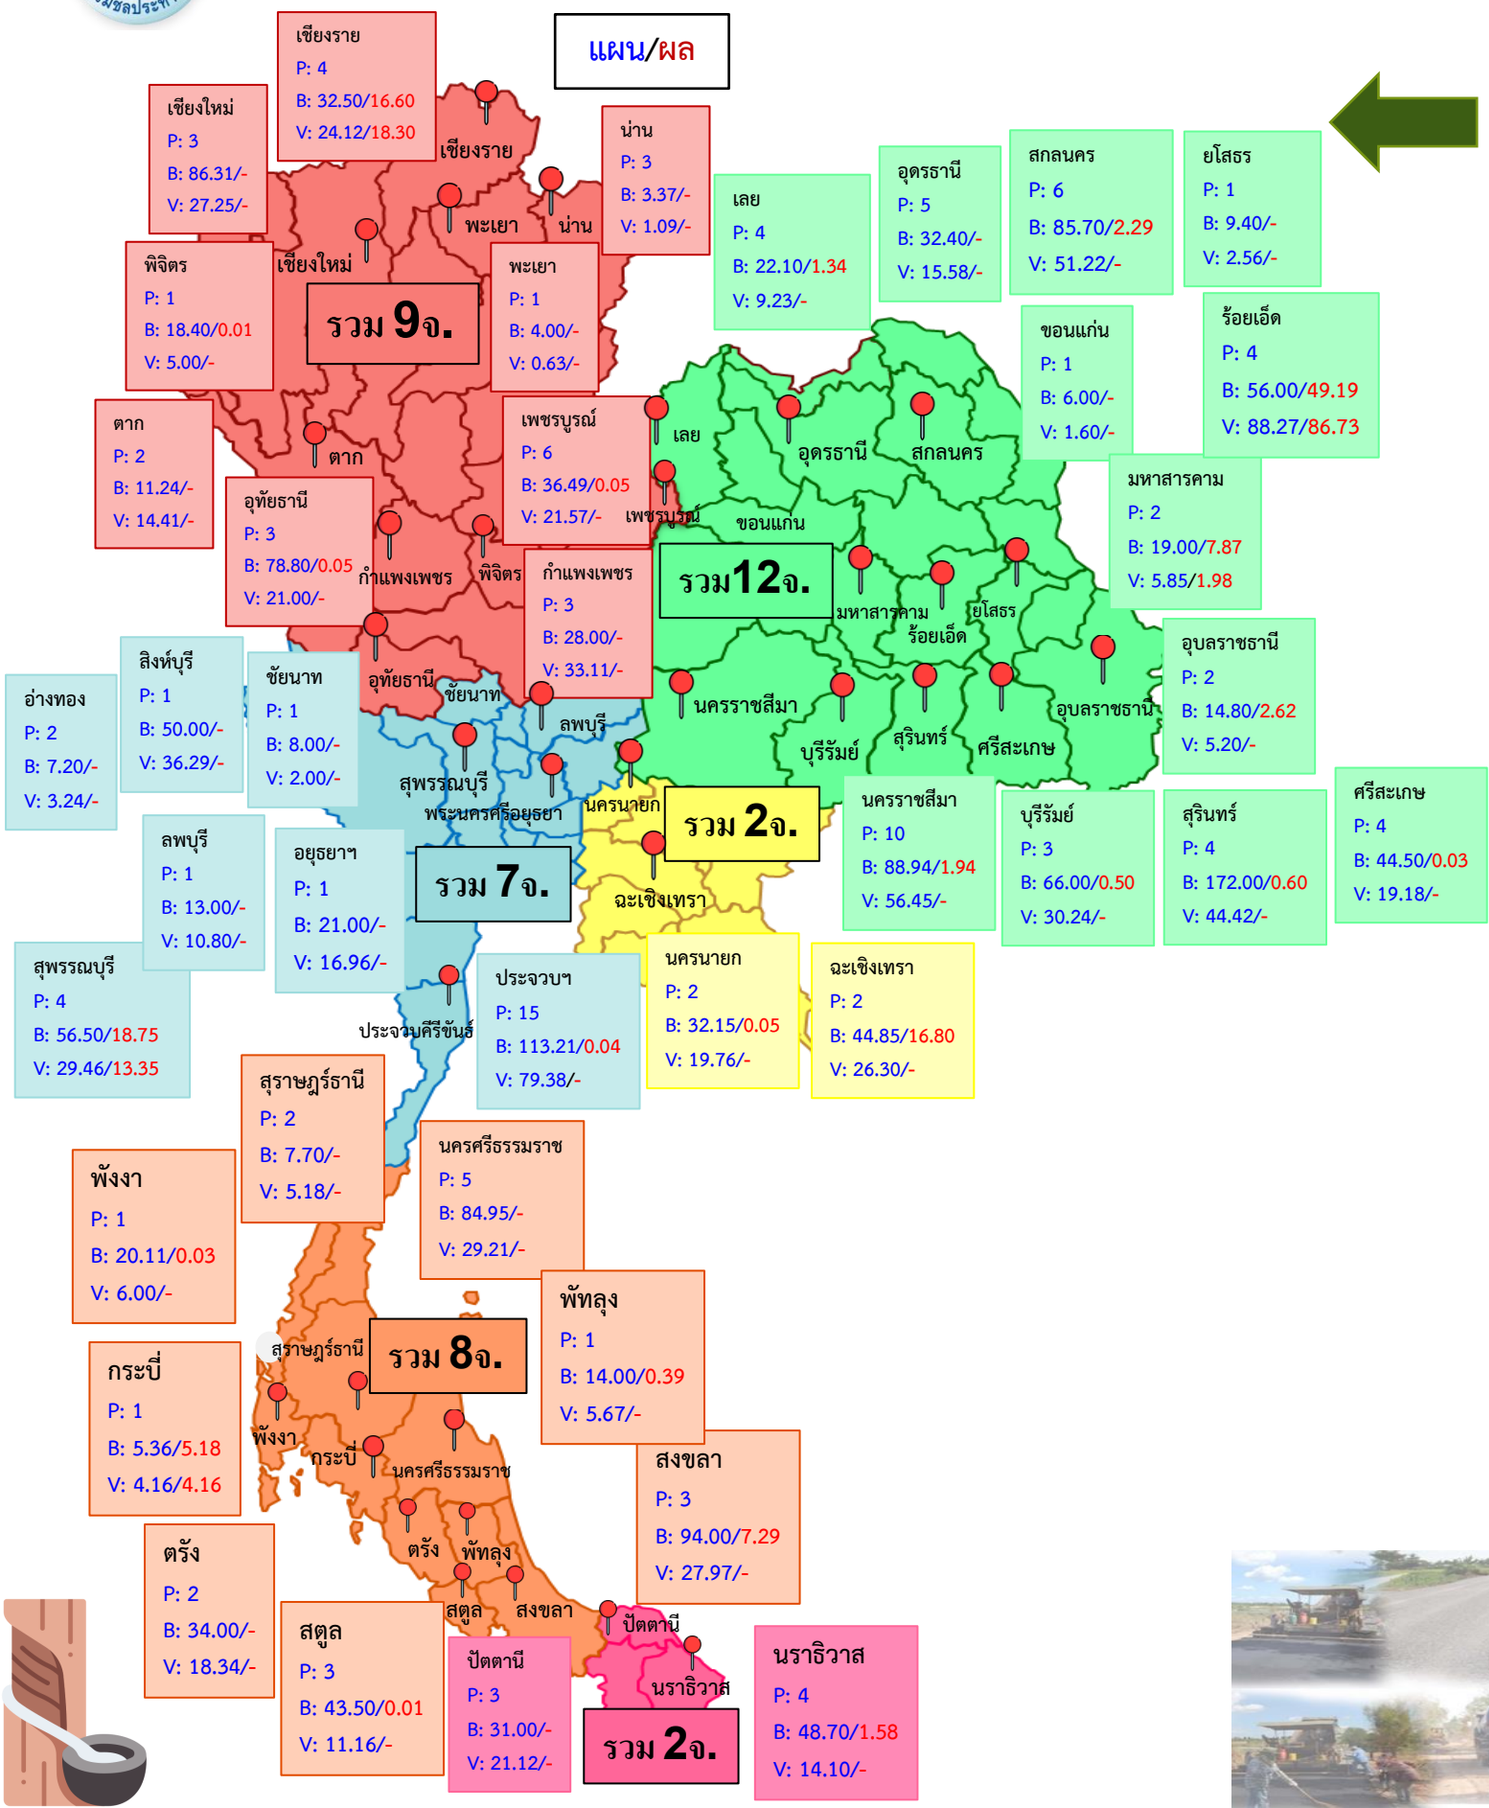

แผนการดำเนินงาน	P (PA-PS)	B	V
ภาค/จังหวัด	จำนวน	งบประมาณ (ล้านบาท)	น้ำยางข้น (ตัน)
รวม 40 จ.	131 (127-4)	1,836.68	898.04
เหนือ	26 (26)	299.11	148.17
ตะวันออกเฉียงเหนือ	46 (43-3)	616.84	329.80
กลาง	25 (25)	268.91	178.13
ตะวันออก	4 (4)	77.00	46.06
ใต้	23 (22-1)	495.12	160.65
ใต้ชายแดน	7 (7)	79.70	35.22

หมายเหตุ

- PA : Para Asphalt Concrete - PS : Para Soil Cement

ผลการดำเนินงานภาพรวม

ประเภท	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางข้น (ตัน)
แผน	1,836.68	1,749.96	131	898.04
ผล	133.21 (7.25%)	133.21 (7.61%)	9	124.52 (13.87%)

1. PA

PA : Para Asphalt Concrete

ประเภท	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางข้น (ตัน)
แผน	1,802.41	1,715.87	127	792.54
ผล	111.18 (6.17%)	111.18 (6.48%)	7	50.36 (6.35%)

ยังไม่ดำเนินการ 10 รายการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 รายการ (อนุมัติแผน 19 รายการ เปิดซอง 5 รายการ อนุมัติรับราคา 7 รายการ) อยู่ระหว่างก่อสร้าง 73 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 รายการ และยกเลิก 6 รายการ เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว

2. PS

PS : Para Soil Cement

ประเภท	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางข้น (ตัน)
แผน	34.26	34.09	4	105.50
ผล	22.03 (64.30%)	22.03 (64.62%)	2	74.16 (70.29%)

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ

รายละเอียดรายการงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่ยังไม่ดำเนินการ)

ลำดับ	รายการงาน	สำนัก	ประเภทยางพารา	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (บาท)	แผนปริมาณการใช้ยางพารา (ตัน)
	รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 รายการ			**134,650,000**	**215.40**
1	(28) ซ่อมสร้างผิวทางเข้าหัวงานโครงการ ระยะทาง 2.74 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [2157]	สำนักงานชลประทานที่ 9	Para Asphalt Concrete	24,000,000	14.99
2	(43) ปรับปรุงถนนลาดยางรอบอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [2172]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	45,000,000	8.20
3	(1.56) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 60ซ้าย และ 61ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.370 กม. - [2117]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	1,860,000	5.18
4	(1.55) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 44ซ้าย-4ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.520 กม. - [2116]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	2,100,000	5.75
5	(1.54) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 41ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.655 กม. - [2115]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	2,270,000	6.27
6	(1.53) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 34 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.500 กม. - [2114]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	2,080,000	5.67
7	(1.52) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 22ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.120 กม. - [2113]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	1,950,000	4.23
8	(1.50) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 19ซ้าย -1ซ้าย-4ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.500 กม. - [2111]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	2,540,000	5.67
9	(1.49) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 19ซ้าย -1ซ้าย-2ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.700 กม. - [2110]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	2,850,000	6.43
10	(45) ปรับปรุงผิวจราจรถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย RMC ฝายคลองไม้เสียบระยะทาง 9.165 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [2174]	สำนักงานชลประทานที่ 15	Para Asphalt Concrete	50,000,000	16.50
