
# รายงานสถานการณ์น้ำ

**วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569**

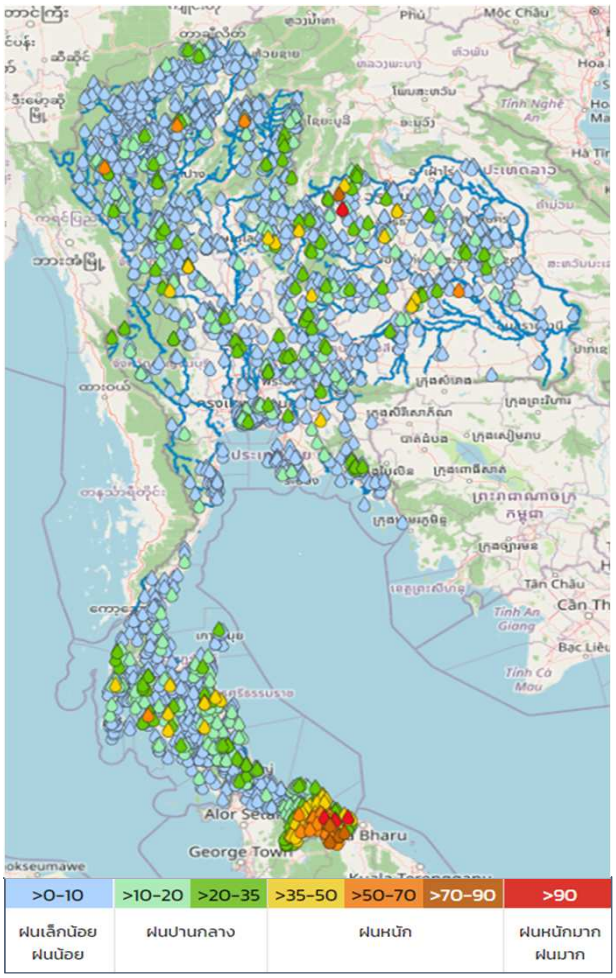



## สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (เวลา 06.00 น.)

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้แล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในคืนวันนี้ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณภาคเหนือ และด้านตะวันตกของภาคกลาง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง สำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้ตอนล่างเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

## ปริมาณฝนตกสะสม 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 5 ลำดับ

| อันดับ | ที่ตั้ง | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|---|
| 1 | ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 108.0 |
| 2 | ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส | 105.0 |
| 3 | อบต.ท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย | 100.2 |
| 4 | ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส | 91.5 |
| 5 | บ้านท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย | 90.0 |

## ปริมาณน้ำเก็บกักและใช้การ ในอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำนวน 496 แห่ง

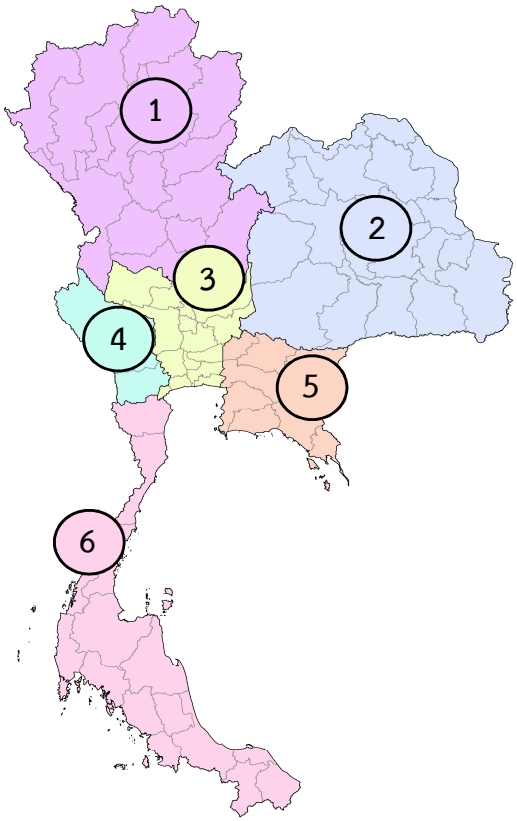



ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย. 69

| ภาค | ความจุ | ปริมาณน้ำเก็บกัก | ปริมาณน้ำใช้การ |
|---|---|---|---|
| 1 เหนือ | 26,009 | 19,822 (76%) | 12,987 (68%) |
| 2 ตะวันออกเฉียงเหนือ | 10,577 | 7,295 (69%) | 5,466 (62%) |
| 3 กลาง | 1,750 | 1,710 (98%) | 1,608 (98%) |
| 4 ตะวันตก | 26,775 | 26,042 (97%) | 12,754 (95%) |
| 5 ตะวันออก | 2,633 | 2,565 (97%) | 2,408 (97%) |
| 6 ใต้ | 8,922 | 6,424 (72%) | 4,660 (65%) |
| รวมทั้งประเทศ | 76,666 | 63,858 (83%) | 39,883 (76%) |

*หน่วย ล้าน ลบ.ม.

*หมายเหตุ %น้ำใช้การเทียบกับความจุเก็บกัก

# การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

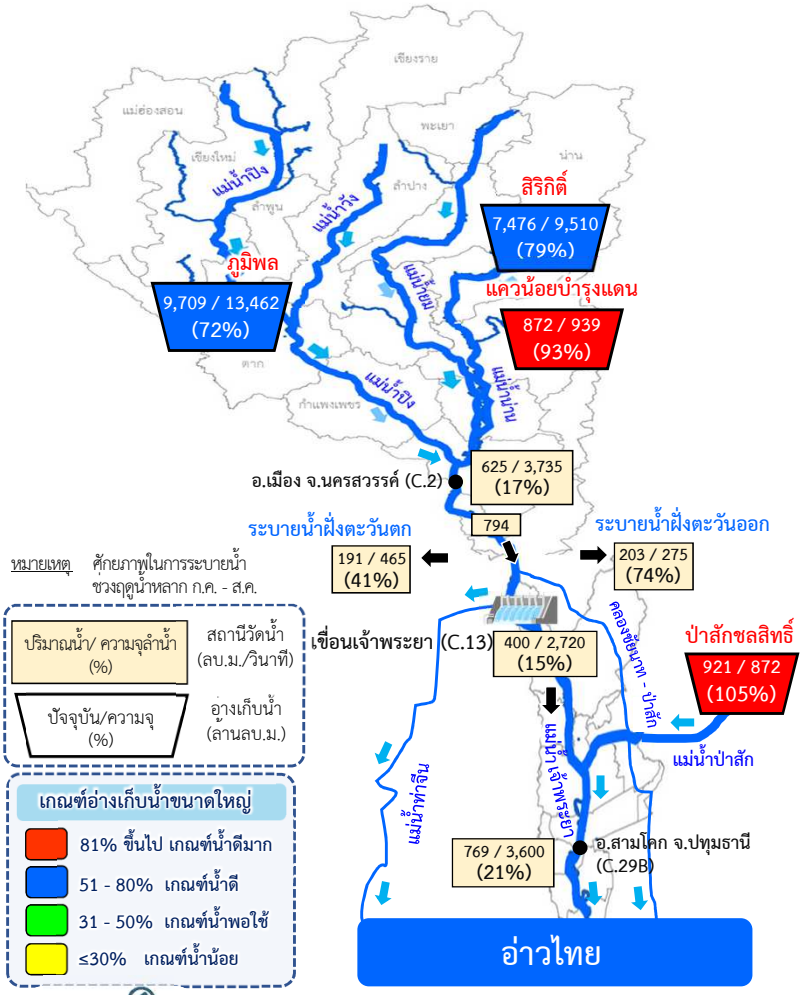


4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ความจุ 24,783 ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 18,978 ล้าน ลบ.ม. (77%)
เป็นน้ำใช้การ 12,270 ล้าน ลบ.ม. (68%)

ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ระบายจากเขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ และแควน้อยฯ ไหลมารวมกันที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีวัดน้ำ C.2 ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ **ปัจจุบัน 625 ลบ.ม./วินาที** ไหลมารวมกับปริมาณน้ำ Side flow ทำให้มี**ปริมาณน้ำในการบริหารจัดการเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 794 ลบ.ม./วินาที** กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำ ดังนี้

- **ระบายน้ำฝั่งตะวันออก** คิดเป็น 74%ของศักยภาพ (203 ลบ.ม./วินาที)
- **ระบายน้ำฝั่งตะวันตก** คิดเป็น 41%ของศักยภาพ (191 ลบ.ม./วินาที)
- ระบายผ่าน**เขื่อนเจ้าพระยา (C.13)** คิดเป็น 15%ของศักยภาพ (400 ลบ.ม./วินาที)

นอกจากนี้ **เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์** ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสัก 20 ลบ.ม./วินาที ไหลผ่าน**เขื่อนพระรามหก** 49 ลบ.ม./วินาที ก่อนไหลมาบรรจบที่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานี C.29B อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เฉลี่ย 769 ลบ.ม./วินาที

## การจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2569/70 (ทั้งประเทศ ลุ่มเจ้าพระยา)

| พื้นที่ | น้ำต้นทุน ณ 1 พ.ย.69 | แผนจัดสรรน้ำ 1 พ.ย.69 – 30 เม.ย.70 | ผลจัดสรรน้ำ | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ<br>การจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2569/70 | 43,479 | 28,009<br>สำรองน้ำต้นฤดูฝน 15,470 ล้าน ลบ.ม. | 2,295 (9%) | 25,714 (91%) |
| เจ้าพระยา<br>การจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2569/70 | 12,239 | 9,000<br>สำรองน้ำต้นฤดูฝน 4,239 ล้าน ลบ.ม. | 574 (7%) | 8,426 (93%) |

## การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2569 (แม่กลอง)

| | น้ำต้นทุน ณ 1 ก.ค.69 | (1 ก.ค.69 – 31 ธ.ค.69) | | |
|---|---|---|---|---|
| แม่กลอง<br>การจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2569 | 4,211 | 4,000<br>ความต้องการใช้น้ำ 3,999 ล้าน ลบ.ม. | 3,834 (96%) | 166 (4%) |

## การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งปี 2569/70 (11 พ.ย. 69)

| ทั้งประเทศ | ข้าวนาปรัง | พืชไร่ - พืชสวน | รวม |
|---|---|---|---|
| แผนเพาะปลูก | 9.39 | 0.82 | 10.21 |
| ผลเพาะปลูก | 0.47 | 0.09 | 0.56 |

| เจ้าพระยา | ข้าวนาปรัง | พืชไร่ - พืชสวน | รวม |
|---|---|---|---|
| แผนเพาะปลูก | 6.28 | 0.16 | 6.43 |
| ผลเพาะปลูก | 0.39 | 0.07 | 0.46 |

หน่วย : ล้านไร่


# สถานการณ์อุทกภัย ปี 2569

จากปริมาณฝนที่ตกหนักและตกสะสมในพื้นที่ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2569 เป็นต้นมา ส่งผลทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งสิ้น 63 จังหวัด ดังนี้

จังหวัดที่เข้าสู่ภาวะปกติ 60 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร อุดรธานี เลย สกลนคร หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว นครนายก จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง ตราด ลพบุรี เพชรบูรณ์ สระบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง และยะลา

จังหวัดที่ประสบอุทกภัย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี

## การช่วยเหลือเครื่องจักร-เครื่องมือฤดูฝนปี 2569

| เครื่องสูบน้ำ | เครื่องผลักดันน้ำ | เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 1,197/1,991 ชุด | 319/397 คัน | 141/3,429 หน่วย |

**รวม 1,657 หน่วย**

หมายเหตุ ผล/แผน

## ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2569/70

ระหว่างวันที่ 2 – 15 พฤศจิกายน 2569

| จำนวนครั้งประชาสัมพันธ์ | จำนวนเกษตรกรที่รับการฟังประชาสัมพันธ์ |
|---|---|
|  |  |
| 385 ครั้ง | 2,441 คน |
| สะสม 1,077 ครั้ง | สะสม 4,013 คน |

## กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือ


**โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8** ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกำจัดวัชพืช บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านสระคล้า ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ




**โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9** ดำเนินการกำจัดวัชพืชบริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแลพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมต่อการใช้งานและการสัญจรของประชาชน




**ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 11** ดำเนินการดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่คลองพระยาบรรลือ ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

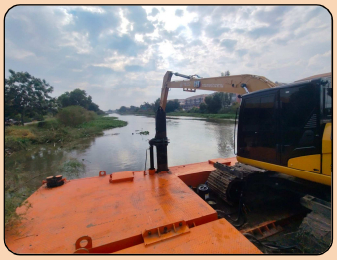**ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 15** ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 4 จุด บริเวณประตูระบายน้ำบางลึก สะพานวัดเปี๊ยะกลาง อำเภอปากพนัง และคลองคูพาย คลองท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งการระบายน้ำ
