
รายงานสถานการณ์น้ำ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2569

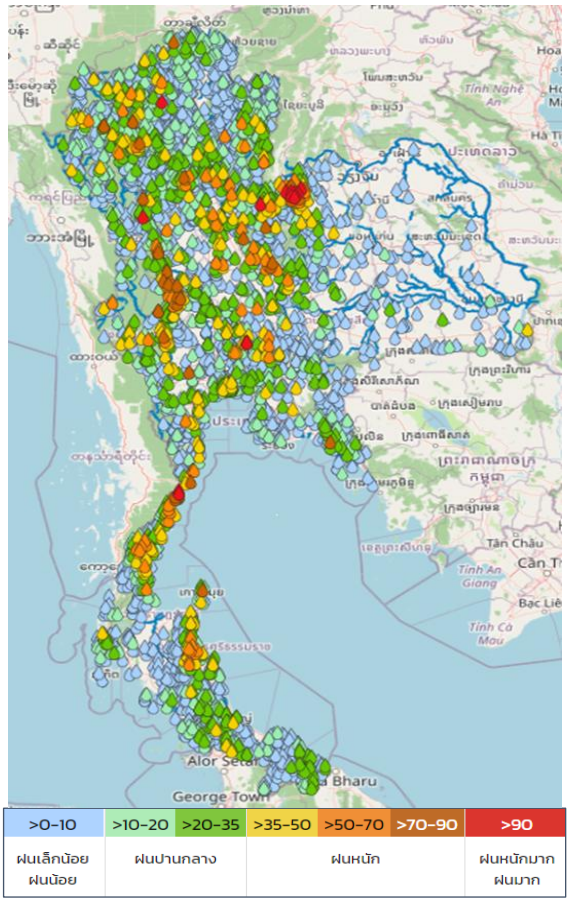


สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (เวลา 06.00 น.)

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือ และภาคกลาง

ปริมาณฝนตกสะสม 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 5 ลำดับ

อันดับ	ที่ตั้ง	ปริมาณฝน (มม.)
1	ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	188.0
2	ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย	139.9
3	ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์	124.5
4	ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย	122.5
5	ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	119.5

ปริมาณน้ำเก็บกักและใช้การ ในอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำนวน 496 แห่ง

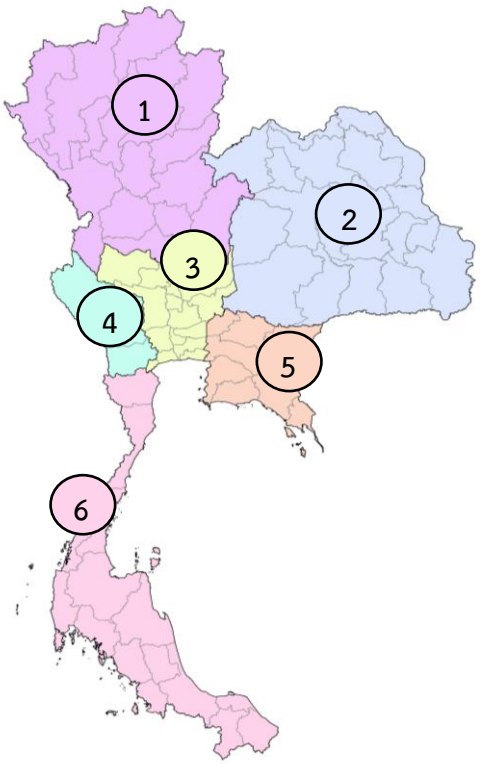


ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย. 69

ภาค	ความจุ	ปริมาณน้ำเก็บกัก	ปริมาณน้ำใช้การ
1 เหนือ	26,009	19,765 (76%)	12,929 (67%)
2 ตะวันออกเฉียงเหนือ	10,577	7,382 (70%)	5,553 (63%)
3 กลาง	1,750	1,609 (92%)	1,506 (91%)
4 ตะวันตก	26,775	26,115 (98%)	12,827 (95%)
5 ตะวันออก	2,633	2,585 (98%)	2,408 (97%)
6 ใต้	8,922	6,420 (72%)	4,656 (65%)
รวมทั้งประเทศ	76,666	63,876 (83%)	39,899 (76%)

*หมายเหตุ %น้ำใช้การเทียบกับความจุเก็บกัก

*หน่วย ล้าน ลบ.ม.

การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

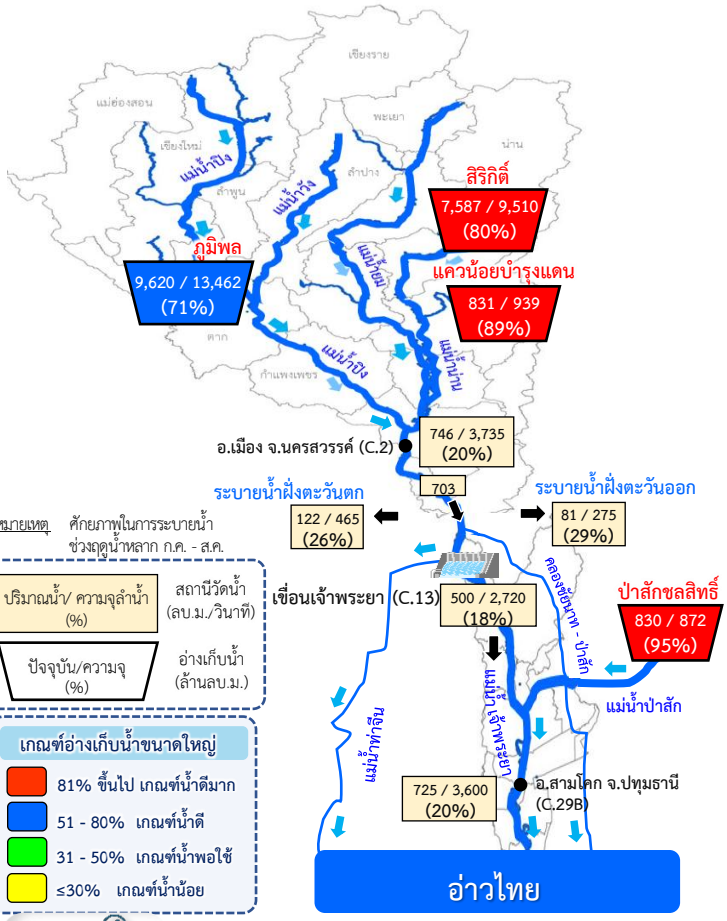

4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ความจุ 24,783 ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 18,869 ล้าน ลบ.ม. (76%)
เป็นน้ำใช้การ 12,162 ล้าน ลบ.ม. (67%)

ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ระบายจากเขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ และแควน้อยฯ ไหลมารวมกันที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีวัดน้ำ C.2 ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ **ปัจจุบัน 746 ลบ.ม./วินาที** ไหลมารวมกับปริมาณน้ำ Side flow ทำให้มี**ปริมาณน้ำในการบริหารจัดการเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 703 ลบ.ม./วินาที** กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำ ดังนี้

- **ระบายน้ำฝั่งตะวันออก** คิดเป็น 29%ของศักยภาพ (81 ลบ.ม./วินาที)
- **ระบายน้ำฝั่งตะวันตก** คิดเป็น 26%ของศักยภาพ (122 ลบ.ม./วินาที)
- ระบายผ่าน**เขื่อนเจ้าพระยา (C.13)** คิดเป็น 18%ของศักยภาพ (500 ลบ.ม./วินาที)

นอกจากนี้ **เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์** ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสัก **5 ลบ.ม./วินาที** ไหลผ่าน**เขื่อนพระรามหก 5 ลบ.ม./วินาที** ก่อนไหลมาบรรจบที่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานี C.29B อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เฉลี่ย 725 ลบ.ม./วินาที

การจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2569/70 (ทั้งประเทศ ลุ่มเจ้าพระยา)

พื้นที่	น้ำต้นทุน ณ 1 พ.ย.69	แผนจัดสรรน้ำ 1 พ.ย.69 – 30 เม.ย.70	ผลจัดสรรน้ำ	คงเหลือ
ทั้งประเทศ การจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2569/70	43,479	28,009 สำรองน้ำต้นฤดูฝน 15,470 ล้าน ลบ.ม.	1,003 (4%)	27,006 (96%)
เจ้าพระยา การจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2569/70	12,239	9,000 สำรองน้ำต้นฤดูฝน 4,239 ล้าน ลบ.ม.	268 (3%)	8,732 (97%)

การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2569 (แม่กลอง)

	น้ำต้นทุน ณ 1 ก.ค.69	(1 ก.ค.69 – 31 ธ.ค.69)		
แม่กลอง การจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2569	4,211	4,000 ความต้องการใช้น้ำ 3,999 ล้าน ลบ.ม.	3,522 (88%)	478 (12%)

การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งปี 2569/70 (4 พ.ย. 69)

ทั้งประเทศ	ข้าวนาปรัง	พืชไร่ - พืชสวน	รวม
แผนเพาะปลูก	9.39	0.82	10.21
ผลเพาะปลูก	0.09	0.01	0.10

เจ้าพระยา	ข้าวนาปรัง	พืชไร่ - พืชสวน	รวม
แผนเพาะปลูก	6.28	0.16	6.43
ผลเพาะปลูก	0.07	0.01	0.08

หน่วย : ล้านไร่


สถานการณ์อุทกภัย ปี 2569

จากปริมาณฝนที่ตกหนักและตกสะสมในพื้นที่ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2569 เป็นต้นมา ส่งผลทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งสิ้น 62 จังหวัด ดังนี้

จังหวัดที่เข้าสู่ภาวะปกติ 56 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร อุดรธานี เลย สกลนคร หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด ลพบุรี เพชรบูรณ์ สระบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และยะลา

จังหวัดที่ประสบอุทกภัย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก นครปฐม ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี

การช่วยเหลือเครื่องจักร-เครื่องมือฤดูฝนปี 2569

เครื่องสูบน้ำ	เครื่องผลักดันน้ำ	เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ
		
1,197/1,991 ชุด	319/397 คัน	141/3,429 หน่วย

รวม 1,657 หน่วย

หมายเหตุ ผล/แผน

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2569

ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2569

จำนวนครั้งประชาสัมพันธ์	จำนวนเกษตรกรที่รับการฟังประชาสัมพันธ์
	
1,515 ครั้ง	855 คน
สะสม 14,942 ครั้ง	สะสม 39,634 คน

กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ สำนักงานชลประทานที่ 12 ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณด้านเหนือประตูระบายน้ำบรมธาตุ และปากคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำมากยิ่งขึ้น




ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 15 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง บริเวณบ้านใสเนียน หมู่ที่ 2 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์อุทกภัย




ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 17 ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองน้ำเปรี้ยว ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่




ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 17 ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ Hydro Flow จำนวน 2 เครื่อง บริเวณท่อระบายน้ำปลายคลองลาน หมู่ที่ 3 บ้านใหญ่ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่
