
รายงานสถานการณ์น้ำ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569

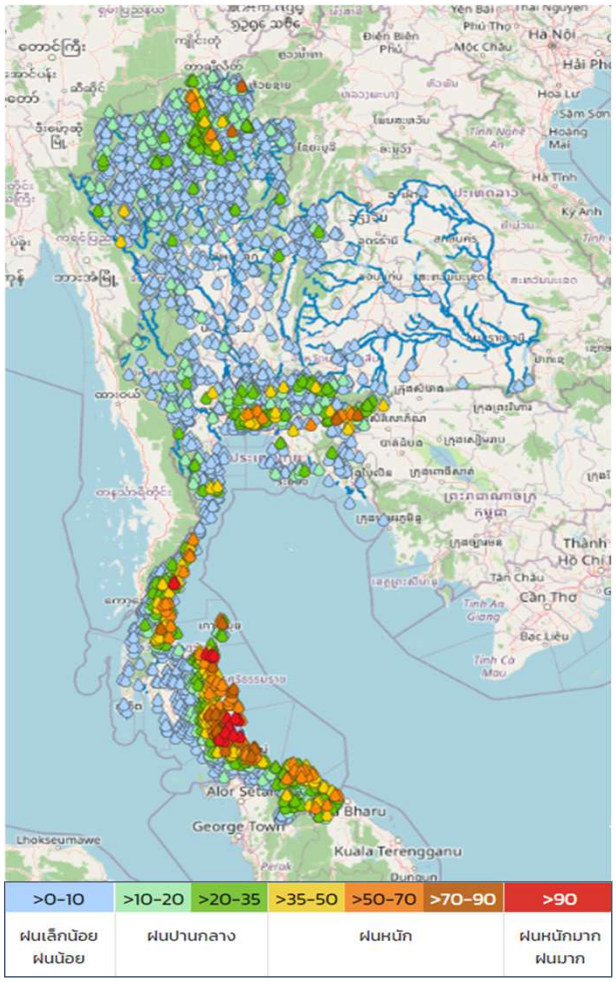


สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน (เวลา 06.00 น.)

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้เกิดลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปริมาณฝนตกสะสม 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูงสุด 5 ลำดับ

อันดับ	ที่ตั้ง	ปริมาณฝน (มม.)
1	ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง	137.0
2	ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง	137.0
3	ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช	125.5
4	ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา	123.0
5	ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง	119.0

ปริมาณน้ำเก็บกักและใช้การ ในอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำนวน 496 แห่ง

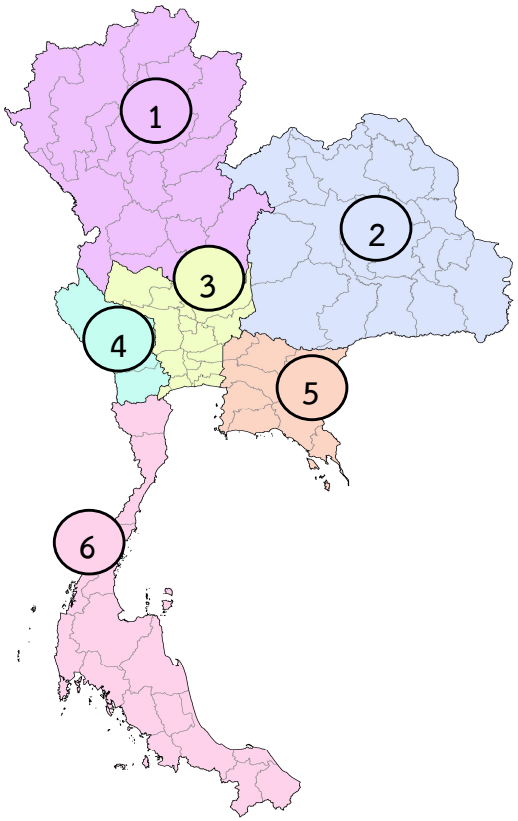


ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย. 69

ภาค	ความจุ	ปริมาณน้ำเก็บกัก	ปริมาณน้ำใช้การ
1 เหนือ	26,009	19,771 (76%)	12,936 (67%)
2 ตะวันออกเฉียงเหนือ	10,577	7,377 (70%)	5,548 (63%)
3 กลาง	1,750	1,619 (93%)	1,517 (92%)
4 ตะวันตก	26,775	26,135 (98%)	12,847 (95%)
5 ตะวันออก	2,633	2,592 (98%)	2,435 (98%)
6 ใต้	8,922	6,416 (72%)	4,651 (65%)
รวมทั้งประเทศ	76,666	63,910 (83%)	39,934 (76%)

*หมายเหตุ %น้ำใช้การเทียบกับความจุเก็บกัก

*หน่วย ล้าน ลบ.ม.

การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

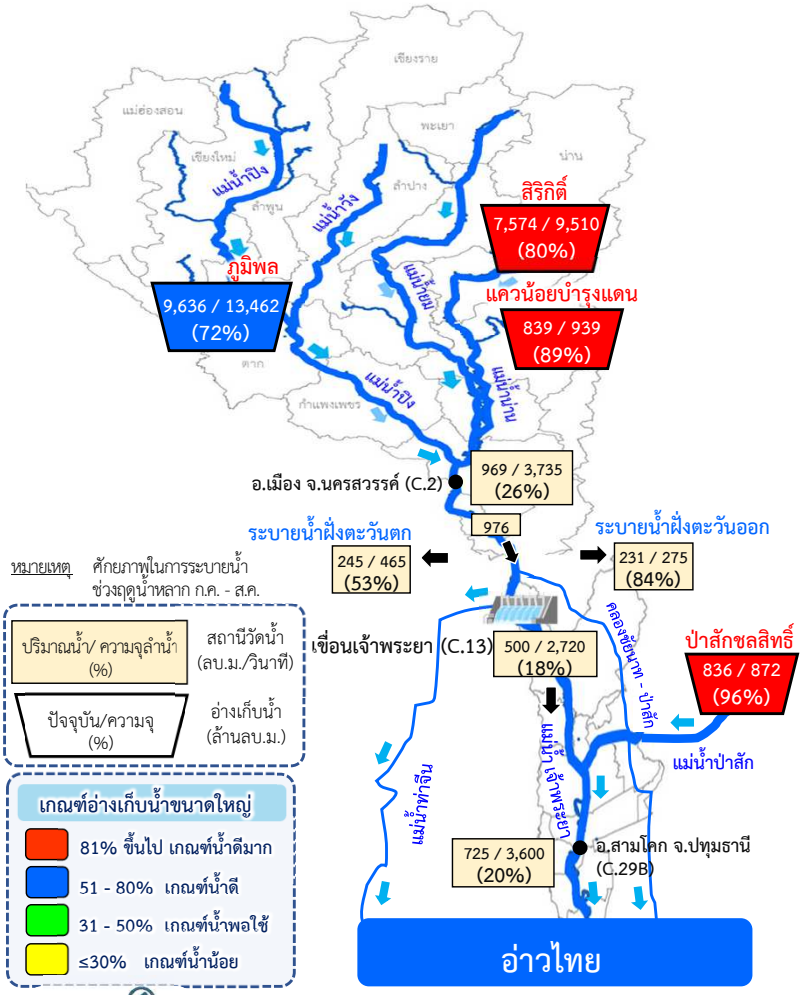

4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ความจุ 24,783 ล้าน ลบ.ม.)
ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 18,885 ล้าน ลบ.ม. (76%)
เป็นน้ำใช้การ 12,177 ล้าน ลบ.ม. (67%)

ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ระบายจากเขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ และแควน้อยฯ ไหลมารวมกันที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีวัดน้ำ C.2 ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ **ปัจจุบัน 969 ลบ.ม./วินาที** ไหลมารวมกับปริมาณน้ำ Side flow ทำให้มี**ปริมาณน้ำในการบริหารจัดการเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 976 ลบ.ม./วินาที** กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำ ดังนี้

- **ระบายน้ำฝั่งตะวันออก** คิดเป็น 84%ของศักยภาพ (231 ลบ.ม./วินาที)
- **ระบายน้ำฝั่งตะวันตก** คิดเป็น 53%ของศักยภาพ (245 ลบ.ม./วินาที)
- ระบายผ่าน**เขื่อนเจ้าพระยา (C.13)** คิดเป็น 18%ของศักยภาพ (500 ลบ.ม./วินาที)

นอกจากนี้ **เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์** ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสัก 5 ลบ.ม./วินาที ไหลผ่าน**เขื่อนพระรามหก 69 ลบ.ม./วินาที** ก่อนไหลมาบรรจบที่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานี C.29B อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เฉลี่ย 725 ลบ.ม./วินาที

การจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2569/70 (ทั้งประเทศ ลุ่มเจ้าพระยา)

พื้นที่	น้ำต้นทุน ณ 1 พ.ย.69	แผนจัดสรรน้ำ 1 พ.ย.69 – 30 เม.ย.70	ผลจัดสรรน้ำ	คงเหลือ
ทั้งประเทศ การจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2569/70	43,479	28,009 สำรองน้ำต้นฤดูฝน 15,470 ล้าน ลบ.ม.	1,151 (5%)	26,858 (95%)
เจ้าพระยา การจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2569/70	12,239	9,000 สำรองน้ำต้นฤดูฝน 4,239 ล้าน ลบ.ม.	309 (4%)	8,691 (96%)

การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2569 (แม่กลอง)

	น้ำต้นทุน ณ 1 ก.ค.69	(1 ก.ค.69 – 31 ธ.ค.69)		
แม่กลอง การจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2569	4,211	4,000 ความต้องการใช้น้ำ 3,999 ล้าน ลบ.ม.	3,554 (89%)	446 (11%)

การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งปี 2569/70 (4 พ.ย. 69)

ทั้งประเทศ	ข้าวนาปรัง	พืชไร่ - พืชสวน	รวม
แผนเพาะปลูก	9.39	0.82	10.21
ผลเพาะปลูก	0.09	0.01	0.10

เจ้าพระยา	ข้าวนาปรัง	พืชไร่ - พืชสวน	รวม
แผนเพาะปลูก	6.28	0.16	6.43
ผลเพาะปลูก	0.07	0.01	0.08

หน่วย : ล้านไร่


สถานการณ์อุทกภัย ปี 2569

จากปริมาณฝนที่ตกหนักและตกสะสมในพื้นที่ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2569 เป็นต้นมา ส่งผลทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งสิ้น 62 จังหวัด ดังนี้

จังหวัดที่เข้าสู่ภาวะปกติ 56 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร อุดรธานี เลย สกลนคร หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด ลพบุรี เพชรบูรณ์ สระบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และยะลา

จังหวัดที่ประสบอุทกภัย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก นครปฐม ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี

การช่วยเหลือเครื่องจักร-เครื่องมือฤดูฝนปี 2569

เครื่องสูบน้ำ	เครื่องผลักดันน้ำ	เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ
		
1,197/1,991 ชุด	319/397 คัน	141/3,429 หน่วย

รวม 1,657 หน่วย

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2569

ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2569

จำนวนครั้งประชาสัมพันธ์	จำนวนเกษตรกรที่รับการฟังประชาสัมพันธ์
	
1,515 ครั้ง	855 คน
สะสม 14,942 ครั้ง	สะสม 39,634 คน

หมายเหตุ ผล/แผน

กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือ

โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ เพื่อติดตามสภาพพื้นที่ ฝายบ้านโคกเบงเหนือ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม น้ำแล้ง รวมถึงการใช้น้ำในการอุปโภค และภาคการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป




โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 เร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำสารภี ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเปิดทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเตรียมความพร้อมสำหรับการระบายน้ำออกจากทุ่งสารภี




โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 ดำเนินการกำจัดวัชพืชบริเวณคลองระบายน้ำที่ 1 ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นการดูแลและบำรุงรักษาทางน้ำให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ลดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ





ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 15 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองบางตัด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเปิดทางระบายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางน้ำให้สมบูรณ์
