กรมชลประทาน

สถานการณ์ และการบริหารจัดการน้ำ

ฤดูฝน ปี 2569









28 ตุลาคม 2569


ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

1

สภาพภูมิอากาศและปริมาณฝน

ปริมาณฝนสะสม
(1 ม.ค. – 25 ต.ค. 2569)

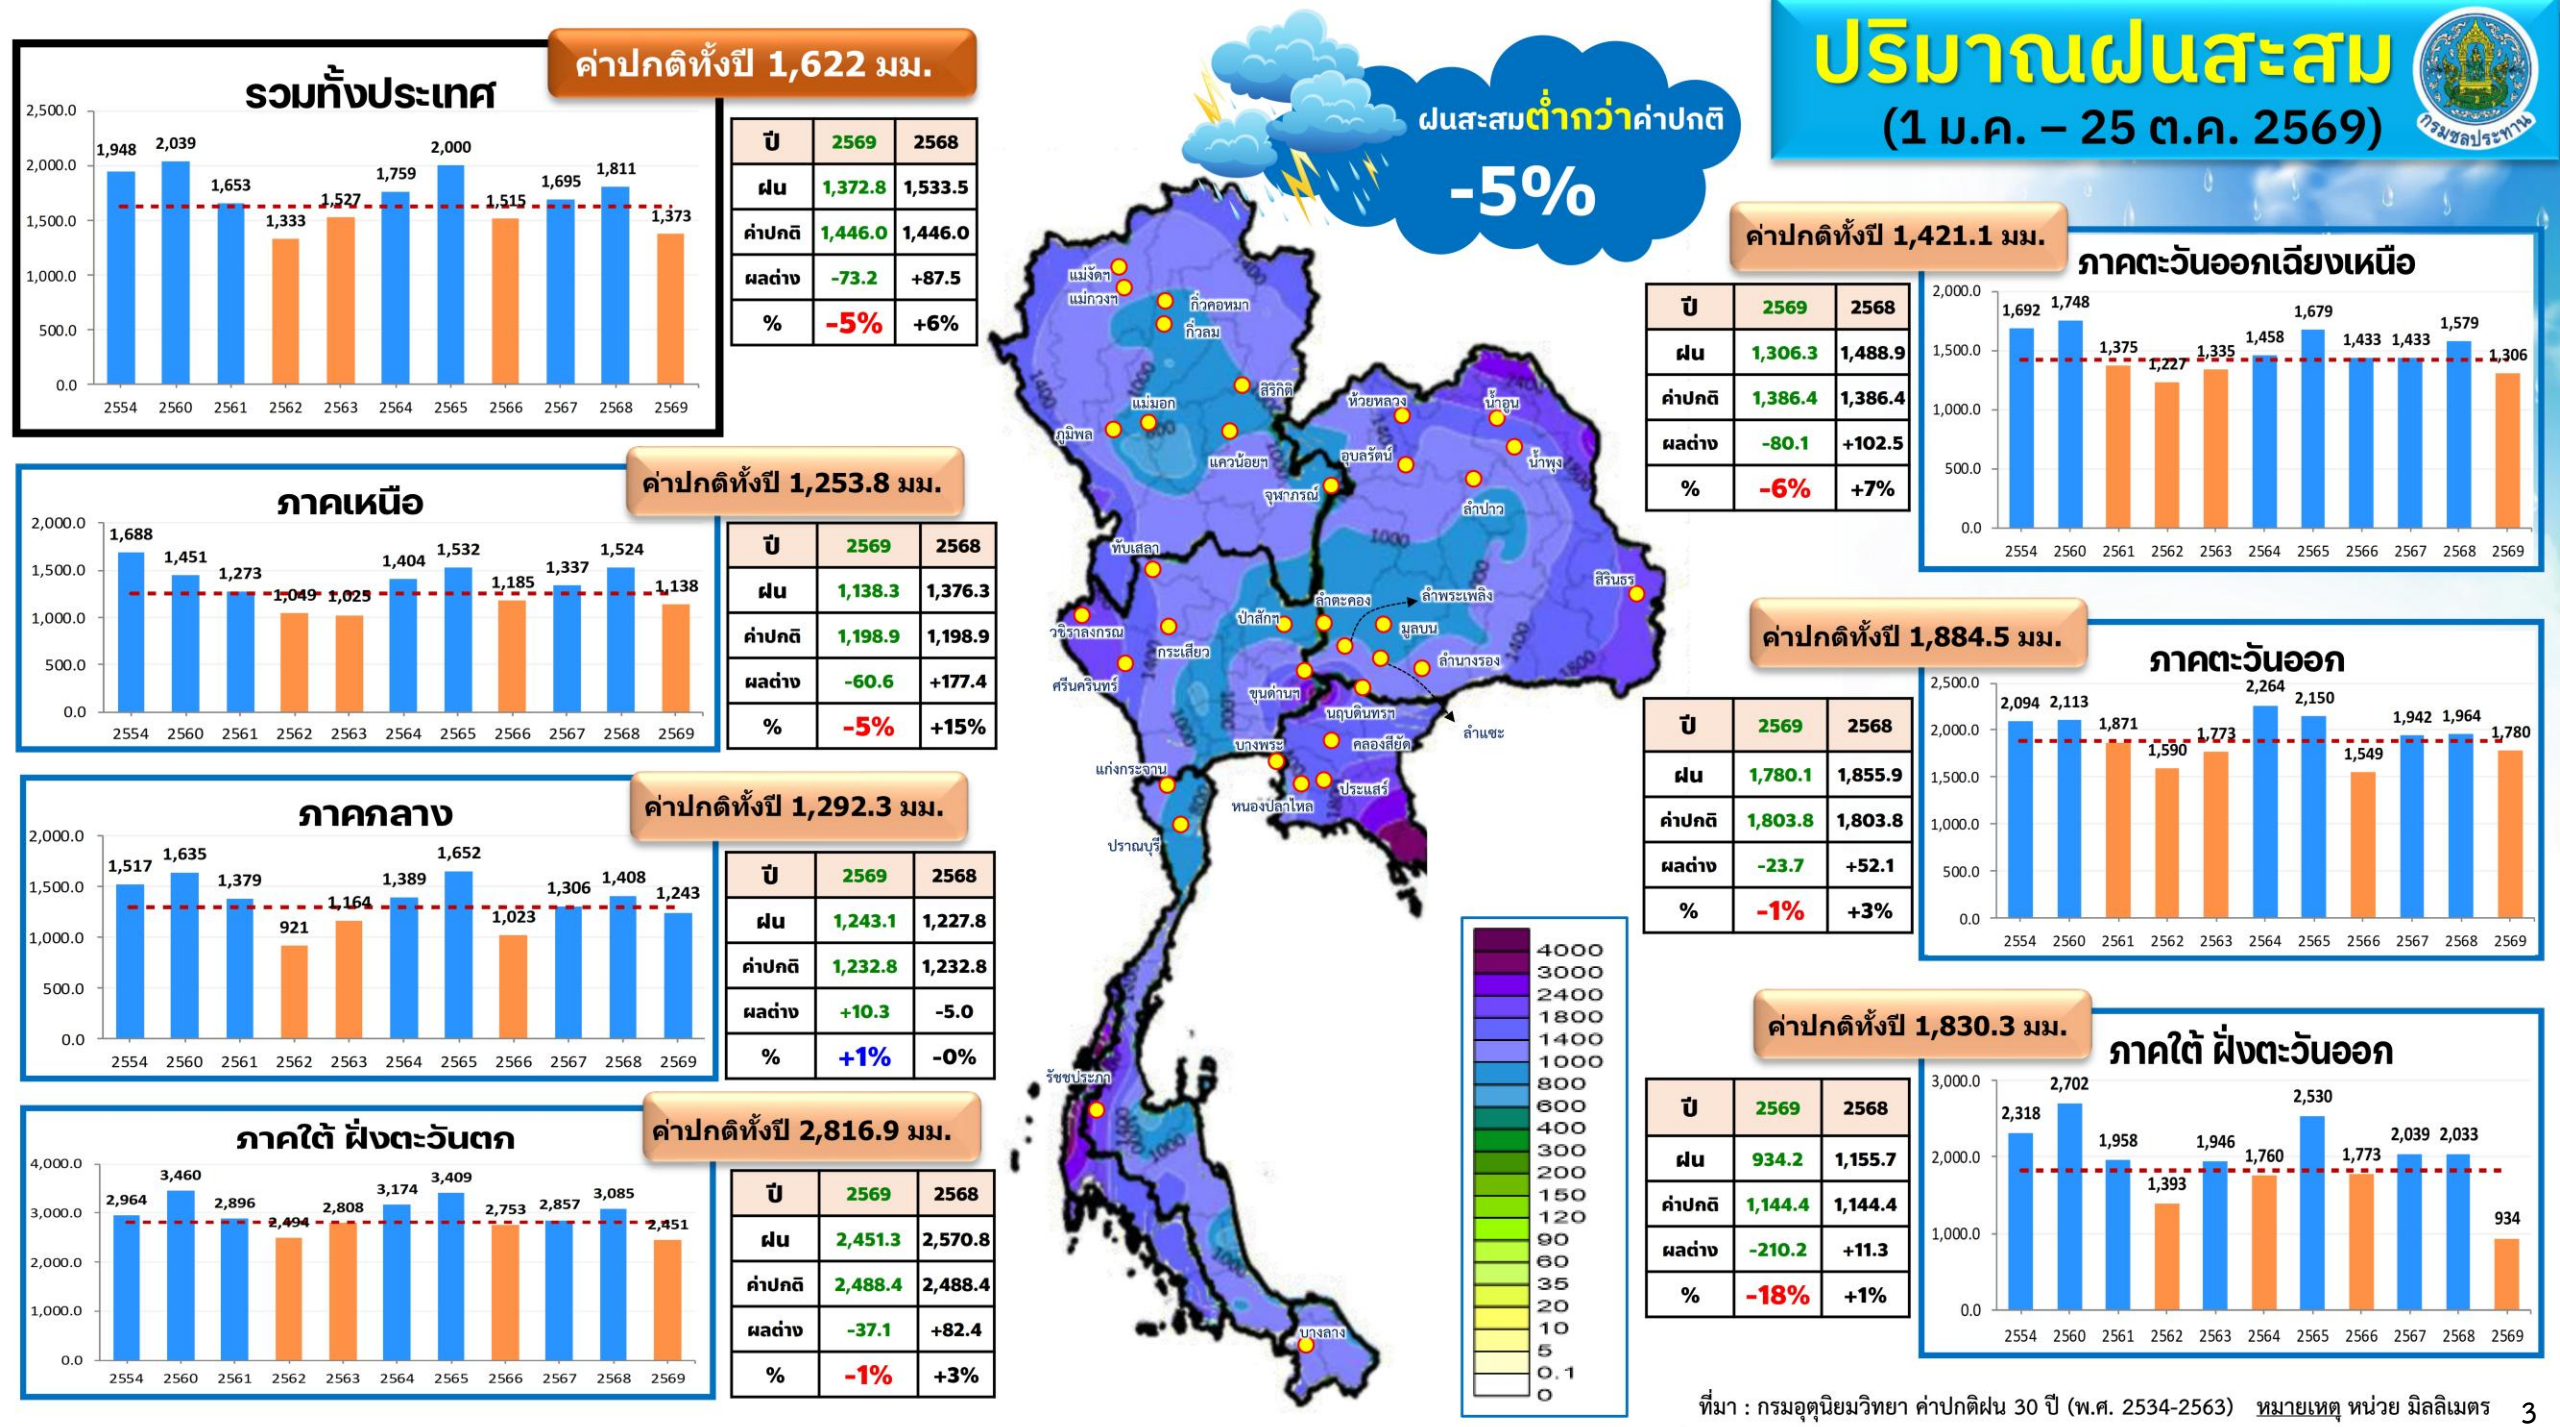

รวมทั้งประเทศ

ค่าปกติทั้งปี 1,622 มม.

ปี	2569	2568
ฝน	1,372.8	1,533.5
ค่าปกติ	1,446.0	1,446.0
ผลต่าง	-73.2	+87.5
%	-5%	+6%

ภาคเหนือ

ค่าปกติทั้งปี 1,253.8 มม.

ปี	2569	2568
ฝน	1,138.3	1,376.3
ค่าปกติ	1,198.9	1,198.9
ผลต่าง	-60.6	+177.4
%	-5%	+15%

ภาคกลาง

ค่าปกติทั้งปี 1,292.3 มม.

ปี	2569	2568
ฝน	1,243.1	1,227.8
ค่าปกติ	1,232.8	1,232.8
ผลต่าง	+10.3	-5.0
%	+1%	-0%

ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก

ค่าปกติทั้งปี 2,816.9 มม.

ปี	2569	2568
ฝน	2,451.3	2,570.8
ค่าปกติ	2,488.4	2,488.4
ผลต่าง	-37.1	+82.4
%	-1%	+3%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค่าปกติทั้งปี 1,421.1 มม.

ปี	2569	2568
ฝน	1,306.3	1,488.9
ค่าปกติ	1,386.4	1,386.4
ผลต่าง	-80.1	+102.5
%	-6%	+7%

ภาคตะวันออก

ค่าปกติทั้งปี 1,884.5 มม.

ปี	2569	2568
ฝน	1,780.1	1,855.9
ค่าปกติ	1,803.8	1,803.8
ผลต่าง	-23.7	+52.1
%	-1%	+3%

ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก


ค่าปกติทั้งปี 1,830.3 มม.

ปี	2569	2568
ฝน	934.2	1,155.7
ค่าปกติ	1,144.4	1,144.4
ผลต่าง	-210.2	+11.3
%	-18%	+1%

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา ค่าปกติฝน 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) หมายเหตุ หน่วย มิลลิเมตร

ปริมาณฝนสะสมปี 2569

ปริมาณฝนสะสม

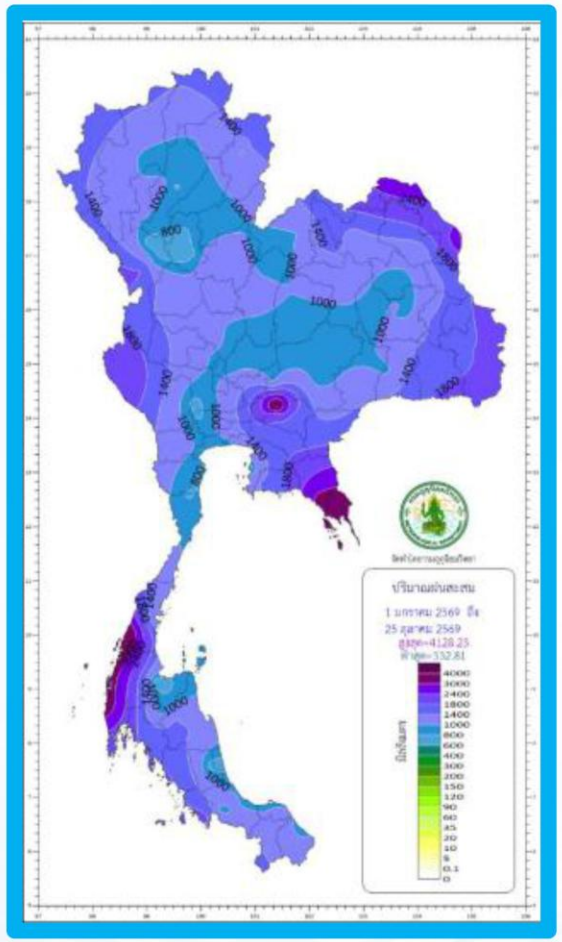


ปริมาณฝนปี 2569 ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 25 ต.ค. 69

ปริมาณฝน 1,372.8 มม.

ต่ำกว่าค่าปกติ -73.2 มม. คิดเป็น **-5%**

ภาค	ปริมาณฝนเปรียบเทียบค่าปกติ (1 ม.ค.-ปัจจุบัน)			
	ปริมาณฝน (มม.)	ค่าปกติ (มม.)	ผลต่างจากค่าปกติ (มม.)	ผลต่างจากค่าปกติ (ร้อยละ)
เหนือ	1,138.3	1,198.9	-60.6	-5%
ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,306.3	1,386.4	-80.1	-6%
กลาง	1,243.1	1,232.8	+10.3	+1%
ตะวันออก	1,780.1	1,803.8	-23.7	-1%
ใต้ฝั่งตะวันออก	934.2	1,144.4	-210.2	-18%
ใต้ฝั่งตะวันตก	2,451.3	2,488.4	-37.1	-1%
ทั้งประเทศ	1,372.8	1,466.0	-73.2	-5%


สูง – ต่ำกว่าค่าปกติ (%)

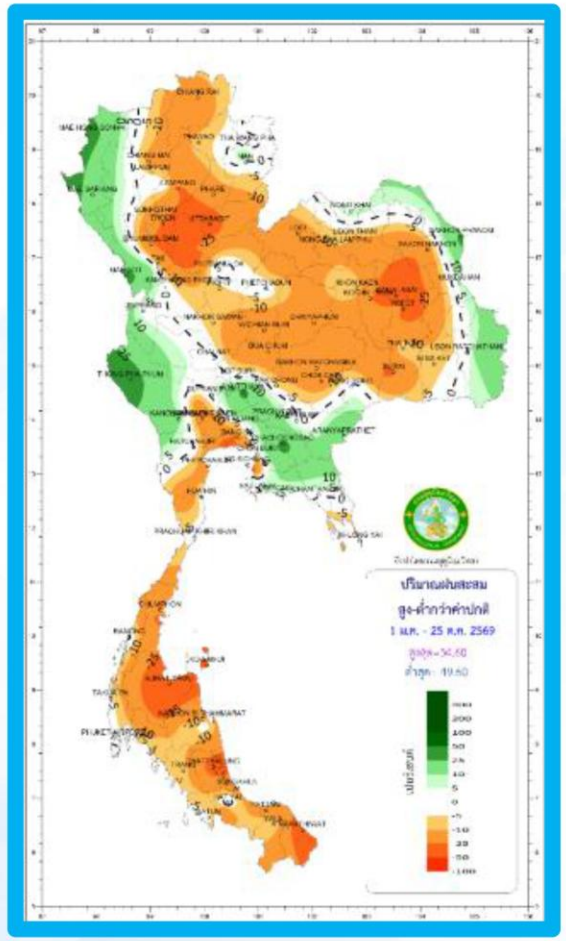


ค่าปกติ : ค่าเฉลี่ย 30 ปี พ.ศ. 2534 - 2563
ที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา

สภาพภูมิอากาศ

วันที่ 28 ตุลาคม 2569

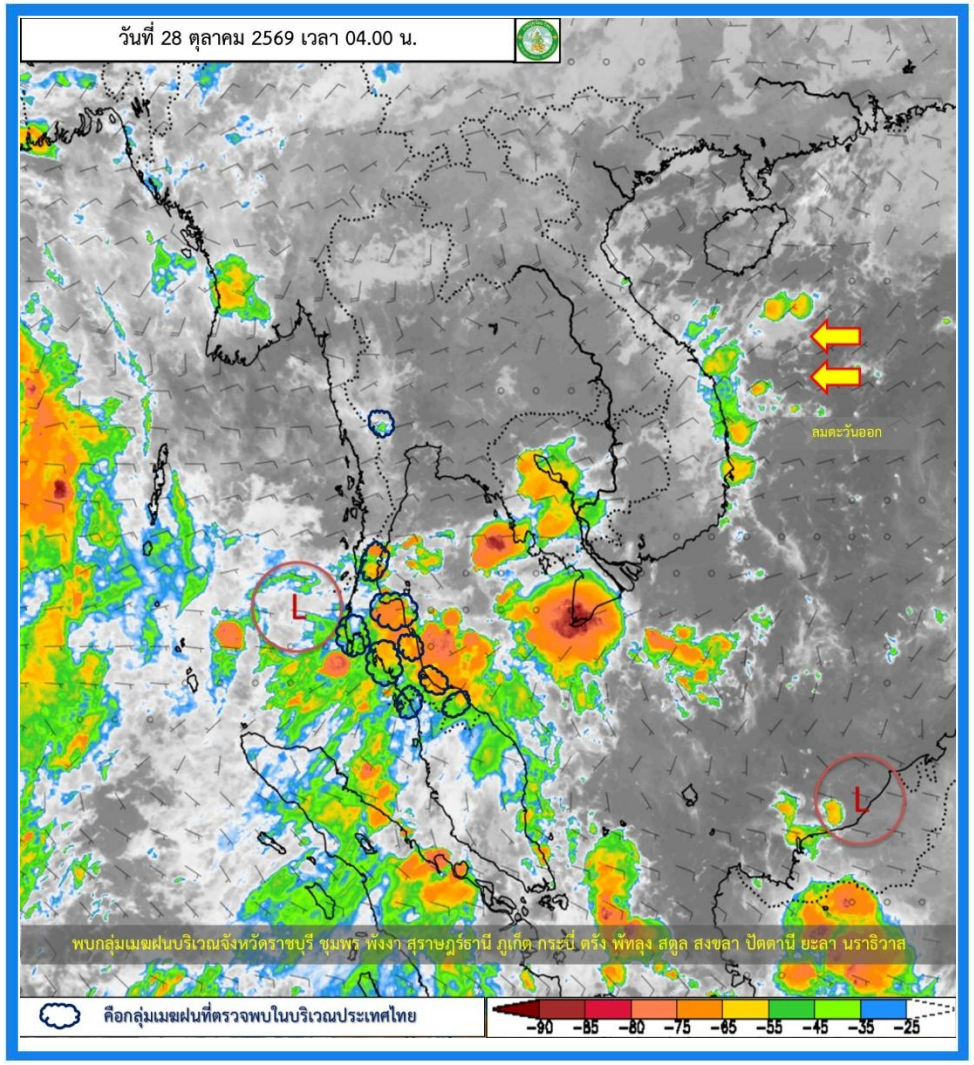

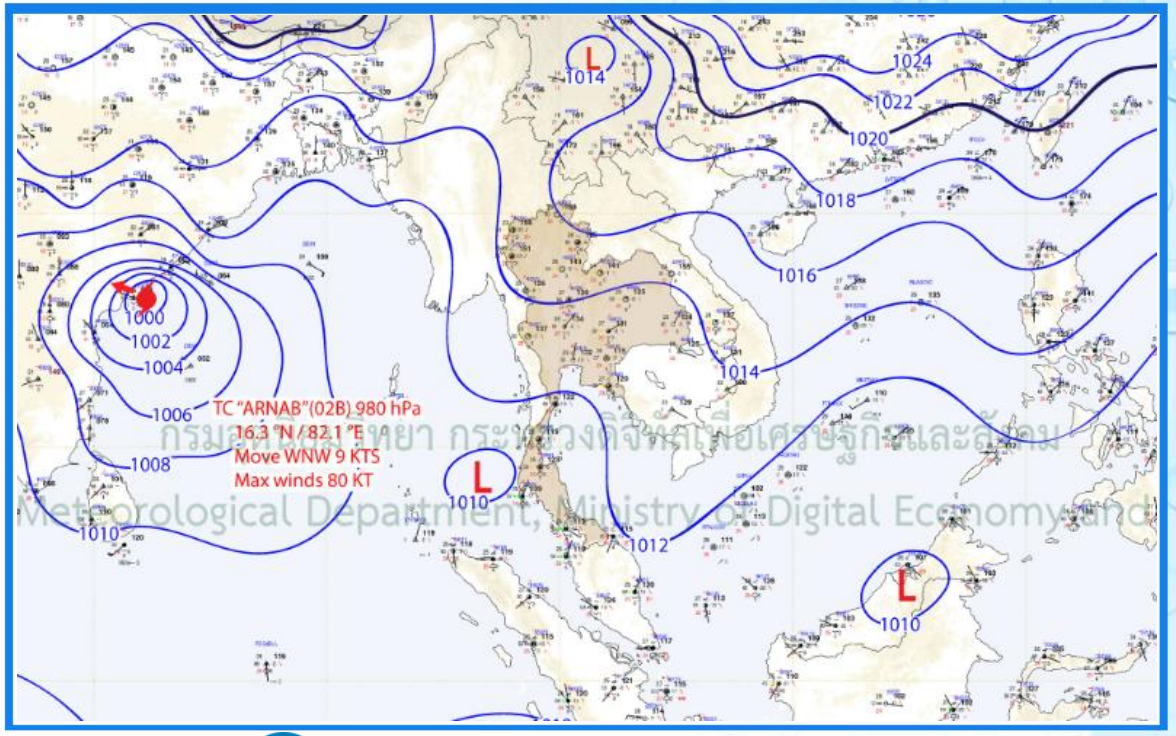


พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทย และอ่าวไทย ในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะบริเวณภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

ปริมาณฝน 24 ชั่วโมงย้อนหลัง

วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2569

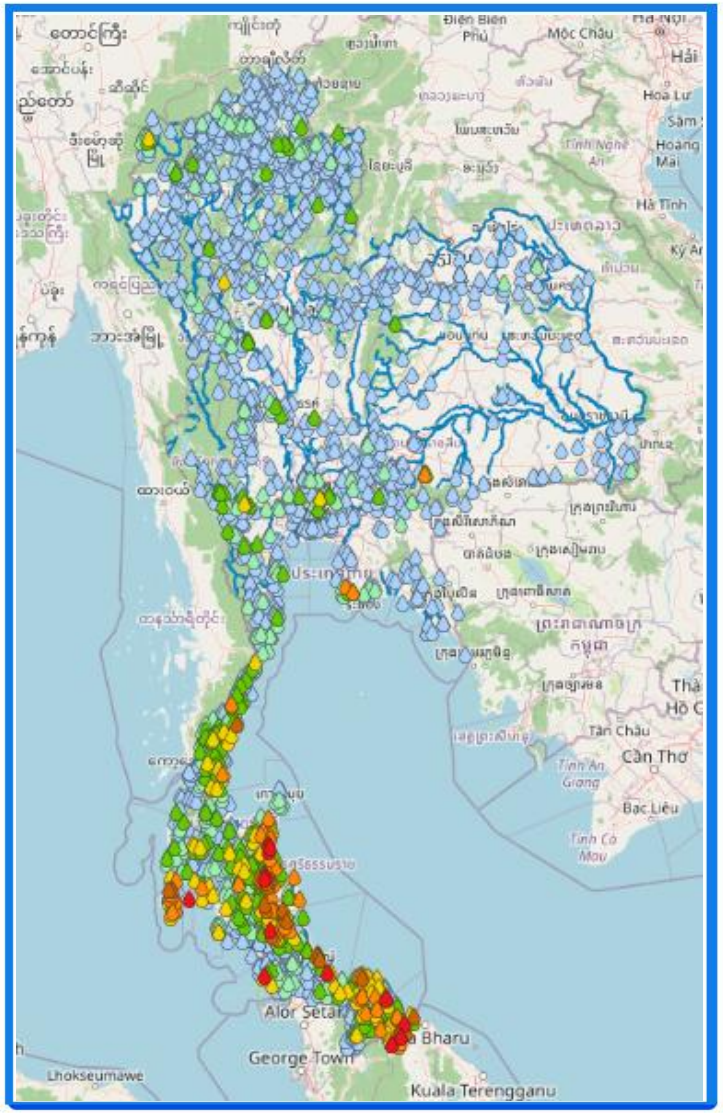

สถานี	ตำบล อำเภอ จังหวัด	เวลา	ฝนสะสม (มม.)
บ้านไสเหรียง	ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช	05:00 น.	139.5
บ้านคันเบ็ด	ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช	05:00 น.	138.5
จะนะ	ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา	06:00 น.	119.8
บ้านคลองบอน	ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา	05:00 น.	119
บ้านนาวง	ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง	05:00 น.	118
ทต.แว้ง	ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส	06:00 น.	103.2
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์	ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช	06:00 น.	100.2
บ้านต้นเนียง	ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช	05:00 น.	99
บ้านไอปาโจ	ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส	05:00 น.	98.5
โรงเรียนบ้านแว้ง	ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส	06:00 น.	95


>0-10	>10-20	>20-35	>35-50	>50-70	>70-90	>90
ฝนเล็กน้อย ฝนน้อย	ฝนปานกลาง		ฝนหนัก			ฝนหนักมาก ฝนมาก

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา


ที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

พยากรณ์ฝนสะสม จากแบบจำลอง WRF


28 ต.ค. 69

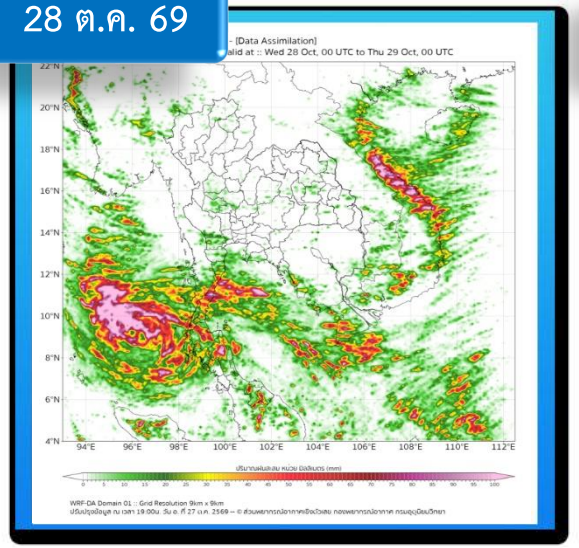


29 ต.ค. 69

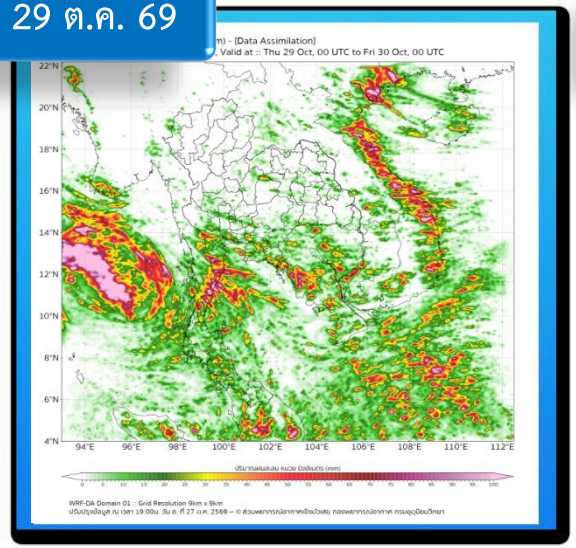


30 ต.ค. 69

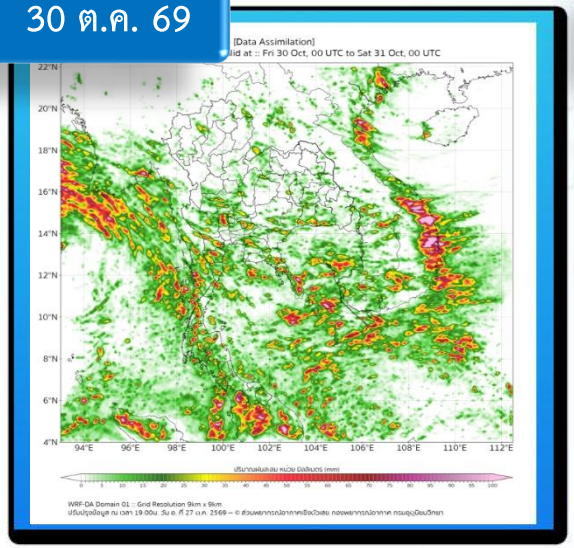


31 ต.ค. 69

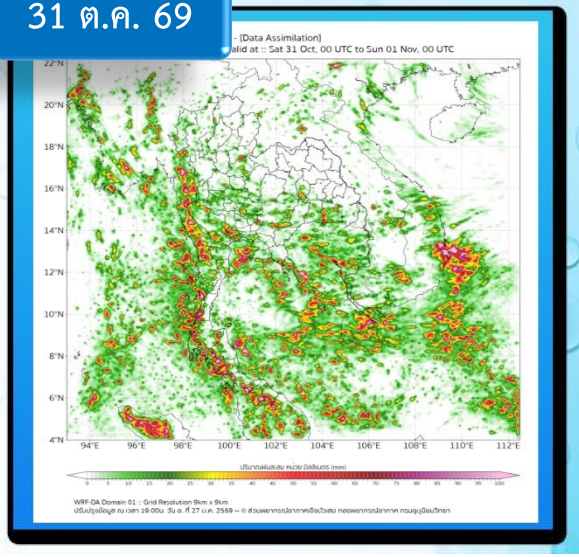


1 พ.ย. 69

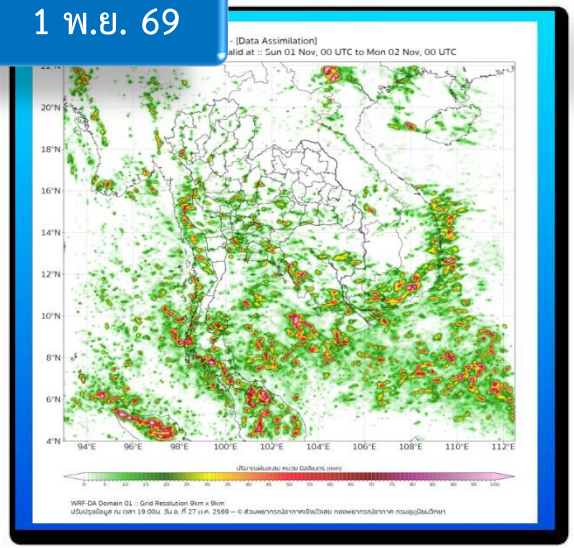

2 พ.ย. 69

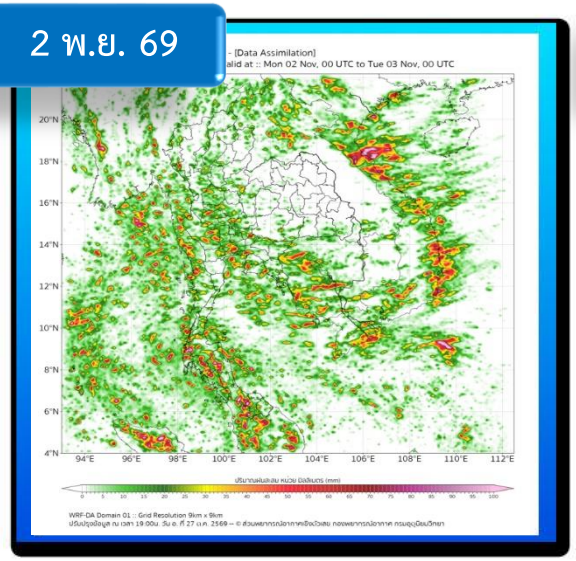

3 พ.ย. 69

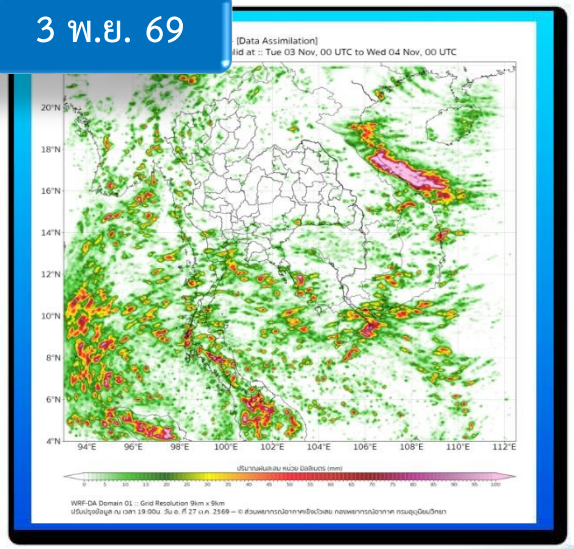

ช่วงวันที่ 28 ต.ค. – 3 พ.ย. 69 ภาคใต้เริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ทั้งสองฝั่ง ทั้งนี้เนื่องจากมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้

ช่วงวันที่ 28 – 29 ต.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนบางพื้นที่ โดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่มีลมฝ่ายตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยปกคลุมประเทศไทยตอนบน


วันที่ 30 - 31 ต.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก





ช่วงวันที่ 1 - 3 พ.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง ทั้งนี้เนื่องจากมีลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน

หมายเหตุ : ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา

ปริมาณฝนคาดการณ์ และผลต่างจากค่าปกติเดือนตุลาคม 2569 – มีนาคม 2570

ปริมาณฝนรวม (มม.)






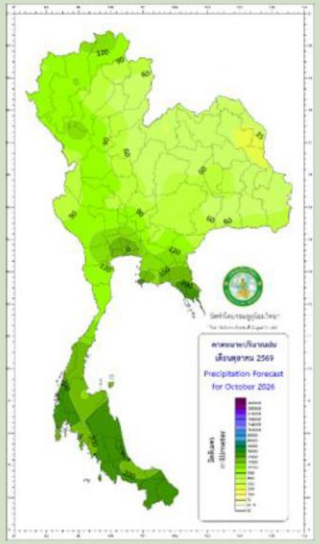


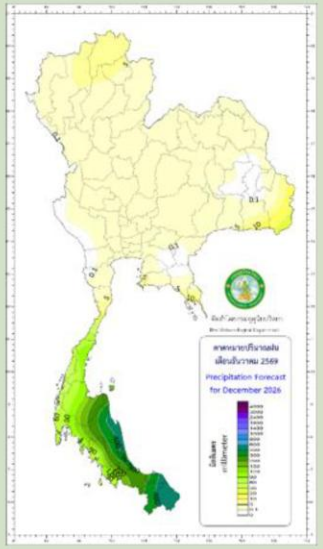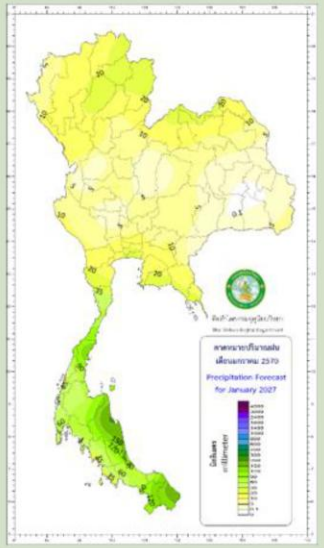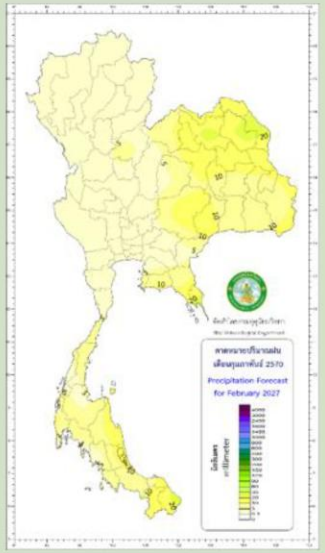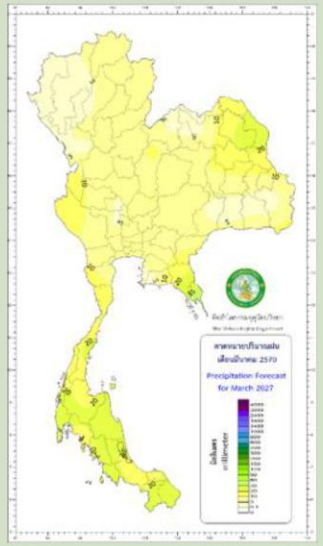ต.ค.69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70
พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย จะมีฝนรวม**น้อยกว่า**ค่าปกติ	พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย จะมีฝนรวม**น้อยกว่า**ค่าปกติ	พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย จะมีฝนรวม**ใกล้เคียง**ถึง**น้อยกว่า**ค่าปกติ	พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะมีฝน **ใกล้เคียง**ถึง**มากกว่า**ค่าปกติ เว้นภาคใต้ตอนล่างจะมีปริมาณฝน**น้อยกว่า**ค่าปกติ	พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะมีฝน **ใกล้เคียง**ถึง**น้อยกว่า**ค่าปกติ เว้นภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้จะมีปริมาณฝน**น้อยกว่า**ค่าปกติ	พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย จะมีฝนรวม**น้อยกว่า**ค่าปกติ

สูง-ต่ำกว่าค่าปกติ(%)

คาดหมายปริมาณฝนเฉลี่ย

ที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา
ข้อมูลผลการคาดการณ์ ณ วันที่ 25 ก.ย. 69

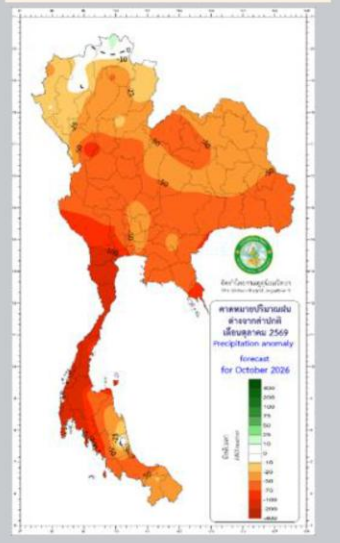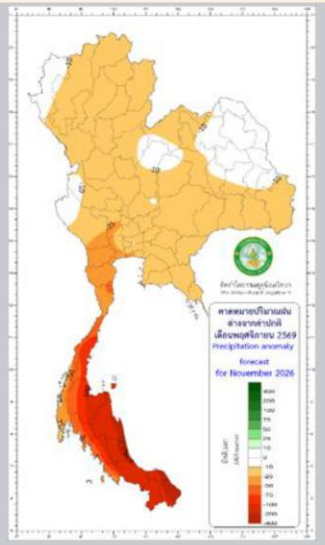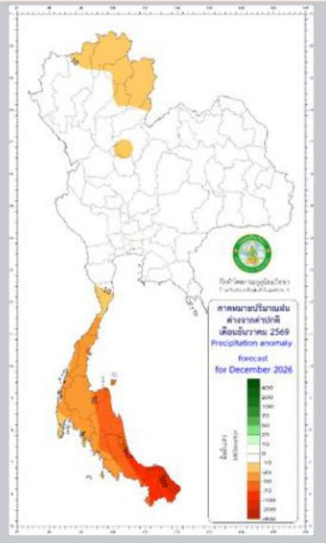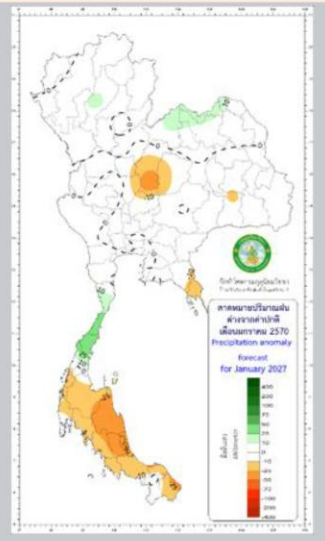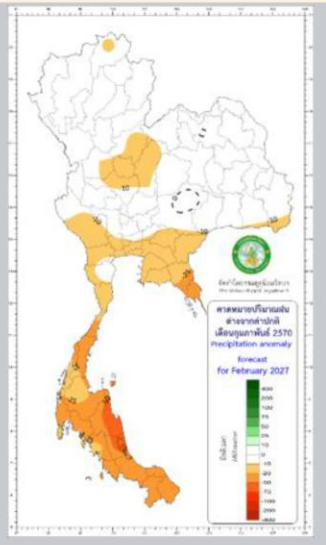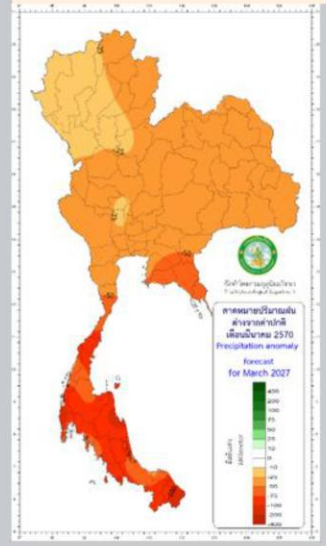






2 สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ และสถานการณ์น้ำท่า

ปริมาณน้ำเก็บกักอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

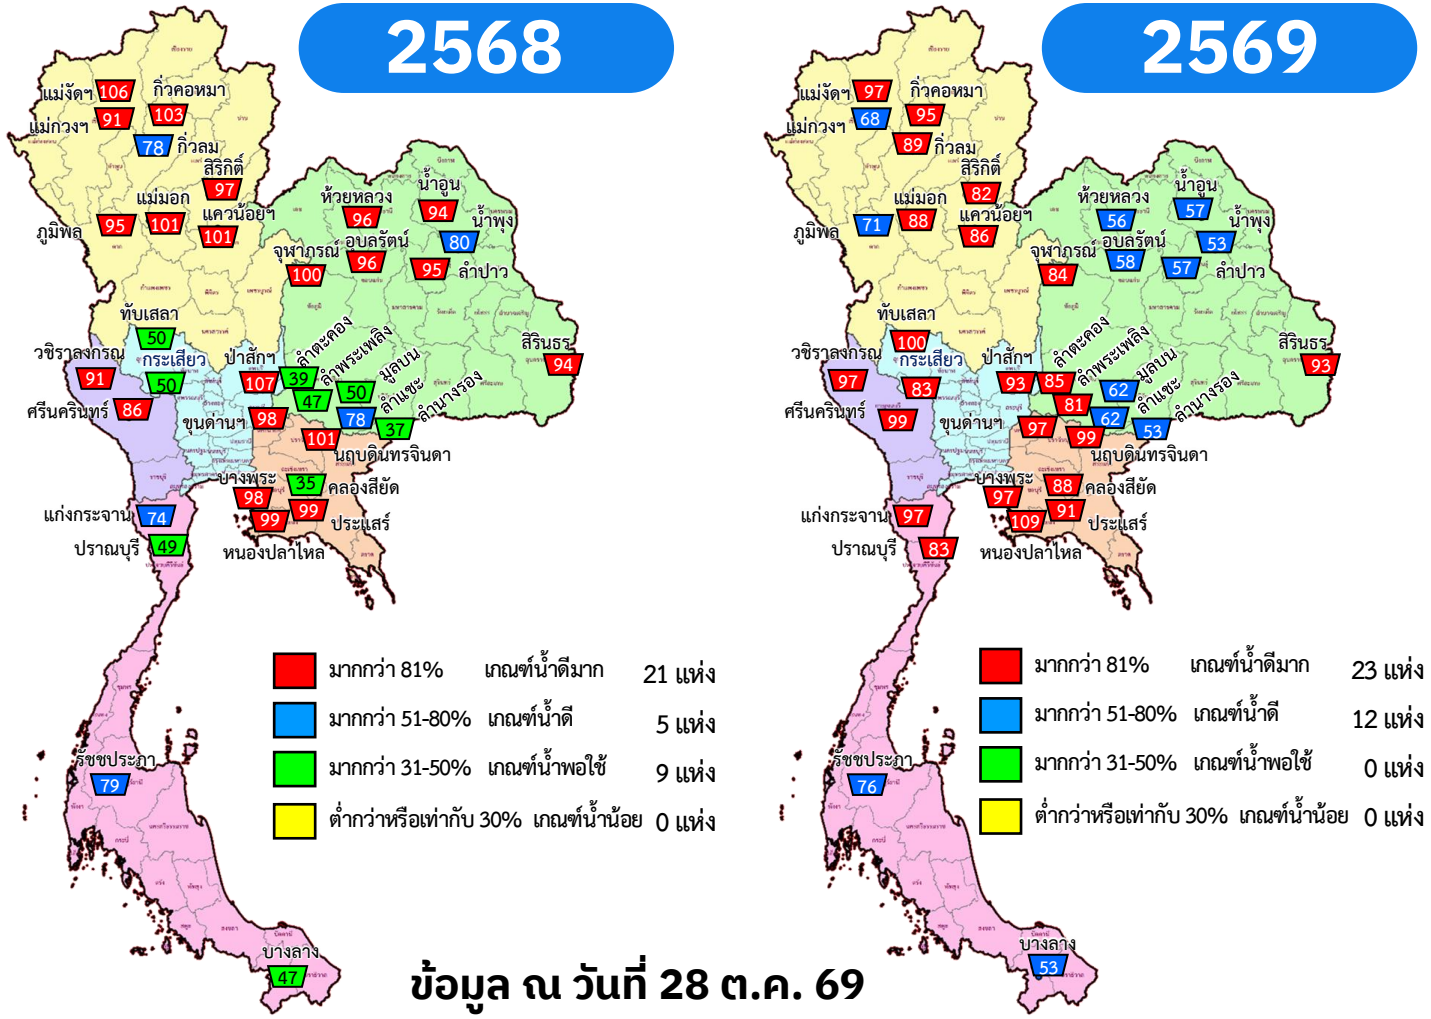


ข้อมูล ณ วันที่ 28 ต.ค. 69

ปี พ.ศ.	ความจุ (ล้าน สบ.ม.)	น้ำเก็บกัก (ล้าน สบ.ม.)	%	น้ำใช้การ (ล้าน สบ.ม.)	%	ปริมาณน้ำเก็บกัก มาก / น้อย
2569	70,838	59,452	84	35,902	76	น้อยกว่าปีที่แล้ว 3,421
2568	70,926	62,873	89	39,336	83	

ภาค อ่างเก็บน้ำเขื่อน	ความจุ ที่ รนส.	ความจุ ที่ รนก.	ความจุน้ำ ใช้การ	ปริมาณน้ำวันนี้ (หน่วย ล้าน ลบ.ม.) ปี 2568 เก็บกัก	%	ปี 2569 เก็บกัก	%	ใช้การ	%	ปริมาณน้ำ ไหลลง วันนี้	ปริมาณน้ำ ระบาย วันนี้
ภาคเหนือ											
ภูมิพล*	13,462	13,462	9,662	12,755	95	9,578	71	5,778	60	16.06	5.00
สิริกิติ์*	10,508	9,510	6,660	9,230	97	7,760	82	4,910	74	11.36	12.94
แม่งัดสมบูรณ์ชล	323	265	253	280	106	257	97	245	97	0.79	0.13
แม่กวงอุดมธารา	295	263	249	239	91	180	68	166	67	0.52	0.39
กิ่วลม	106	106	103	83	78	95	89	91	89	1.91	1.75
กิ่วคอหมา	209	170	164	175	103	162	95	156	95	0.39	0.39
แควน้อยบำรุงแดน	1,080	939	896	947	101	808	86	765	85	1.92	0.86
แม่มอก	110	110	94	111	101	97	88	81	86	0.36	0.50
รวมภาคเหนือ	26,093	24,825	18,080	23,821	96	18,936	76	12,192	67	33.32	21.97
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ											
ห้วยหลวง	136	136	129	130	96	76	56	69	53	0.14	0.51
น้ำอูน	780	520	475	489	94	298	57	253	53	0.78	1.63
น้ำพุง*	200	165	156	132	80	88	53	79	51	0.07	0.00
จุฬาภรณ์*	181	164	127	164	100	139	84	101	80	0.12	0.00
อุบลรัตน์*	4,640	2,431	1,849	2,341	96	1,416	58	834	45	0.00	4.09
ลำปาว	2,450	1,980	1,880	1,884	95	1,137	57	1,037	55	1.33	4.58
ลำตะคอง	445	314	292	124	39	268	85	245	84	1.16	0.35
ลำพระเพลิง	242	155	154	72	47	125	81	124	81	0.20	0.50
มูลบน	350	141	134	71	50	88	62	81	60	0.43	0.69
ลำแชะ	325	275	268	214	78	171	62	164	61	0.31	1.24
ลำนางรอง	197	121	118	45	37	64	53	61	51	0.18	0.00
สิรินธร*	1,966	1,966	1,135	1,851	94	1,829	93	997	88	0.00	7.01
รวมภาค ตอน.	9,702	8,368	6,716	7,517	90	5,698	68	4,046	60	4.72	20.59
ภาคกลาง											
ป่าสักชลสิทธิ์	1,036	872	857	936	107	813	93	799	93	4.39	0.87
ทับเสลา	190	160	143	80	50	161	100	144	100	2.27	0.11
กระเสียว	390	299	259	149	50	247	83	207	80	2.56	0.63
รวมภาคกลาง	1,616	1,331	1,259	1,164	87	1,221	92	1,149	91	9.22	1.61
ภาคตะวันตก											
ศรีนครินทร์*	18,770	17,745	7,480	15,228	86	17,499	99	7,234	97	29.17	39.68
วชิราลงกรณ*	11,000	8,860	5,848	8,072	91	8,598	97	5,586	96	12.28	15.07
รวมภาคตะวันตก	29,770	26,605	13,328	23,300	88	26,097	98	12,820	96	41.45	54.75
ภาคตะวันออก											
ขุนด่านปราการชล	225	224	219	218	98	218	97	213	97	0.84	1.28
คลองสียัด	450	420	390	147	35	371	88	341	87	1.15	0.01
บางพระ	127	117	105	115	98	113	97	101	96	0.62	0.64
หนองปลาไหล	206	164	150	162	99	179	109	166	110	1.72	2.44
ประแสร์	322	295	275	291	99	268	91	248	90	0.17	0.44
นฤบดินทรจินดา	338	295	280	298	101	291	99	277	99	0.70	0.09
รวมภาคตะวันออก	1,652	1,514	1,420	1,232	81	1,439	95	1,345	95	5.19	4.89
ภาคใต้											
แก่งกระจาน	900	710	645	522	74	686	97	621	96	4.23	6.91
ปราณบุรี	490	391	373	193	49	326	83	308	83	1.90	0.71
รัชชประภา*	6,144	5,639	4,287	4,445	79	4,278	76	2,926	68	6.62	6.24
บางลาง*	1,590	1,454	1,178	678	47	770	53	494	42	4.90	4.04
รวมภาคใต้	9,124	8,194	6,484	5,839	71	6,060	74	4,350	67	17.65	17.91
รวมทั้งประเทศ	77,957	70,838	47,287	62,873	89	59,452	84	35,902	76	111.55	121.72

ติดตามสถานการณ์น้ำตามเกณฑ์เก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำ

2569

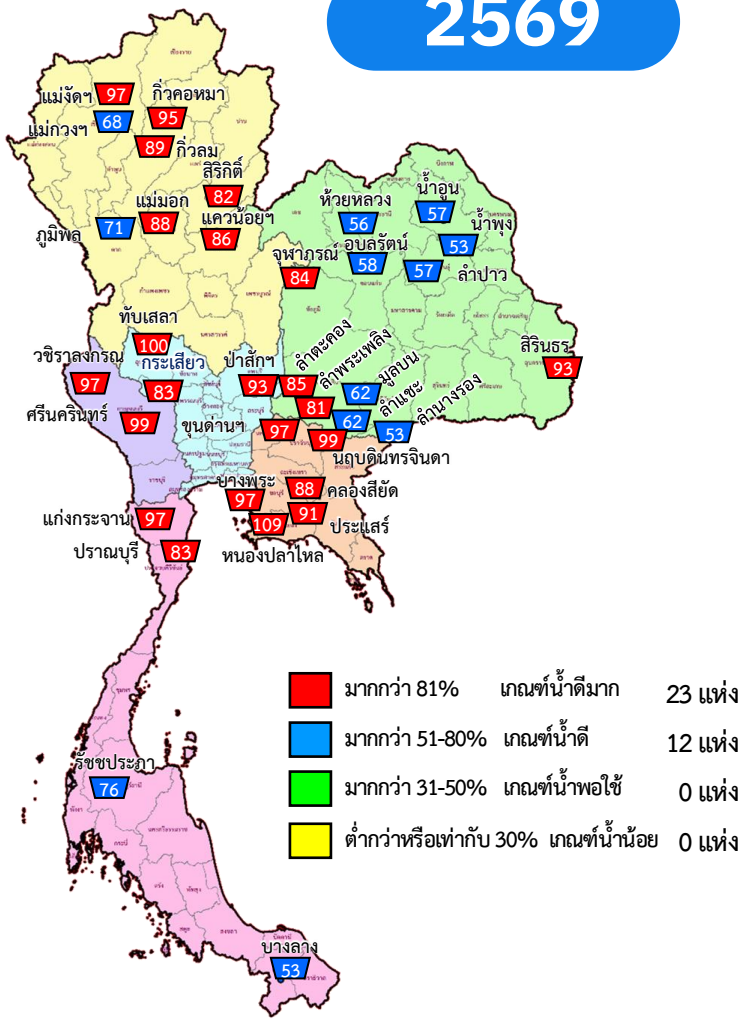

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ต.ค. 69

สูงกว่า URC


4 แห่ง ได้แก่
ทับเสลา บางพระ
หนองปลาไหล
นฤบดินทรจินดา

ต่ำกว่า LRC

- แห่ง

ลำดับ	อ่างเก็บน้ำเขื่อน	ความจุที่ รนส. (ล้าน ม.³)	ความจุที่ รนก. (ล้าน ม.³)	ณ วันนี้ ปี2569 ปริมาตร (ล้าน ม.³)	ณ วันนี้ ปี2569 % รนก.	ไหลลงวันนี้ (ล้าน ม.³)	ระบายวันนี้ (ล้าน ม.³)	ปริมาณน้ำเก็บกัก +สูง /- ต่ำ กว่า Upper Rule Curve (URC) (ล้าน ม.³)	ปริมาณน้ำเก็บกัก +สูง /- ต่ำ กว่า Lower Rule Curve (LRC) (ล้าน ม.³)
1	ภูมิพล*	13,462	13,462	9,578	71	16.06	5.00	-2,833.61	1,435.90
2	สิริกิติ์*	10,508	9,510	7,760	82	11.36	12.94	-1,217.14	1,200.95
3	แม่งัดสมบูรณ์ชล	323	265	257	97	0.79	0.13	-2.95	128.76
4	แม่กวงอุดมธารา	295	263	180	68	0.52	0.39	-71.86	65.46
5	กิ่วลม	106	106	95	89	1.91	1.75	-2.90	25.81
6	กิ่วคอหมา	209	170	162	95	0.39	0.39	-6.53	74.94
7	แควน้อยบำรุงแดน	1,080	939	808	86	1.92	0.86	-116.05	320.77
8	แม่มอก	110	110	97	88	0.36	0.50	-11.91	38.93
9	ห้วยหลวง	136	136	76	56	0.14	0.51	-59.56	34.26
10	น้ำอูน	780	520	298	57	0.78	1.63	-218.19	75.59
11	น้ำพุง*	200	165	88	53	0.07	0.00	-71.52	3.43
12	จุฬาภรณ์*	181	164	139	84	0.12	0.00	-22.17	20.45
13	อุบลรัตน์*	2,431	2,431	1,416	58	0.00	4.09	-725.75	276.29
14	ลำปาว	2,450	1,980	1,137	57	1.33	4.58	-826.83	399.04
15	ลำตะคอง	445	314	268	85	1.16	0.35	-22.66	170.76
16	ลำพระเพลิง	242	155	125	81	0.20	0.50	-16.09	73.49
17	มูลบน	350	141	88	62	0.43	0.69	-38.51	50.29
18	ลำแชะ	325	275	171	62	0.31	1.24	-83.98	50.19
19	ลำนางรอง	197	121	64	53	0.18	0.00	-43.31	39.15
20	สิรินธร*	1,966	1,966	1,829	93	0.00	7.01	-120.74	276.05
21	ป่าสักชลสิทธิ์	1,036	872	813	93	4.39	0.87	-32.99	550.74
22	ทับเสลา	190	160	161	100	2.27	0.11	9.98	97.08
23	กระเสียว	390	299	247	83	2.56	0.63	-41.04	140.92
24	ศรีนครินทร์*	18,770	17,745	17,499	99	29.17	39.68	-171.07	4,107.49
25	วชิราลงกรณ*	11,000	8,860	8,598	97	12.28	15.07	-250.74	2,539.21
26	ขุนด่านปราการชล	225	224	218	97	0.84	1.28	-4.08	105.21
27	คลองสียัด	440	420	371	88	1.15	0.01	-37.24	171.59
28	บางพระ	127	117	113	97	0.62	0.64	1.23	89.07
29	หนองปลาไหล	206	164	179	109	1.72	2.44	17.00	119.94
30	ประแสร์	322	295	268	91	0.17	0.44	-27.20	150.39
31	นฤบดินทรจินดา	332	295	291	99	0.70	0.09	2.56	142.22
32	แก่งกระจาน	900	710	686	97	4.23	6.91	-6.40	445.96
33	ปราณบุรี	490	391	326	83	1.90	0.71	-48.48	172.25
34	รัชชประภา*	6,144	5,639	4,278	76	6.62	6.24	-1,360.96	699.19
35	บางลาง*	1,590	1,454	770	53	4.90	4.04	-232.68	65.68
								จำนวน 4 แห่ง	จำนวน 0 แห่ง

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง วันที่ 28 ตุลาคม 2569

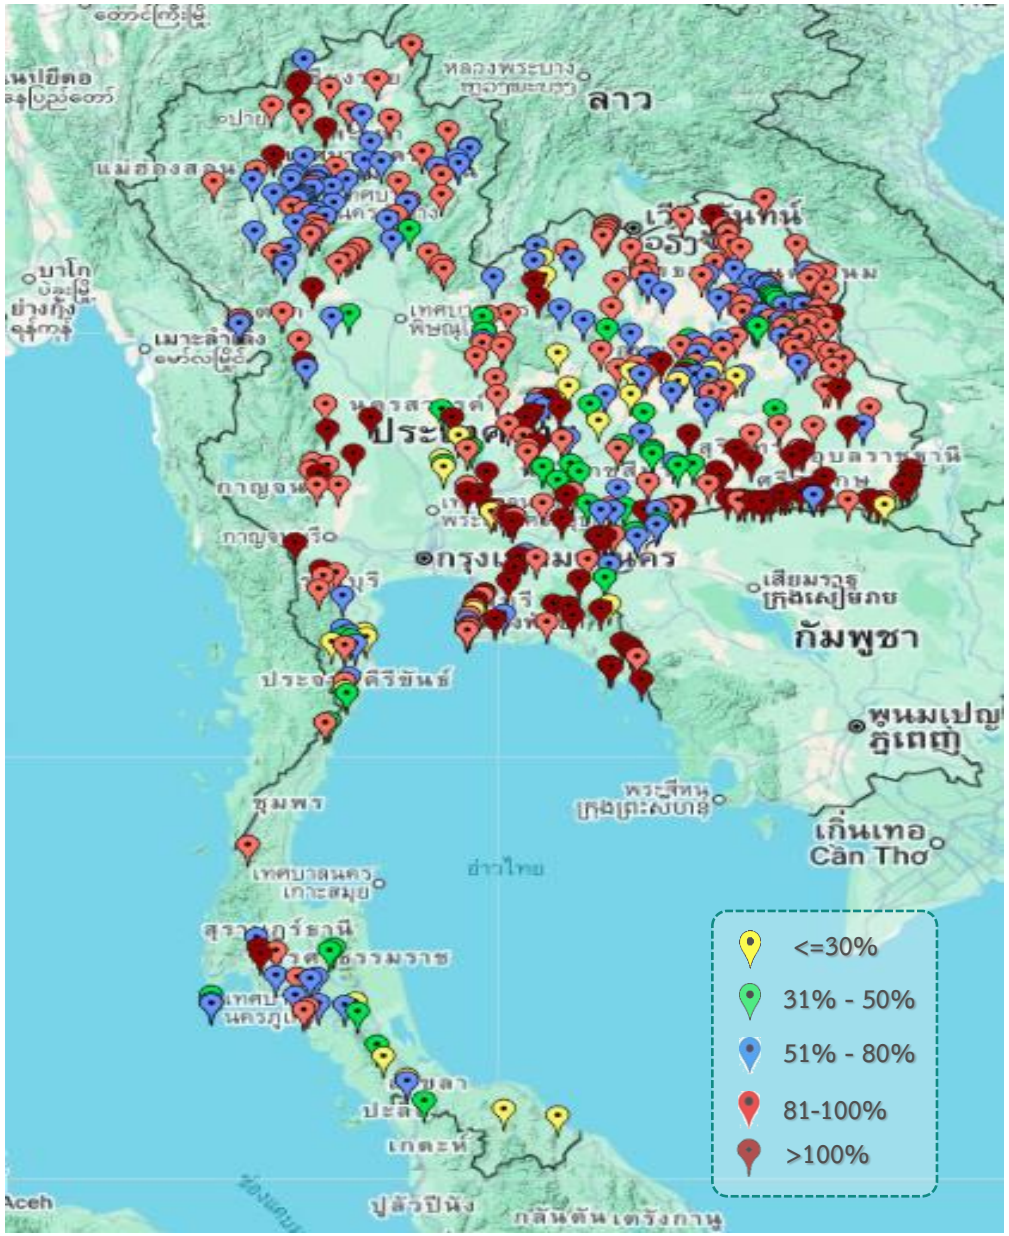

ภาค	ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 461 แห่ง								
	จำนวนอ่าง	ความจุ	น้ำใช้การ	ปริมาณน้ำปี 2568	% รนก.	ปริมาณน้ำปี 2569	% รนก.	ใช้การปี 2569	% ใช้การ
เหนือ	92	1,184	1,093	1,059	89	938	79	847	77
ตะวันออกเฉียงเหนือ	234	2,209	2,030	1,932	87	1,802	82	1,625	80
กลาง	28	419	389	349	83	374	89	344	88
ตะวันตก	9	170	159	107	63	171	101	160	101
ตะวันออก	54	1,118	1,055	926	83	1,080	97	1,018	96
ใต้	44	727	673	342	47	374	51	320	48
รวม	461	5,828	5,399	4,714	81	4,739	81	4,313	80

สรุปอ่างขนาดกลางที่มีปริมาตรในช่วง <=30%, >30 - 50% ,>50-80%, > 80-100% และ >100%

ภาค	<=30%	>30-50%	>50-80%	>80-100%	>100%
เหนือ	0	3	43	38	8
ตอน.	13	25	58	93	45
ตะวันออก	3	3	6	16	26
กลาง	3	4	2	13	6
ตะวันตก	0	0	0	6	3
ใต้	9	10	15	8	2
รวม	28	45	124	174	90
รวมทั้งหมด 461 แห่ง					

เพิ่มจำนวนอ่างเก็บน้ำเป็น 461 แห่ง และเพิ่มความจุใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.69

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง วันที่ 28 ตุลาคม 2569

ภาค	ขนาดใหญ่				ขนาดกลาง				รวมอ่างขนาดใหญ่และกลาง						รับน้ำได้อีก		เปรียบเทียบปี 68 กับ 69	
	จำนวน	ความจุ	ปี 2569	% ความจุอ่างฯ	จำนวน	ความจุ	ปี 2569	% ความจุอ่างฯ	จำนวน	ความจุ	ปี 2568		ปี 2569		ปริมาตร	%	ปริมาตร	%
											ปริมาตร	%	ปริมาตร	%				
เหนือ	8	24,825	18,936	76	92	1,184	938	79	100	26,009	24,879	96	19,874	76	6,135	24	-5,005	-19
ตอน.	12	8,368	5,698	68	234	2,209	1,802	82	246	10,577	9,449	89	7,500	71	3,078	29	-1,949	-18
กลาง	3	1,331	1,221	92	28	419	374	89	31	1,750	1,513	86	1,596	91	155	9	83	5
ตะวันตก	2	26,605	26,097	98	9	170	171	101	11	26,775	23,407	87	26,268	98	507	2	2,861	11
ตะวันออก	6	1,515	1,439	95	54	1,118	1,080	97	60	2,633	2,158	82	2,520	96	129	4	362	14
ใต้	4	8,194	6,060	74	44	727	374	51	48	8,922	6,180	69	6,434	72	2,487	28	254	3
รวม	35	70,838	59,452	84	461	5,828	4,739	81	496	76,666	67,586	88	64,191	84	12,490	16	-3,395	-4
ปริมาณน้ำใช้การ		47,301	35,902	76		5,399	4,313	80		52,700	43,621	83	40,215	76				



สามารถรับน้ำได้อีก 12,490 ล้าน ลบ.ม. (16%)

%น้ำใช้การ=(ปริมาตรน้ำใช้การ/ความจุน้ำใช้การ)*100

เพิ่มจำนวนอ่างเก็บน้ำเป็น 461 แห่ง และเพิ่มความจุใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.69

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง 496 แห่ง

วันที่ 28 ต.ค.69



ภาคเหนือ (100 แห่ง)

ปี	2569	2568
ความจุ	26,009	25,970
น้ำเก็บกัก	19,874 (76%)	24,879 (96%)
น้ำใช้การ	13,039 (68%)	18,044 (94%)

ภาคตะวันตก (11 แห่ง)

ปี	2569	2568
ความจุ	26,775	26,769
น้ำเก็บกัก	26,268 (98%)	23,407 (87%)
น้ำใช้การ	12,980 (96%)	10,119 (75%)

ภาคใต้ (48 แห่ง)

ปี	2569	2568
ความจุ	8,922	8,916
น้ำเก็บกัก	6,434 (72%)	6,180 (69%)
น้ำใช้การ	4,670 (65%)	4,416 (62%)

ทั้งประเทศ (496 แห่ง)

ปี	2569	2568
ความจุ	76,666	76,506
น้ำเก็บกัก	64,192 (84%)	67,586 (88%)
น้ำใช้การ	40,215 (76%)	43,605 (83%)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (246 แห่ง)

ปี	2569	2568
ความจุ	10,577	10,490
น้ำเก็บกัก	7,500 (71%)	9,449 (90%)
น้ำใช้การ	5,670 (65%)	7,615 (88%)

ภาคกลาง (31 แห่ง)

ปี	2569	2568
ความจุ	1,750	1,838
น้ำเก็บกัก	1,596 (91%)	1,513 (82%)
น้ำใช้การ	1,493 (91%)	1,410 (80%)


ภาคตะวันออก (60 แห่ง)


ปี	2569	2568
ความจุ	2,633	2,524
น้ำเก็บกัก	2,520 (96%)	2,158 (85%)
น้ำใช้การ	2,363 (95%)	2,001 (84%)

หน่วย ล้าน ลบ.ม.

ปี 2569 น้อยกว่าปี 2568 จำนวน 3,394 ล้าน ลบ.ม.


กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปี 2569



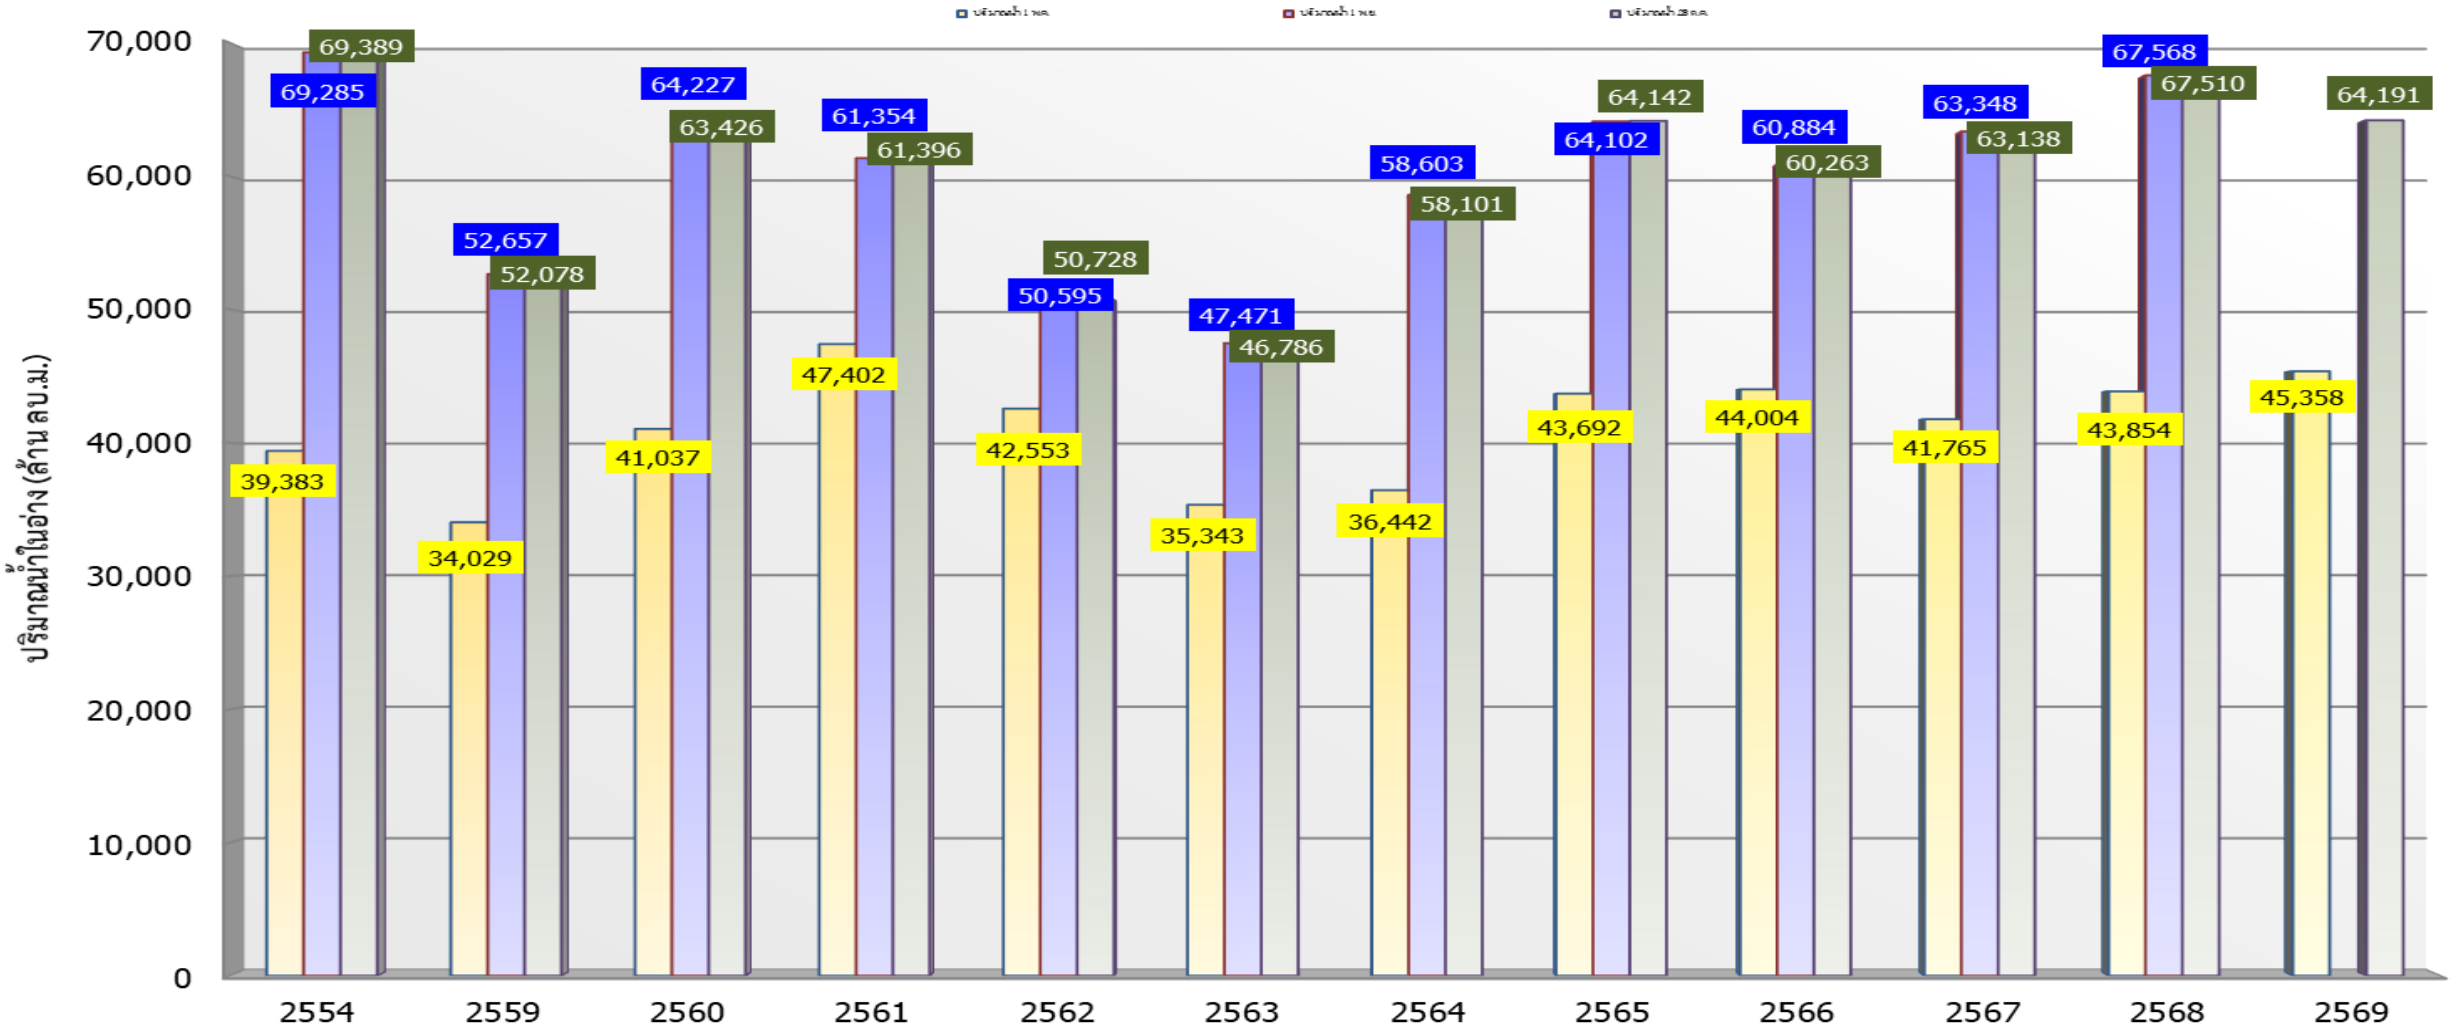


	2554	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569
ปริมาณน้ำ 1 พ.ค.	39,383	34,029	41,037	47,402	42,553	35,343	36,442	43,692	44,004	41,765	43,854	45,358
ปริมาณน้ำ 1 พ.ย.	69,285	52,657	64,227	61,354	50,595	47,471	58,603	64,102	60,884	63,348	67,568	
ปริมาณน้ำ 28 ต.ค.	69,389	52,078	63,426	61,396	50,728	46,786	58,101	64,142	60,263	63,138	67,510	64,191

กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำเก็บกักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ ป่าสักฯ) ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปี 2569

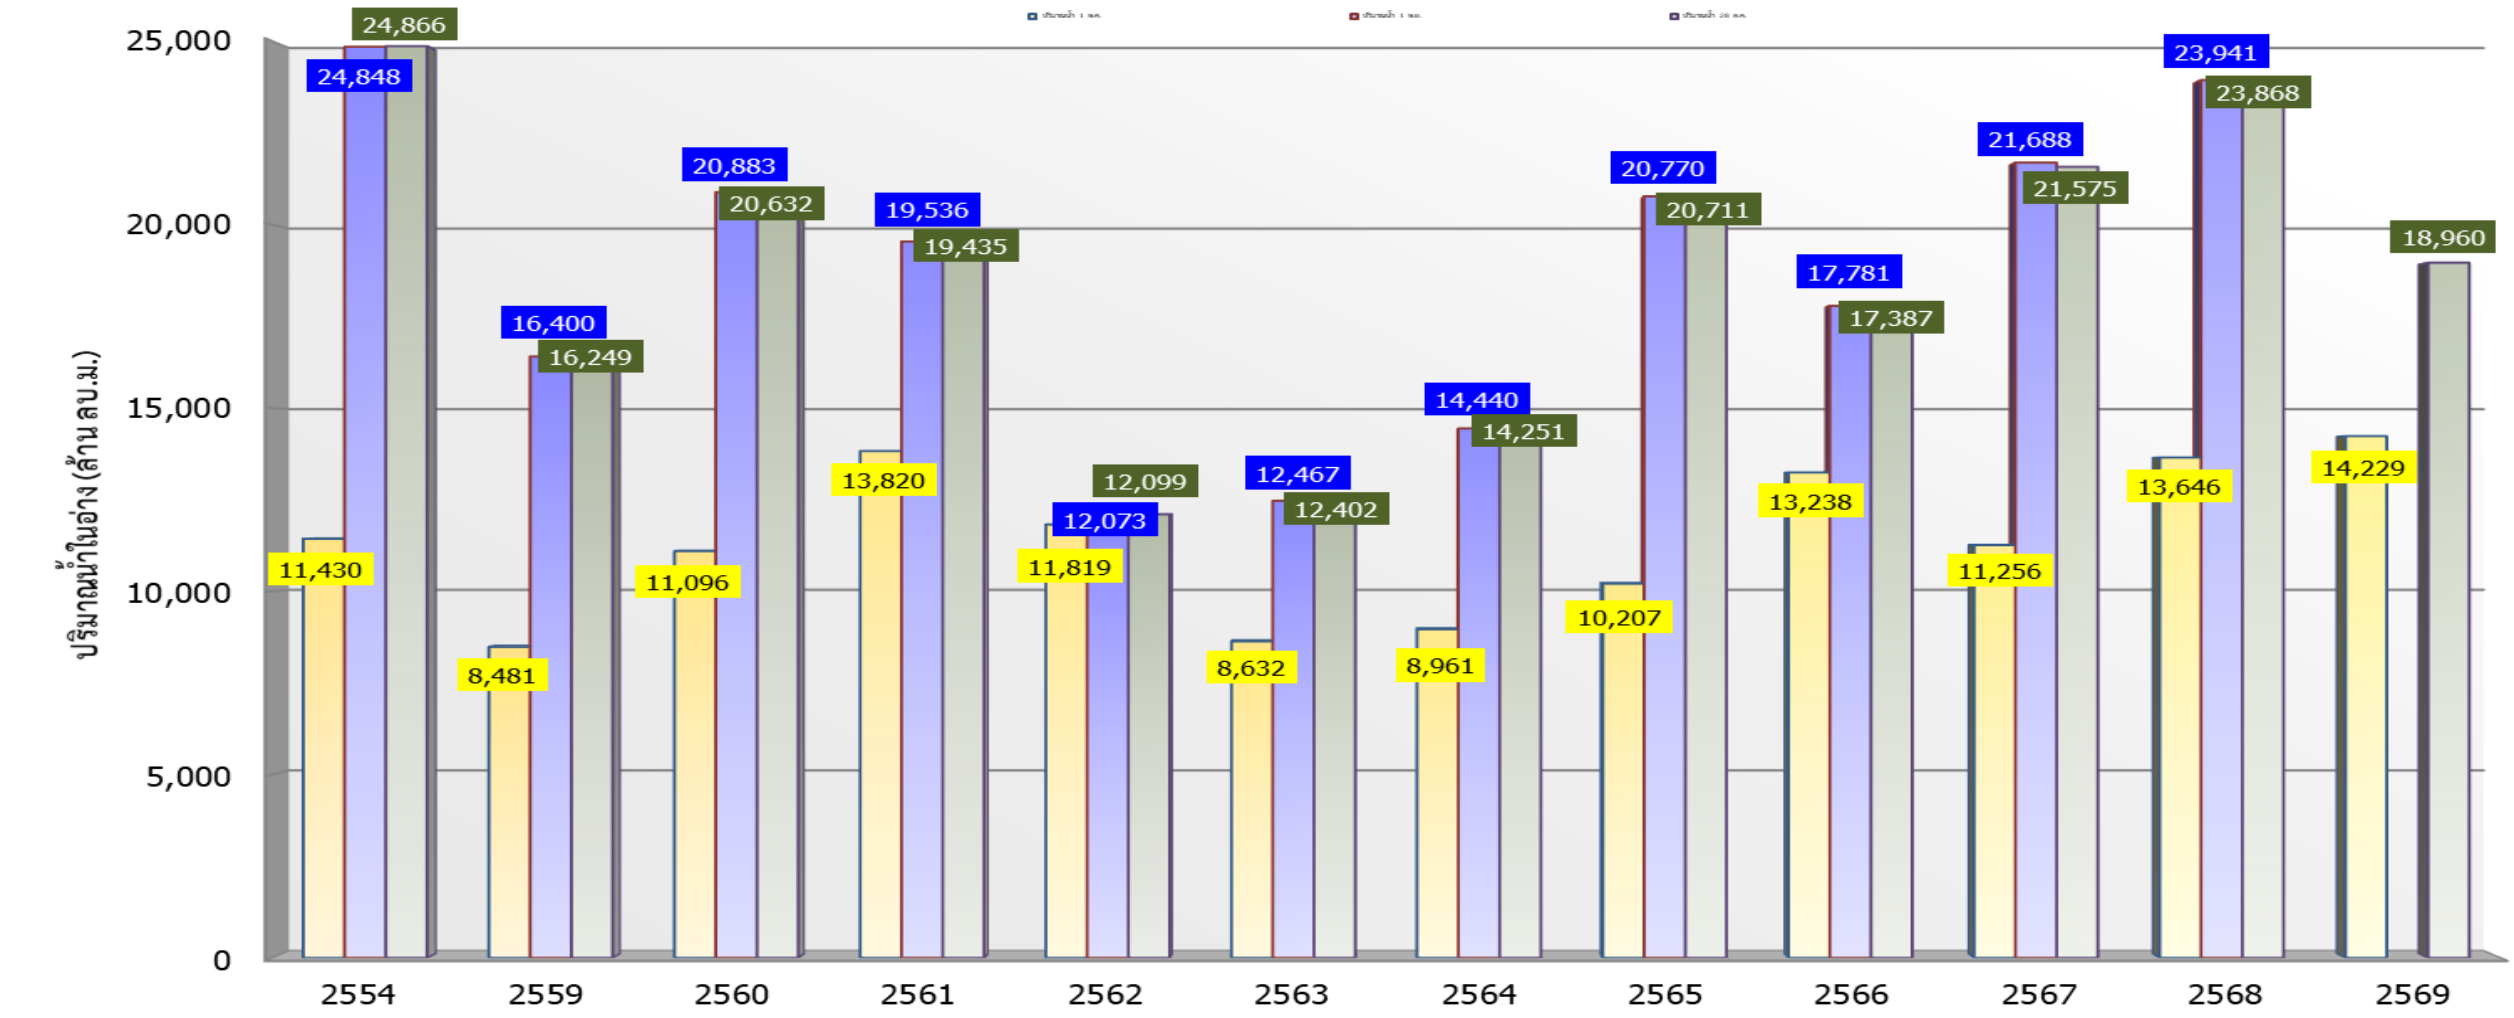

	2554	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569
ปริมาณน้ำ 1 พ.ค.	11,430	8,481	11,096	13,820	11,819	8,632	8,961	10,207	13,238	11,256	13,646	14,229
ปริมาณน้ำ 1 พ.ย.	24,848	16,400	20,883	19,536	12,073	12,467	14,440	20,770	17,781	21,688	23,941	
ปริมาณน้ำ 28 ต.ค.	24,866	16,249	20,632	19,435	12,099	12,402	14,251	20,711	17,387	21,575	23,868	18,960

แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก วันที่ 28 ตุลาคม 2569

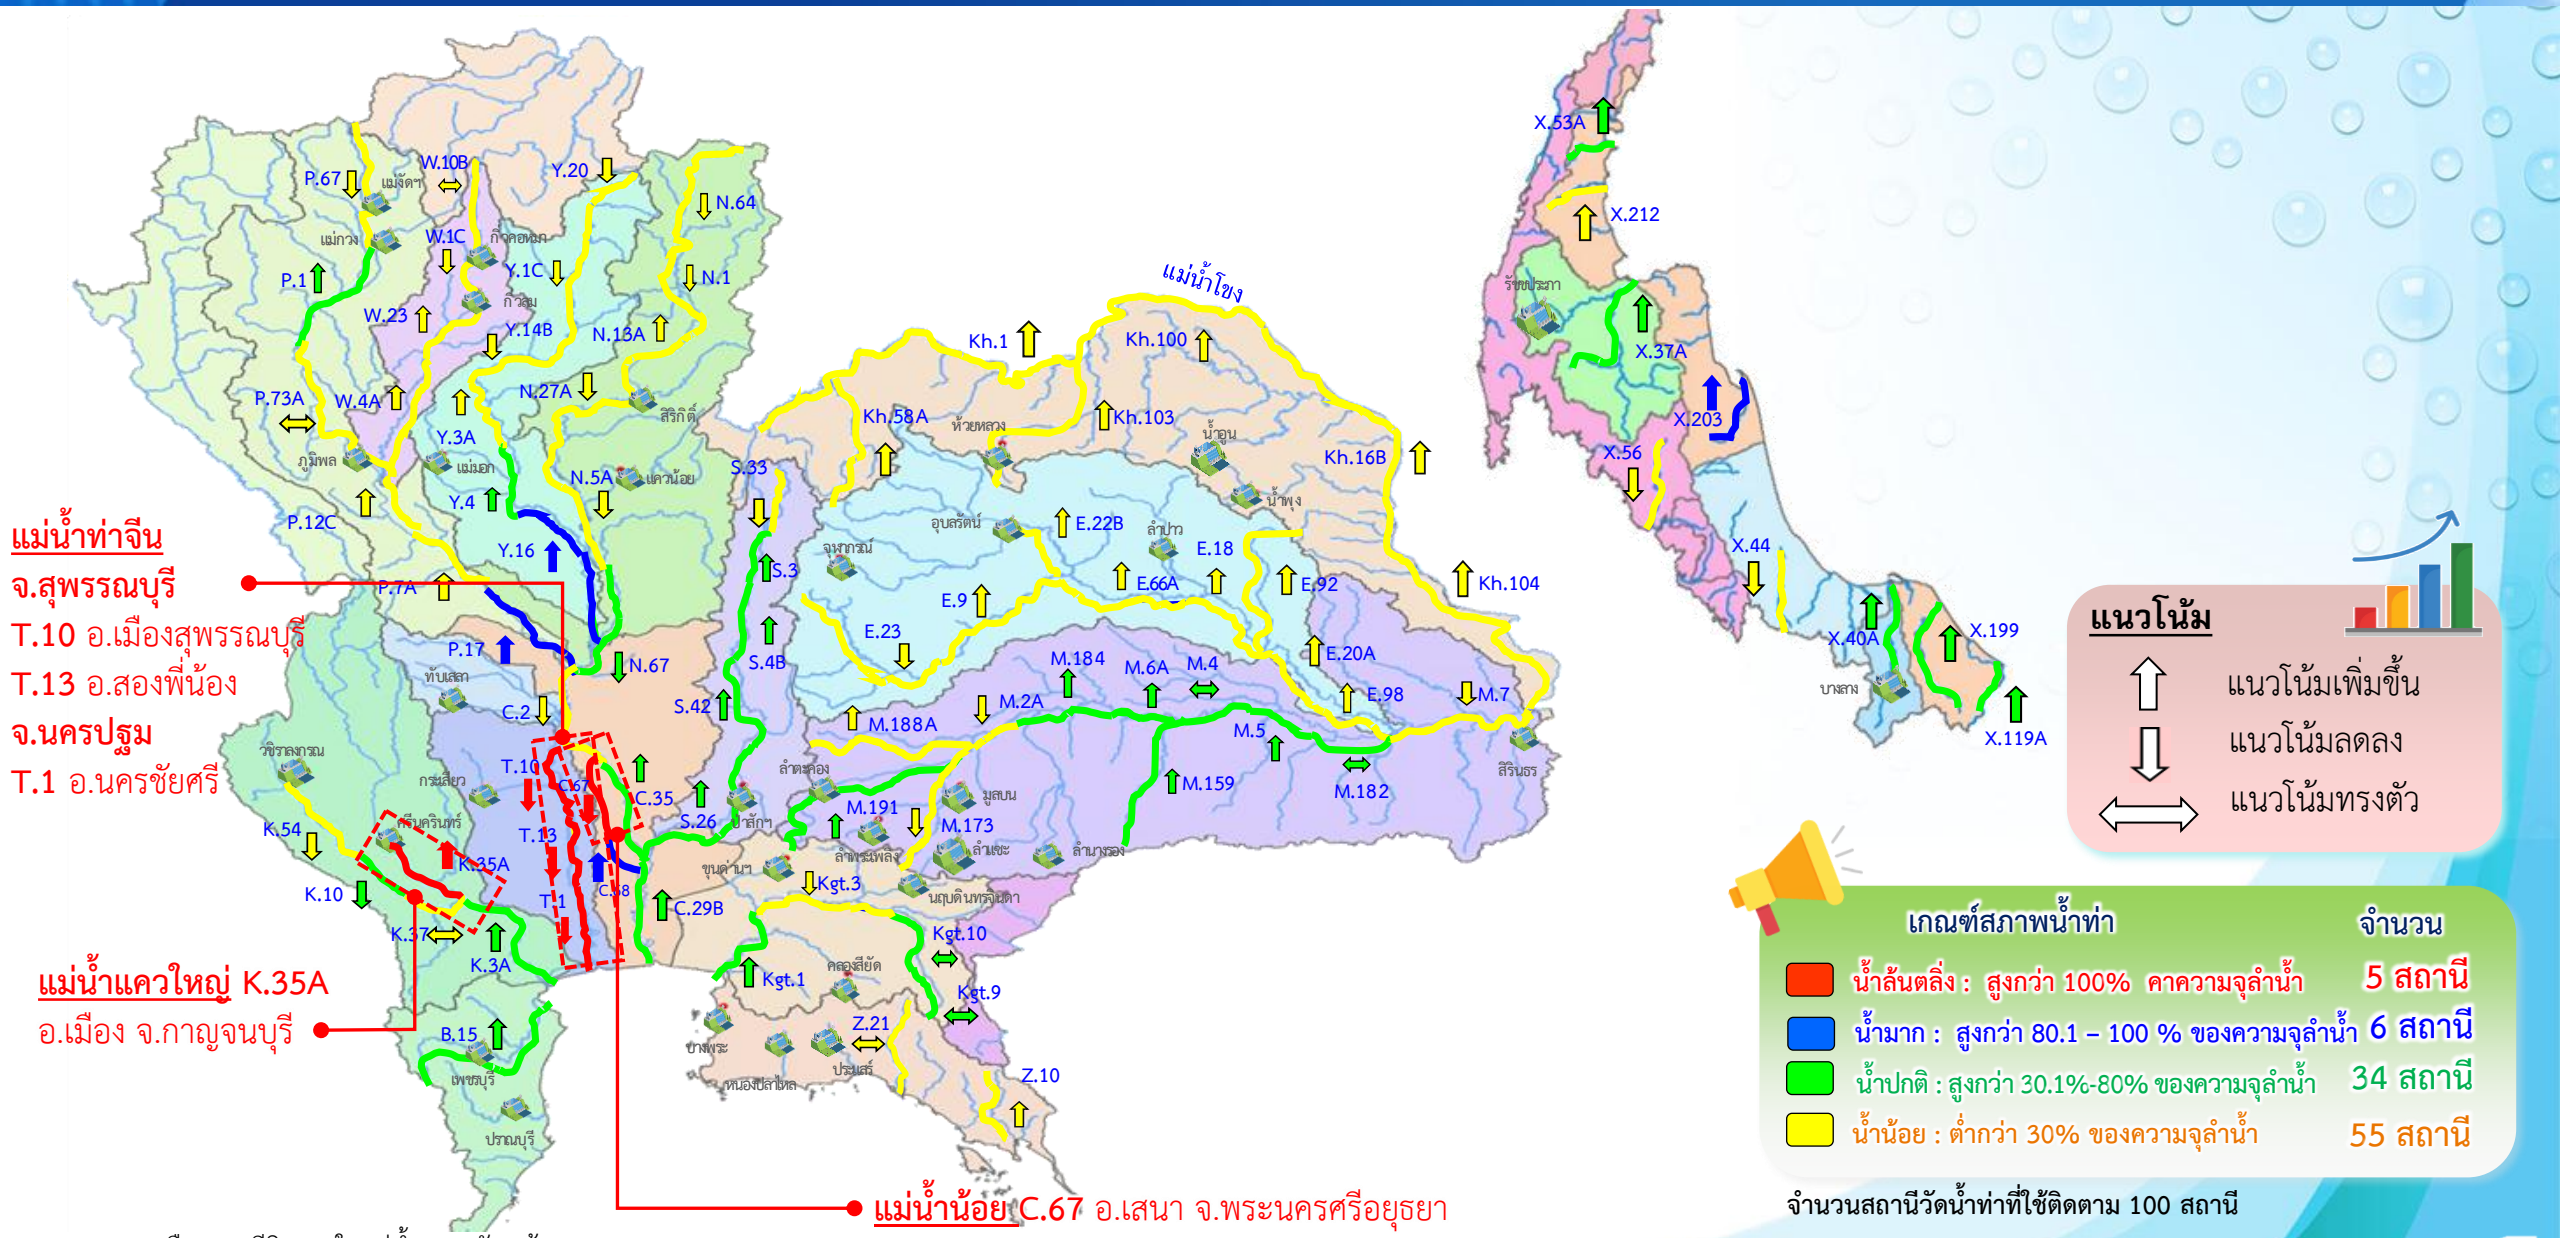

แนวโน้ม

- แนวโน้มเพิ่มขึ้น
- แนวโน้มลดลง
- แนวโน้มทรงตัว

เกณฑ์สภาพน้ำท่า	จำนวน
น้ำล้นตลิ่ง : สูงกว่า 100% ค่าความจุลำน้ำ	5 สถานี
น้ำมาก : สูงกว่า 80.1 – 100 % ของความจุลำน้ำ	6 สถานี
น้ำปกติ : สูงกว่า 30.1%-80% ของความจุลำน้ำ	34 สถานี
น้ำน้อย : ต่ำกว่า 30% ของความจุลำน้ำ	55 สถานี

จำนวนสถานีวัดน้ำท่าที่ใช้ติดตาม 100 สถานี


หมายเหตุ : เลือกสถานีติดตามในแม่น้ำสายหลัก I ข้อมูล ณ เวลา 06.00 น.

3

สถานการณ์น้ำ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ปริมาณน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

ณ วันที่ 28 ต.ค. 69

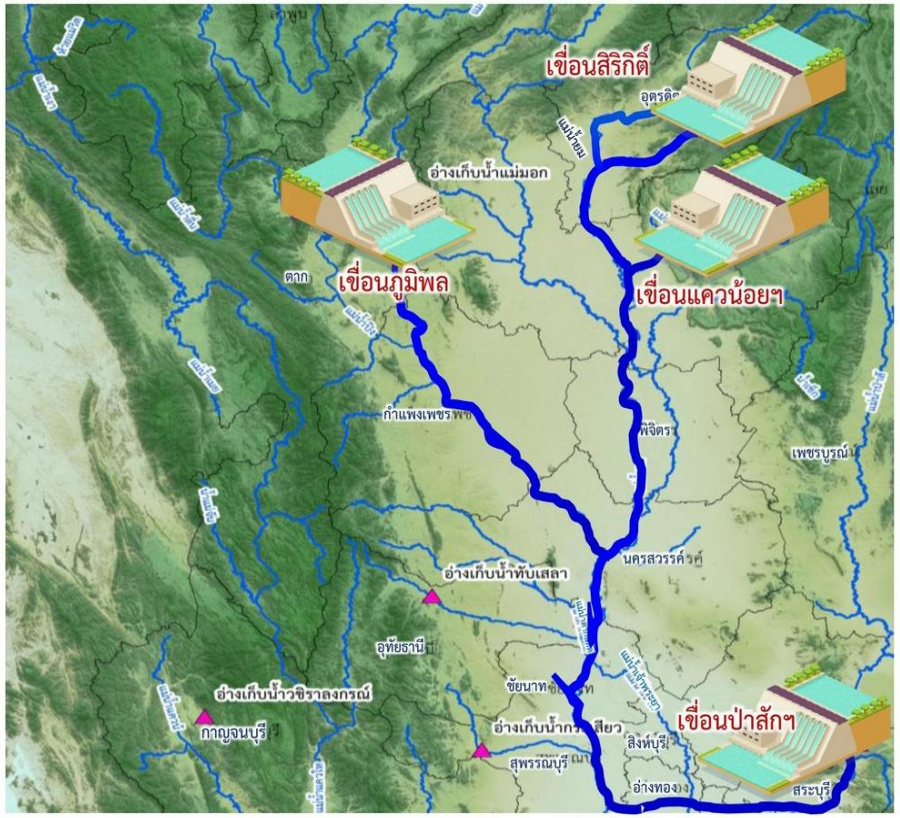

รวม 4 เขื่อน

28 ต.ค. 68		28 ต.ค. 69
23,868 (96%)	ปริมาณน้ำเก็บกัก ล้าน ลบ.ม.	18,960 (77%)
17,161 (95%)	น้ำใช้การ ล้าน ลบ.ม.	12,252 (68%)
986	รับน้ำได้อีก ล้าน ลบ.ม.	5,823

ไหลลงรวมวันนี้ 33.73 ล้าน ลบ.ม. | ระบายรวมวันนี้ 19.67 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนภูมิพล

ปี68	ปี69
มีน้ำไหลเข้า 23.07 ล้าน ลบ.ม.	มีน้ำไหลเข้า 16.06 ล้าน ลบ.ม.
ความจุเก็บกัก 13,462 ล้าน ลบ.ม.	
รับได้อีก ล้าน ลบ.ม. 707	รับได้อีก ล้าน ลบ.ม. 3,884
น้ำเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. 12,755 (95%)	น้ำเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. 9,578 (71%)
การระบายน้ำ 10.00 ล้าน ลบ.ม. 115.74 ลบ.ม./วินาที	Dead Storage 3,800 ล้าน ลบ.ม.
	การระบายน้ำ 5.00 ล้าน ลบ.ม. 57.87 ลบ.ม./วินาที

เขื่อนสิริกิติ์


ปี68	ปี69
มีน้ำไหลเข้า 13.40 ล้าน ลบ.ม.	มีน้ำไหลเข้า 11.36 ล้าน ลบ.ม.
ความจุเก็บกัก 9,510 ล้าน ลบ.ม.	
รับได้อีก ล้าน ลบ.ม. 280	รับได้อีก ล้าน ลบ.ม. 1,750
น้ำเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. 9,230 (97%)	น้ำเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. 7,760 (82%)
การระบายน้ำ 10.00 ล้าน ลบ.ม. 115.74 ลบ.ม./วินาที	Dead Storage 2,850 ล้าน ลบ.ม.
	การระบายน้ำ 12.94 ล้าน ลบ.ม. 149.77 ลบ.ม./วินาที

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

ปี68	ปี69
มีน้ำไหลเข้า 4.91 ล้าน ลบ.ม.	มีน้ำไหลเข้า 1.92 ล้าน ลบ.ม.
ความจุเก็บกัก 939 ล้าน ลบ.ม.	
รับได้อีก ล้าน ลบ.ม. -	รับได้อีก ล้าน ลบ.ม. 131
น้ำเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. 947 (101%)	น้ำเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. 808 (86%)
การระบายน้ำ 5.18 ล้าน ลบ.ม. 60.00 ลบ.ม./วินาที	Dead Storage 43 ล้าน ลบ.ม.
	การระบายน้ำ 0.86 ล้าน ลบ.ม. 10.00 ลบ.ม./วินาที


เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ปี68	ปี69
มีน้ำไหลเข้า 4.84 ล้าน ลบ.ม.	มีน้ำไหลเข้า 4.39 ล้าน ลบ.ม.
ความจุเก็บกัก 872 ล้าน ลบ.ม.	
รับได้อีก ล้าน ลบ.ม. -	รับได้อีก ล้าน ลบ.ม. 58
น้ำเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. 936 (107%)	น้ำเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. 813 (93%)
การระบายน้ำ 4.34 ล้าน ลบ.ม. 50.23 ลบ.ม./วินาที	Dead Storage 15 ล้าน ลบ.ม.
	การระบายน้ำ 0.87 ล้าน ลบ.ม. 10.07 ลบ.ม./วินาที

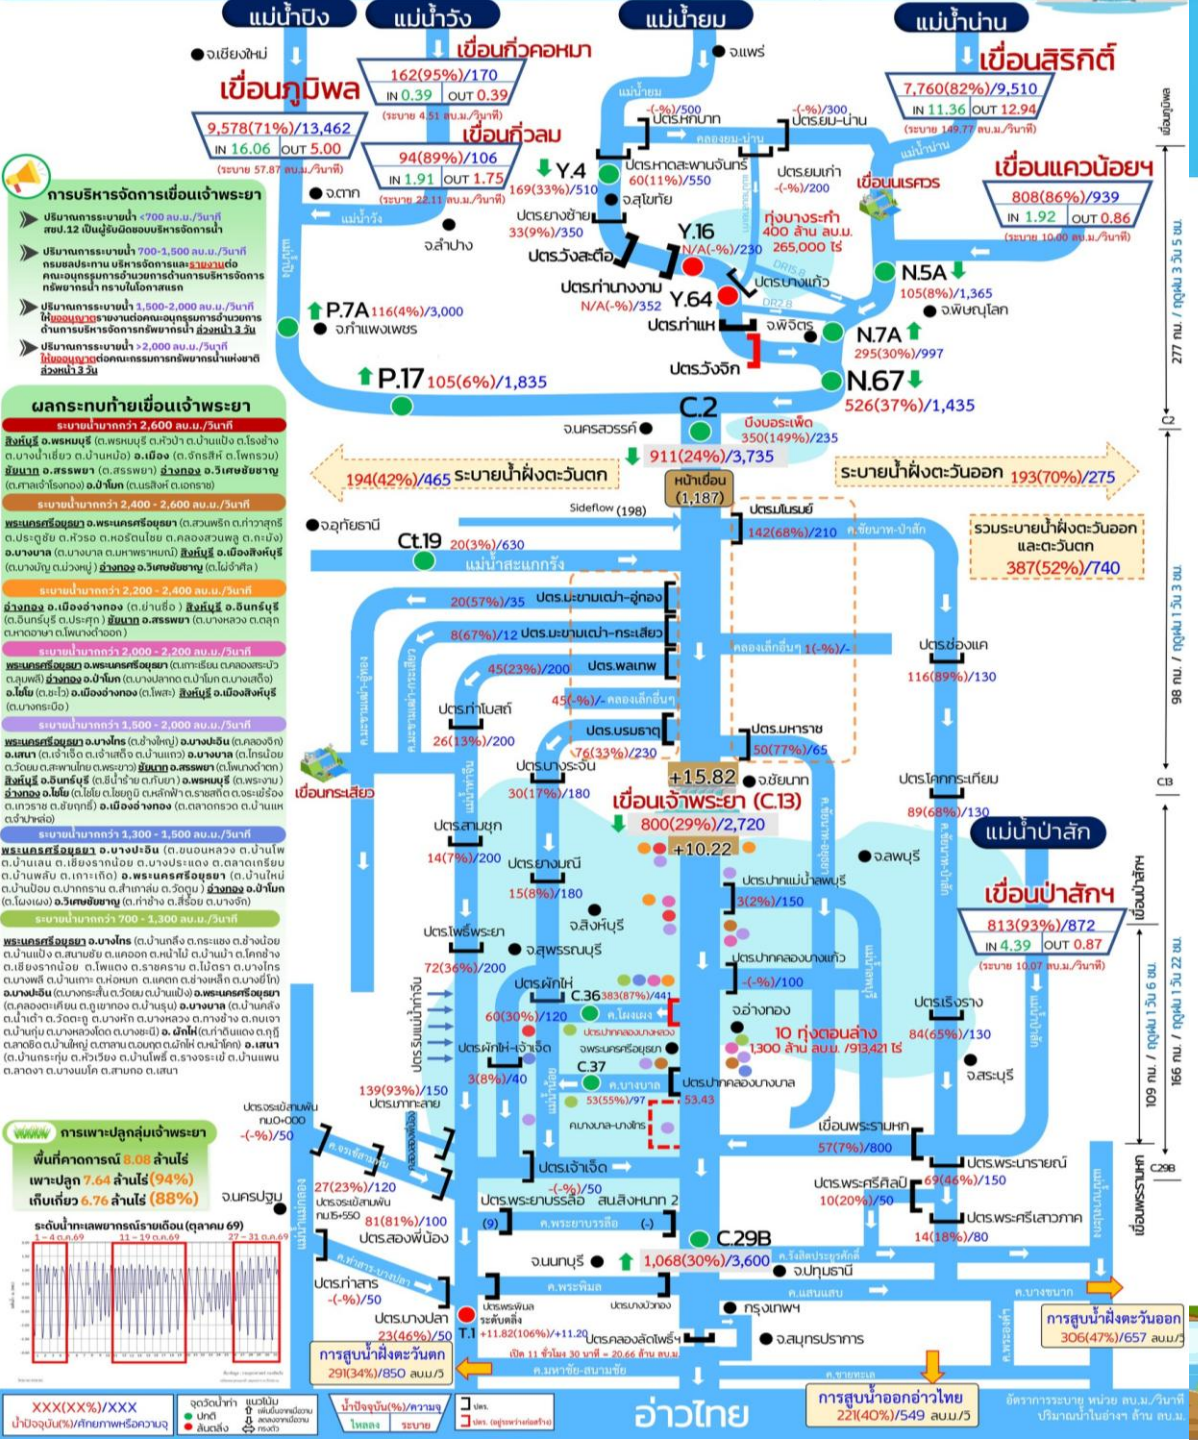
แม่น้ำปิง
แม่น้ำวัง
แม่น้ำยม
แม่น้ำน่าน
จ.เชียงใหม่
จ.แพร่
เขื่อนภูมิพล
162(95%)/170
IN 0.39 OUT 0.39
(ระบาย 4.51 ลบ.ม./วินาที)
9,578(71%)/13,462
IN 16.06 OUT 5.00
(ระบาย 57.87 ลบ.ม./วินาที)
เขื่อนกิ่วคอหมา
เขื่อนกิ่วลม
94(89%)/106
IN 1.91 OUT 1.75
(ระบาย 22.11 ลบ.ม./วินาที)
จ.ตาก
จ.ลำปาง
Y.4
169(33%)/510
Y.16
N/A(-%)/230
Y.64
N/A(-%)/352
ปตร.หาดสะพานจันทร์
60(11%)/550
จ.สุโขทัย
ปตร.ยางช้าย
33(9%)/350
ปตร.วังสะตือ
ปตร.ท่านางงาม
ปตร.ท่าแห
ปตร.ยมเก่า
-(-%)/200
ปตร.ยางแก้ว
ทุ่งบางระกำ
400 ล้าน ลบ.ม.
265,000 ไร่
เขื่อนแควน้อยฯ
808(86%)/939
IN 1.92 OUT 0.86
(ระบาย 10.00 ลบ.ม./วินาที)
เขื่อนสิริกิติ์
7,760(82%)/9,510
IN 11.36 OUT 12.94
(ระบาย 149.77 ลบ.ม./วินาที)
เขื่อนแรควด
N.5A
105(8%)/1,365
จ.พิษณุโลก
N.7A
295(30%)/997
N.67
526(37%)/1,435
จ.พิจิตร
P.7A 116(4%)/3,000
จ.กำแพงเพชร
P.17 105(6%)/1,835
ปตร.วังจิก
C.2
จ.นครสวรรค์
บึงบอระเพ็ด
350(149%)/235
911(24%)/3,735
194(42%)/465 ระบายน้ำฝั่งตะวันตก
ระบายน้ำฝั่งตะวันออก 193(70%)/275
หน้าเขื่อน
(1,187)
รวมระบายน้ำฝั่งตะวันออก
และตะวันตก
387(52%)/740
277 กม. / ถูกน้ำ 3 วัน 5 วัน
98 กม. / ถูกน้ำ 1 วัน 3 วัน
109 กม. / ถูกน้ำ 1 วัน 6 วัน
166 กม. / ถูกน้ำ 1 วัน 22 วัน
Sideflow (198)
จ.อุทัยธานี
Ct.19 20(3%)/630
แม่น้ำสะแกกรัง
ปตร.มโนรมย์
142(68%)/210
ค.ชัยนาท-ป่าสัก
ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง
20(57%)/35
ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว
8(67%)/12
ปตร.พลเทพ
45(23%)/200
คลองเล็กอื่นๆ 1(-%)/-
45(-%)/- คลองเล็กอื่นๆ
ปตร.ท่าโบสถ์
26(13%)/200
ปตร.บรมธาตุ
76(33%)/230
ปตร.บางระจัน
30(17%)/180
+15.82
จ.ชัยนาท
เขื่อนเจ้าพระยา (C.13)
800(29%)/2,720
+10.22
เขื่อนกระเสียว
ปตร.ช่องแค
116(89%)/130
ปตร.มหาราช
50(77%)/65
ปตร.โคกกระเทียม
89(68%)/130
แม่น้ำป่าสัก
เขื่อนป่าสักฯ
813(93%)/872
IN 4.39 OUT 0.87
(ระบาย 10.07 ลบ.ม./วินาที)
จ.ลพบุรี
ปตร.ปากแม่น้ำลพบุรี
3(2%)/150
ปตร.ปากคลองบางแก้ว
-(-%)/100
จ.อ่างทอง
10 ทุ่งตอนล่าง
1300 ล้าน ลบ.ม. /913,421 ไร่
ปตร.เริงราง
84(65%)/130
จ.สระบุรี
ปตร.สามชุก
14(7%)/200
ปตร.ยางมณี
15(8%)/180
ปตร.ไพรีพระยา
จ.สิงห์บุรี
จ.สุพรรณบุรี
72(36%)/200
ปตร.ผักไห่
C.36 383(87%)/441
60(30%)/120
ค.โผงเผง
ปตร.ผักไห่-เจ้าเจ็ด
C.37
3(8%)/40
ค.บางบาล
53(55%)/97
ค.บางบาล-บางซ้าย
53.43
ปตร.ปากคลองบางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา
ปตร.ระบายน้ำท่าจีน
ปตร.ระบายน้ำป่าสัก
ปตร.ระบายน้ำเหนือ
ปตร.ระบายน้ำใต้
ปตร.ระบายน้ำตะวันออก
ปตร.ระบายน้ำตะวันตก
ปตร.ระบายน้ำเหนือ
ปตร.ระบายน้ำใต้
ปตร.ระบายน้ำตะวันออก
ปตร.ระบายน้ำตะวันตก
เขื่อนพระรามหก
57(7%)/800
ปตร.พระนารายณ์
69(46%)/150
ปตร.พระศรีศิลป์
10(20%)/50
ปตร.พระศรีเสาวภาค
14(18%)/80
C.29B
1,068(30%)/3,600
จ.ปทุมธานี
จ.นนทบุรี
ค.พระพิมล
ค.แสนแสบ
ค.บางขนาก
ค.ทับนาง-ท่าไข่
ค.มหาชัย-สนามชัย
ค.ชายทะเล
ปตร.เจ้าเจ็ด
-(-%)/50
ปตร.พระยาบรรลือ สน.สิงหนาท 2
(9)
ค.พระยาบรรลือ
(-)
ปตร.ระบายน้ำเหนือ
ปตร.ระบายน้ำใต้
ปตร.ระบายน้ำตะวันออก
ปตร.ระบายน้ำตะวันตก

การบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

ณ วันที่ 28 ต.ค. 69

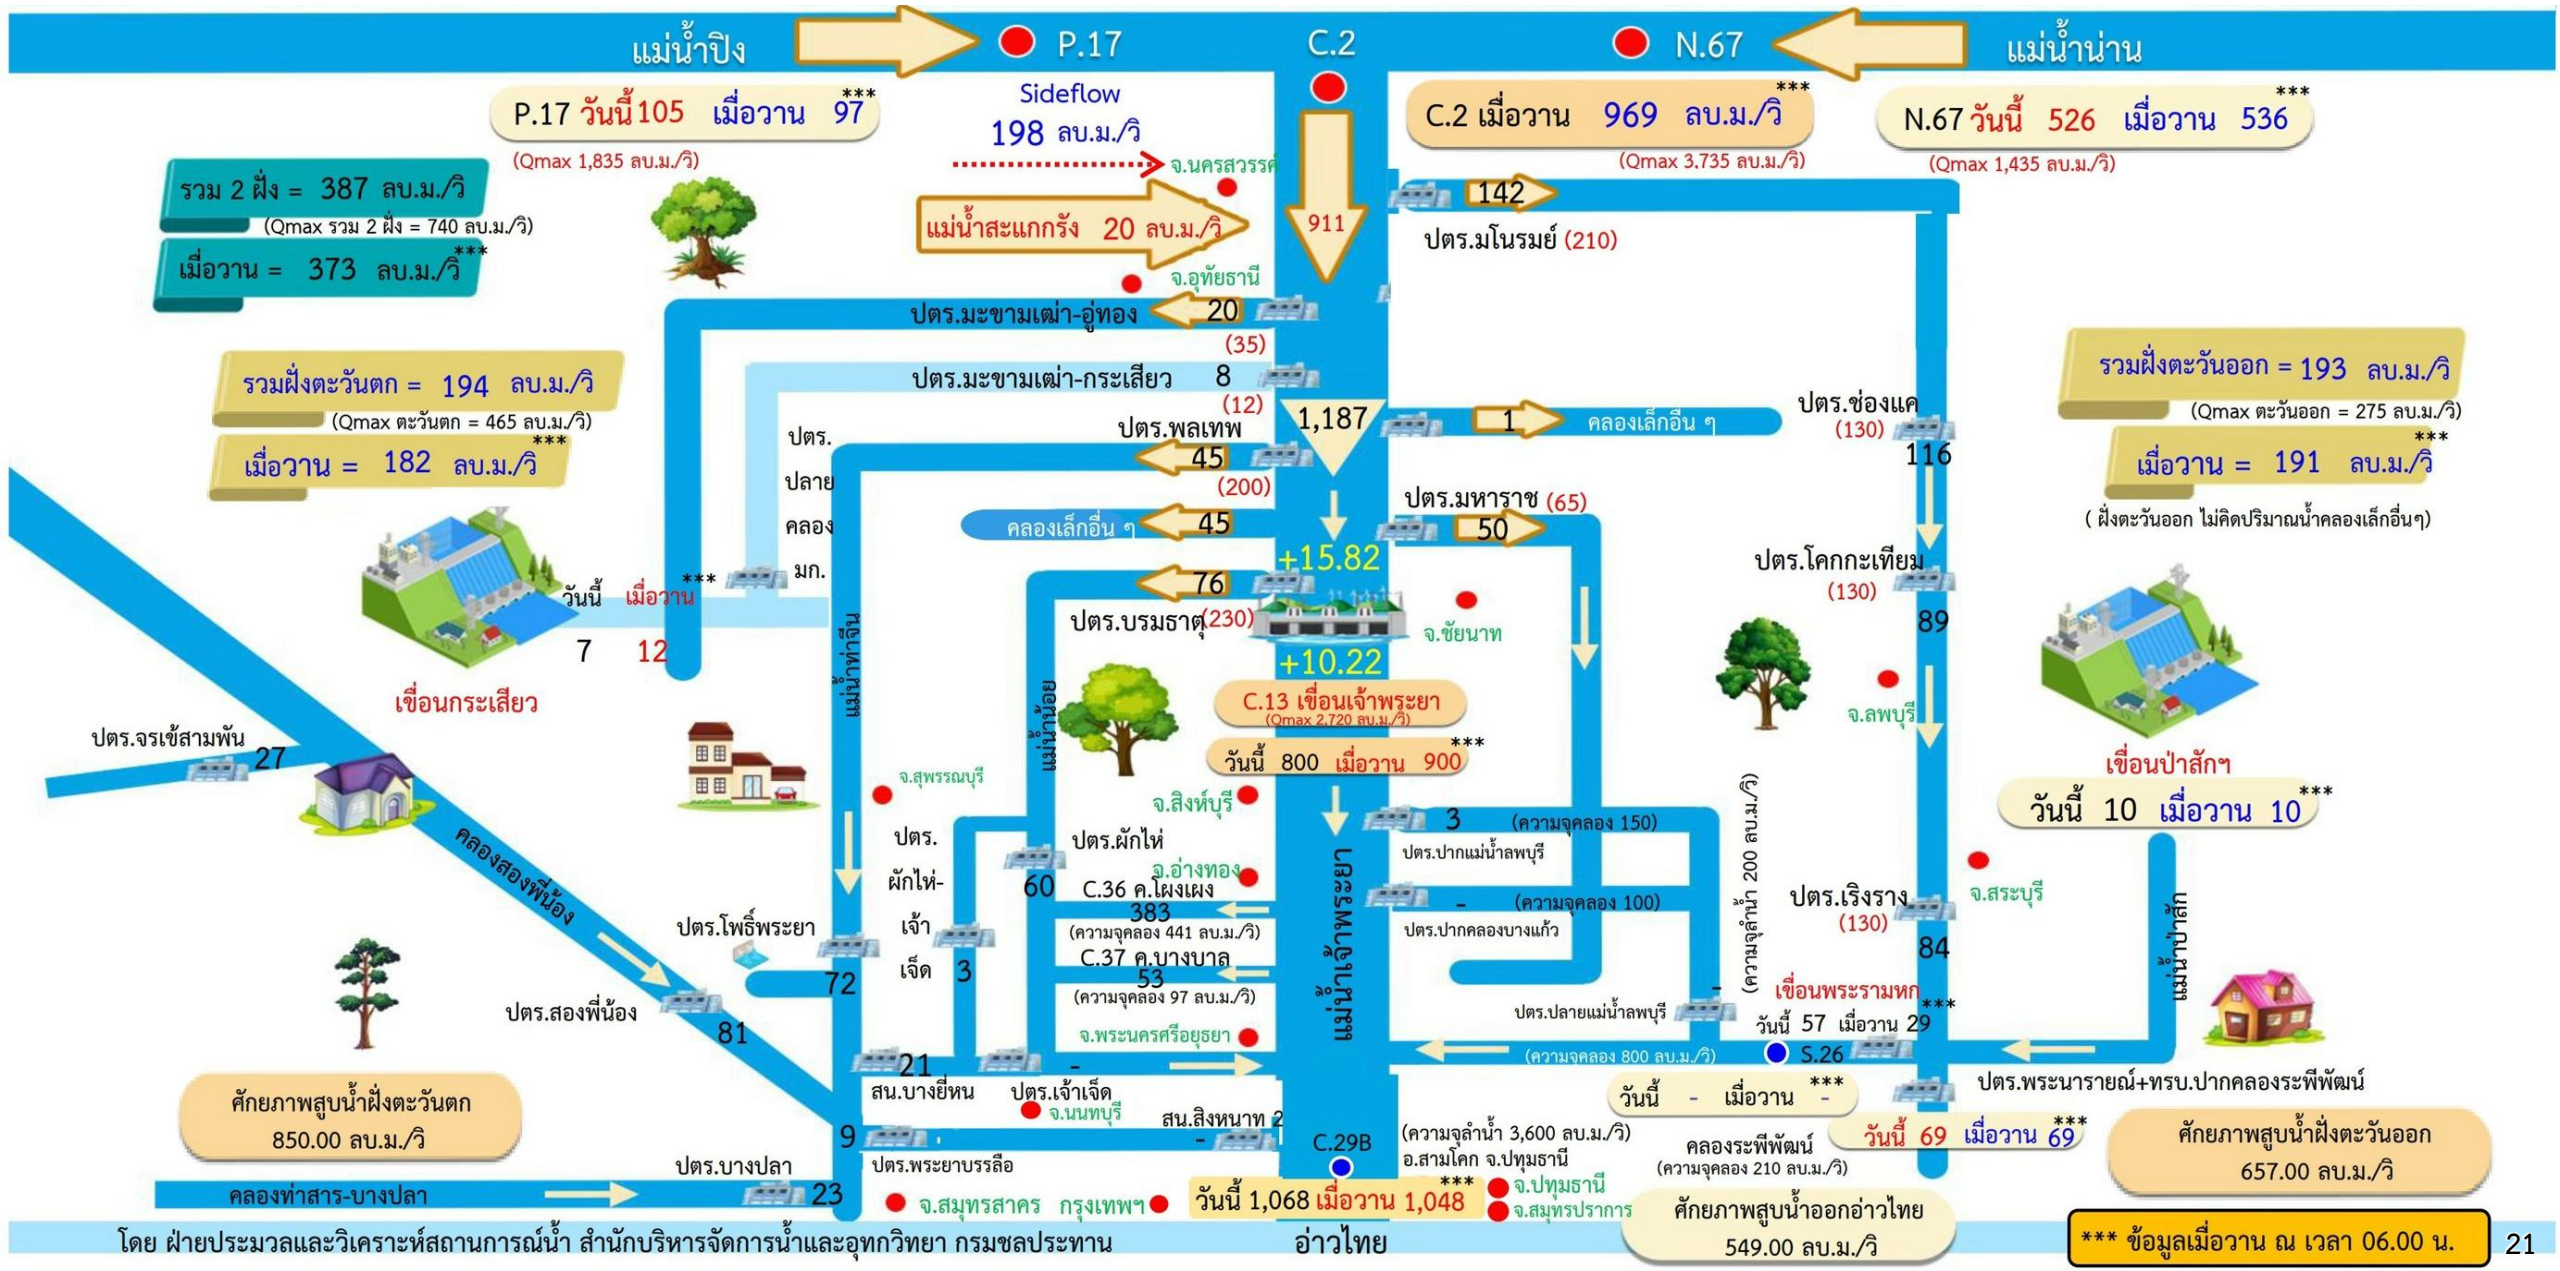

โดย ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

*** ข้อมูลเมื่อวาน ณ เวลา 06.00 น.

เกณฑ์การระบายน้ำ
เขื่อนเจ้าพระยา

กรมชลประทาน

กรณีระบายน้ำไม่เกินความจุลำน้ำ
และไม่กระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
ปริมาณการระบายน้ำ <700 ลบ.ม./วินาที
หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการน้ำ

กรณีระบายน้ำก่อให้เกิด
น้ำท่วมด้านท้ายน้ำหรือเหนือน้ำ
ปริมาณการระบายน้ำ
700 – 1,500 ลบ.ม./วินาที
รายงานต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทราบในโอกาสแรก

กรณีระบายน้ำก่อให้เกิด
น้ำท่วมด้านท้ายน้ำหรือเหนือน้ำ
ปริมาณการระบายน้ำ
1,500-2,000 ลบ.ม./วินาที
ให้ขออนุญาตต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ล่วงหน้า 3 วัน

กรณีระบายน้ำก่อให้เกิด
น้ำท่วมด้านท้ายน้ำหรือเหนือน้ำ
ปริมาณการระบายน้ำ >2,000 ลบ.ม./วินาที
ให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ล่วงหน้า 3 วัน

สัญลักษณ์
ตลิ่ง ม. (รทก.)
ระดับปกติ
ระดับวิกฤต
ระดับน้ำท่วม
ลบ.ม./วินาที
ปตร.(อยู่ระหว่างก่อสร้าง)
ปตร.

ปริมาณน้ำวิกฤต
2,720 ลบ.ม./วินาที
ระดับตลิ่ง +16.34 ม.



ปริมาณน้ำวิกฤต
3,600 ลบ.ม./วินาที

(วันที่ 11 มิถุนายน 2569)

ระบายน้ำ 700 - 1,300 ลบ.ม./วินาที

จ.พระนครศรีอยุธยา
1 **อ.เสนา** ต.บ้านกระทุ่ม ต.หัวเวียง ต.บ้านโพธิ์ ต.รางจรเข้ ต.บ้านแพน ต.ลาดงา ต.บางนมโค ต.สามกอ ต.เสนา
2 **อ.ผักไห่** ต.ท่าดินแดง ต.กุฎี ต.ลาดชิด ต.บ้านใหญ่ ต.ตาลาน ต.อมฤต ต.ผักไห่ ต.หน้าโคก
3 **อ.บางบาล** ต.บ้านคลัง ต.น้ำเต้า ต.วัดตะกู ต.บางหัก ต.บางหลวง ต.ทางช้าง ต.กบเจา ต.บ้านกุ่ม ต.บางหลวงโดด ต.บางชะนี
4 **อ.พระนครศรีอยุธยา** ต.คลองตะเคียน ต.ภูเขาทอง ต.บ้านรุน 5 **อ.บางปะอิน** ต.บางกระสั้น ต.วัดยม ต.บ้านแป้ง
6 **อ.บางไทร** ต.บ้านกลึง ต.กระแชง ต.ช้างน้อย ต.บ้านแป้ง ต.สนามชัย ต.แคออก ต.หน้าไม้ ต.บ้านม้า ต.โคกช้าง ต.เชียงรากน้อย ต.โพแตง ต.ราชคราม ต.ไม้ตรา ต.บางไทร ต.บางพลี ต.บ้านเกาะ ต.ห่อหมก ต.แคตก ต.ช่างเหล็ก ต.บางยี่โท

ระบายน้ำ 1,300 - 1,500 ลบ.ม./วินาที

จ.อ่างทอง
7 **อ.วิเศษชัยชาญ** ต.ท่าช้าง ต.สี่ร้อย ต.บางจัก 8 **อ.ป่าโมก** ต.โผงเผง
จ.พระนครศรีอยุธยา
9 **อ.พระนครศรีอยุธยา** ต.บ้านใหม่ ต.บ้านป้อม ต.ปากกราน ต.สำเภาล่ม ต.วัดตูม
10 **อ.บางปะอิน** ต.ขนอนหลวง ต.บ้านโพ ต.บ้านเลน ต.เชียงรากน้อย ต.บางประแดง ต.ตลาดเกรียบ ต.บ้านพลับ ต.เกาะเกิด

ระบายน้ำ 1,500 - 2,000 ลบ.ม./วินาที

จ.อ่างทอง
11 **อ.เมืองอ่างทอง** ต.ตลาดกรวด ต.บ้านแห ต.จำปาหล่อ
12 **อ.ไชโย** ต.ไชโย ต.ไชยภูมิ ต.หลักฟ้า ต.ราชสถิตย์ ต.จรเข้ร้อง ต.เทวราช ต.ชัยฤทธิ์
จ.สิงห์บุรี
13 **อ.อินทร์บุรี** ต.ซีน้ำร้าย ต.ทับยา 14 **อ.พรหมบุรี** ต.พระงาม จ.ชัยนาท 15 **อ.สรรพยา** ต.โพนางดำตก
จ.พระนครศรีอยุธยา
16 **อ.บางบาล** ต.ไทรน้อย ต.วัดยม ต.สะพานไทย ต.พระขาว 17 **อ.เสนา** ต.เจ้าเจ็ด ต.เจ้าเสด็จ ต.บ้านแถว
18 **อ.บางปะอิน** ต.คลองจิก 19 **อ.บางไทร** ต.ช้างใหญ่

ระบายน้ำ 2,000 - 2,200 ลบ.ม./วินาที

จ.สิงห์บุรี
20 **อ.เมืองสิงห์บุรี** ต.บางกระบือ
จ.อ่างทอง
21 **อ.เมืองอ่างทอง** ต.โพสะ 22 **อ.ไชโย** ต.ชะไว 23 **อ.ป่าโมก** ต.บางปลากด ต.ป่าโมก ต.บางเสด็จ
จ.พระนครศรีอยุธยา
24 **อ.พระนครศรีอยุธยา** ต.เกาะเรียน ต.คลองสระบัว ต.ลุมพลี

ระบายน้ำ 2,200 - 2,400 ลบ.ม./วินาที

จ.ชัยนาท
25 **อ.สรรพยา** ต.ตลุก ต.หาดอาษา ต.โพนางดำออก 26 **อ.สรรพยา** ต.บางหลวง
จ.สิงห์บุรี
27 **อ.อินทร์บุรี** ต.อินทร์บุรี ต.ประศุก จ.อ่างทอง 28 **อ.เมืองอ่างทอง** ต.ย่านซื่อ

ระบายน้ำ 2,400 - 2,600 ลบ.ม./วินาที


จ.อ่างทอง
29 **อ.เมืองอ่างทอง** ต.บ้านรี 30 **อ.วิเศษชัยชาญ** ต.ไผ่จำศีล จ.สิงห์บุรี 31 **อ.เมืองสิงห์บุรี** ต.บางมัญ ต.ม่วงหมู่
จ.พระนครศรีอยุธยา
32 **อ.บางบาล** ต.บางบาล ต.มหาพราหมณ์
33 **อ.พระนครศรีอยุธยา** ต.สวนพริก ต.ท่าวาสุกรี ต.ประตูชัย ต.หัวรอ ต.หอรัตนไชย ต.คลองสวนพลู ต.กะมัง


ระบายน้ำ มากกว่า 2,600 ลบ.ม./วินาที

จ.อ่างทอง
34 **อ.ป่าโมก** ต.นรสิงห์ ต.เอกราช 35 **อ.วิเศษชัยชาญ** ต.ศาลเจ้าโรงทอง
จ.ชัยนาท
36 **อ.สรรพยา** ต.สรรพยา
จ.สิงห์บุรี
37 **อ.เมืองสิงห์บุรี** ต.จักรสีห์ ต.โพกรวม ต.ต้นโพธิ์ ต.บางพุทรา
38 **อ.พรหมบุรี** ต.พรหมบุรี ต.หัวป่า ต.บ้านแป้ง ต.โรงช้าง ต.บางน้ำเชี่ยว ต.บ้านหม้อ

ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

วันที่ 28 ต.ค. 69 เวลา 06.00 น.

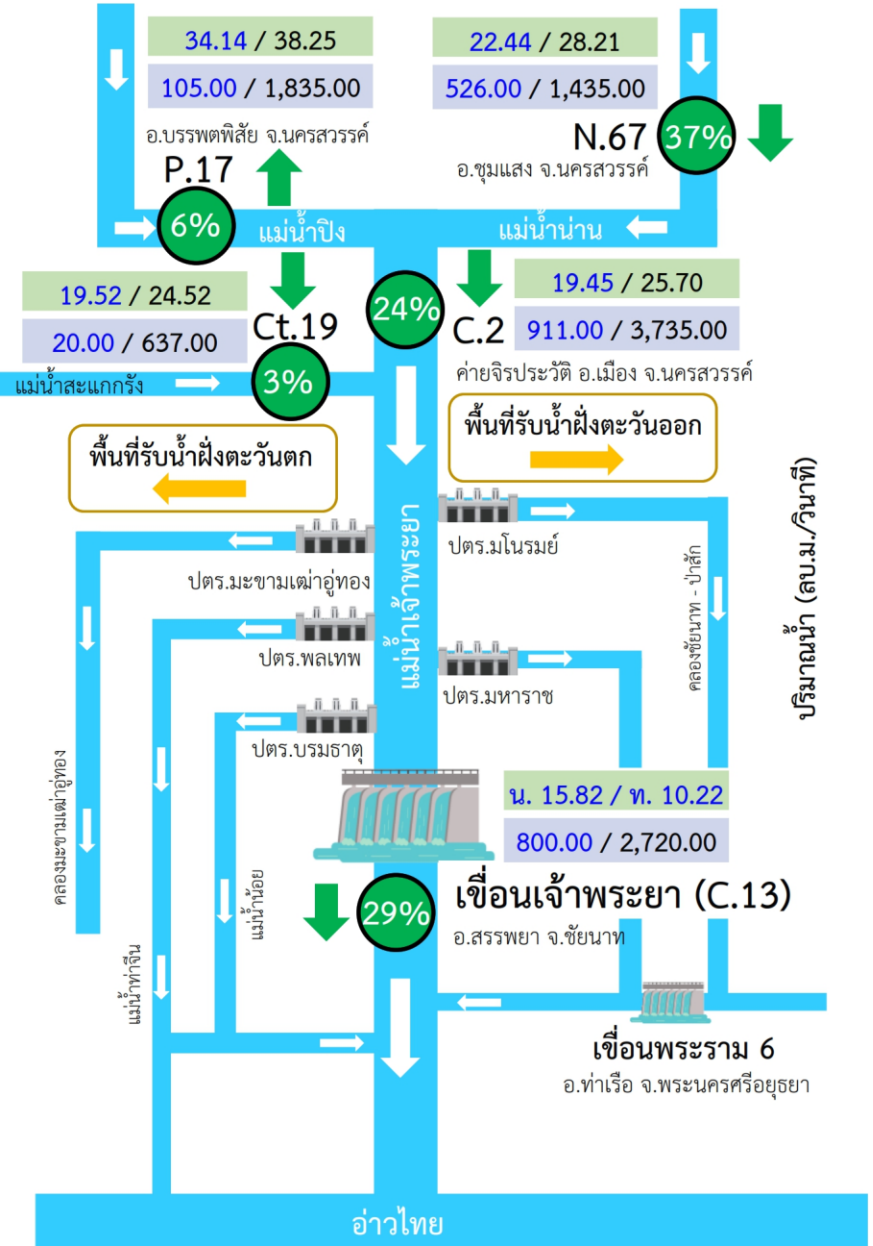

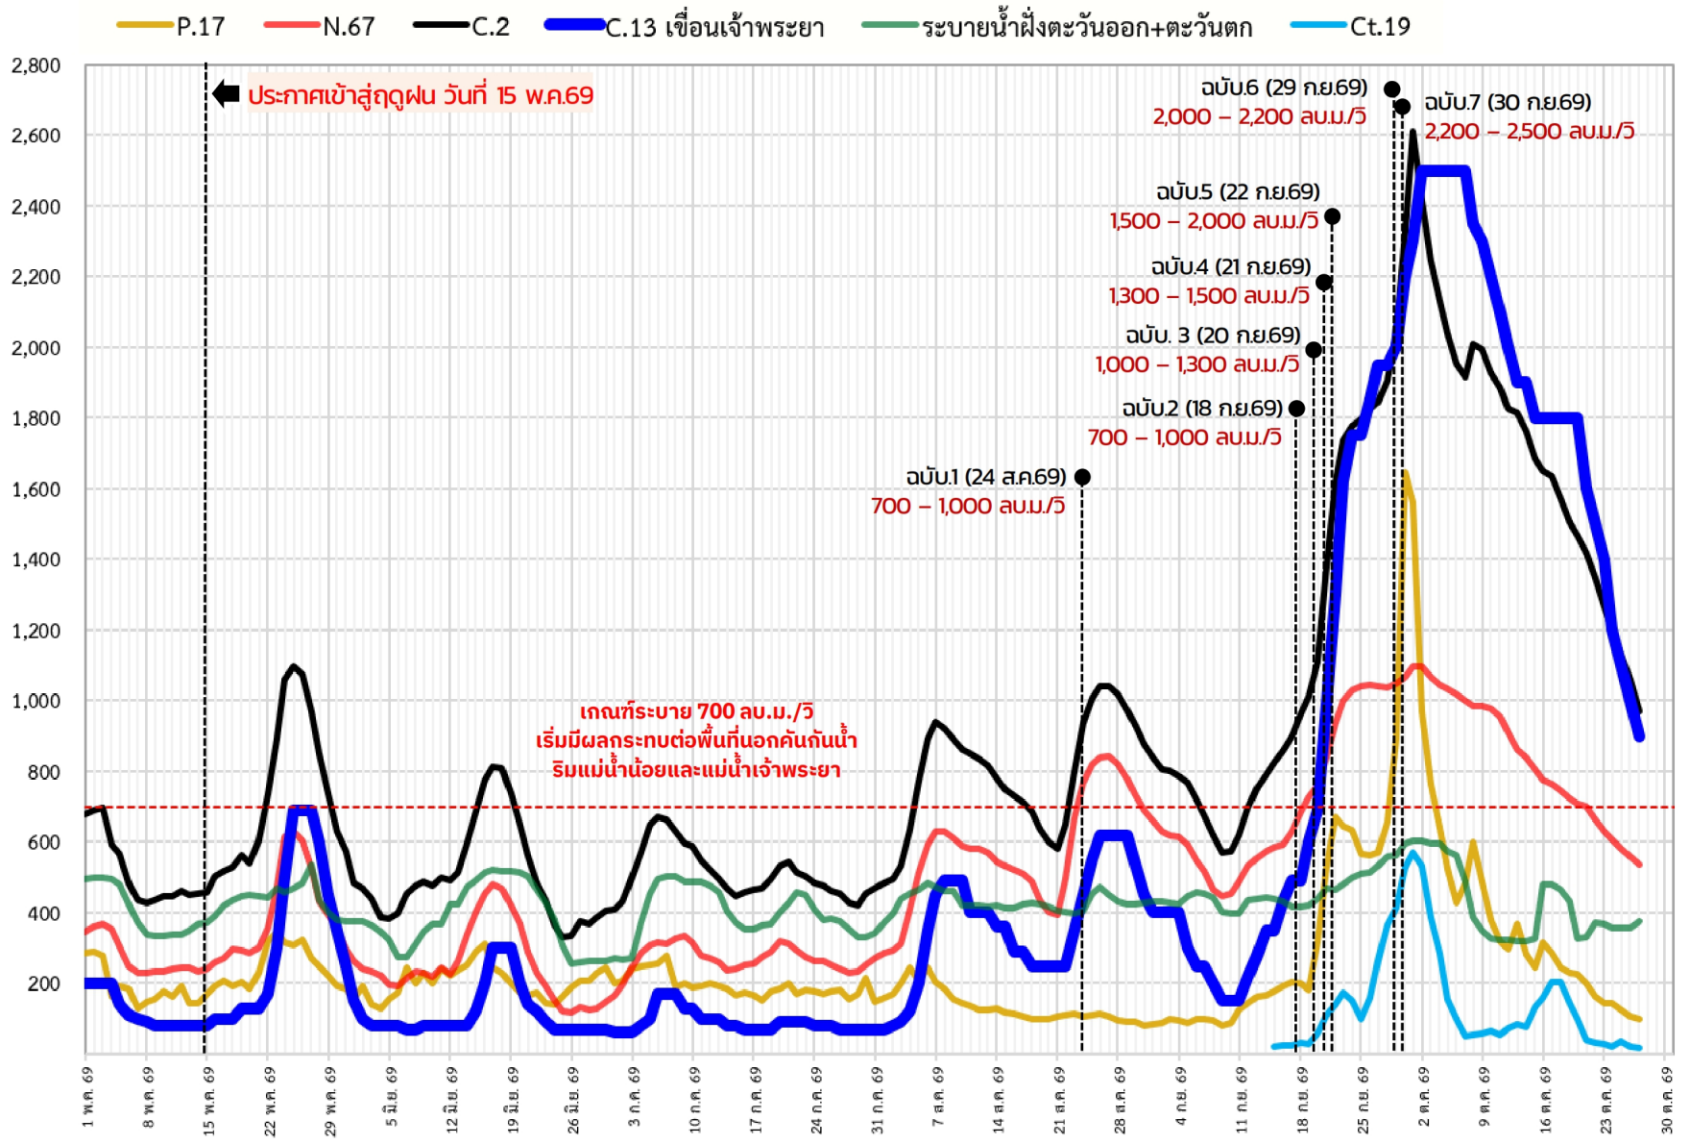

4

แผนและผลการจัดสรรน้ำ
ฤดูฝนปี 2569

แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืช ฤดูฝน ปี 2569

ภาพรวมทั้งประเทศ



ปริมาณน้ำต้นฤดู (1 พ.ค. 69)
45,357 ล้าน ลบ.ม.
ใช้การ 21,398 ล้าน ลบ.ม.
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง



แผนจัดสรรน้ำชลประทาน
14,956 ล้าน ลบ.ม.
(ไม่รวมการพร่องน้ำช่วงฤดูฝน)
ความต้องการใช้น้ำ **32,237** ล้าน ลบ.ม.



คาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี
16.97 ล้านไร่
ส่งเสริมให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก
ใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วง

แนะนำให้เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนและมีปริมาณฝนเพียงพอ



อุปโภค – บริโภค 10%
1,435 ล้าน ลบ.ม.



41% รักษาระบบนิเวศและอื่น ๆ
6,221 ล้าน ลบ.ม.



เกษตรกรรม 47%
7,045 ล้าน ลบ.ม.



2% ภาคอุตสาหกรรม
255 ล้าน ลบ.ม.

4 เขื่อนหลัก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
(เขื่อนภูมิพล, สิริกิติ์, ป่าสักชลสิทธิ์, แควน้อยบำรุงแดน)

ปริมาณน้ำต้นฤดู
14,228 ล้าน ลบ.ม.
ใช้การ **7,533** ล้าน ลบ.ม.

แผนจัดสรรน้ำ
4,500 ล้าน ลบ.ม.
ความต้องการใช้น้ำ **10,653** ล้าน ลบ.ม.

คาดการณ์นาปี
8.08 ล้านไร่

อุปโภค - บริโภค: 570 (13%)	ระบบนิเวศและอื่น ๆ: 1,266 (28%)
เกษตรกรรม: 2,664 (59%)	อุตสาหกรรม: -

2 เขื่อนหลัก ลุ่มน้ำแม่กลอง
(เขื่อนศรีนครินทร์, วชิราลงกรณ)

ปริมาณน้ำต้นฤดู
18,517 ล้าน ลบ.ม.
ใช้การ **5,240** ล้าน ลบ.ม.

แผนจัดสรรน้ำ
4,000 ล้าน ลบ.ม.
ความต้องการใช้น้ำ **3,999** ล้าน ลบ.ม.

คาดการณ์นาปี
0.89 ล้านไร่

อุปโภค - บริโภค: 490 (12%)	ระบบนิเวศและอื่น ๆ: 1,340 (34%)
เกษตรกรรม: 2,170 (54%)	อุตสาหกรรม: -

การบริหารจัดการน้ำ ฤดูฝน ปี 2569

ภาพรวมทั้งประเทศ

ต้นฤดูฝน

ปริมาณน้ำ 1 พ.ค. 69
(อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง)

45,357 ล้าน ลบ.ม.

ใช้การ **21,398** ล้าน ลบ.ม.


วางแผน

ความต้องการใช้น้ำ ฤดูฝน ปี 2569	**32,237**	ล้าน ลบ.ม.
แผนจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2569	**14,956**	ล้าน ลบ.ม.

แผนแยกกิจกรรม

- อุปโภค – บริโภค **1,435** ล้าน ลบ.ม. (10%)
- รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ **6,221** ล้าน ลบ.ม. (41%)
- เกษตรกรรม **7,045** ล้าน ลบ.ม. (47%)
- อุตสาหกรรม **255** ล้าน ลบ.ม. (2%)

น้ำกักเก็บ

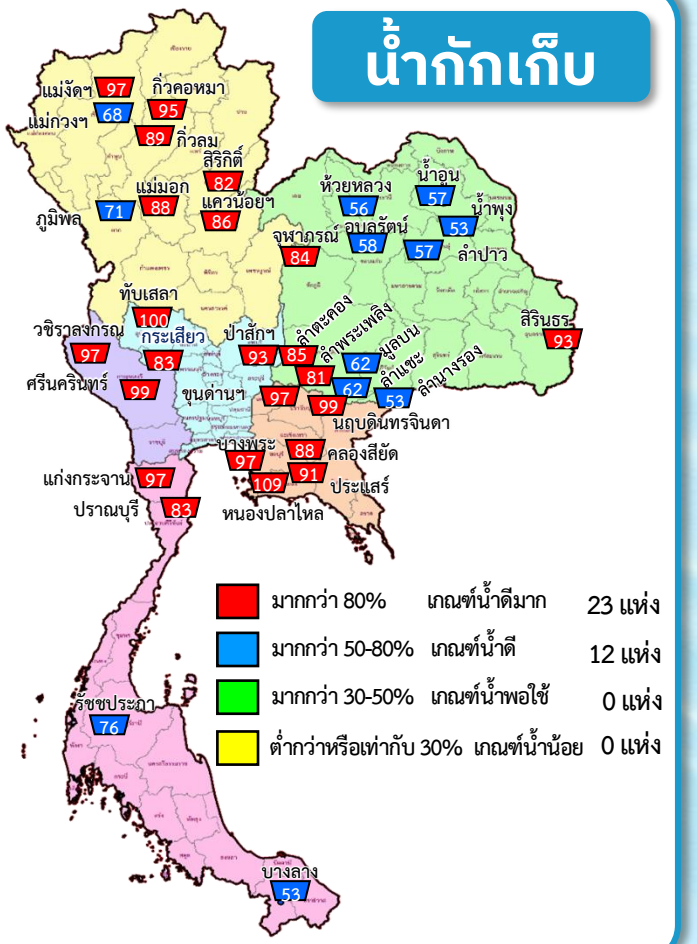

การเพาะปลูกข้าวนาปี 2569 (21 ต.ค. 69)

แผนนาปี	เพาะปลูกแล้ว	เก็บเกี่ยว
16.97 ล้านไร่	**15.89** ล้านไร่ (94%)	**8.12** ล้านไร่ (48%)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ต.ค. 69

ปัจจุบัน

ปริมาณน้ำเก็บกัก
64,192 ล้าน ลบ.ม. (84%)

ปริมาณน้ำใช้การ
40,215 ล้าน ลบ.ม. (76%)
(อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง)

จัดสรรน้ำไปแล้ว

จัดสรรน้ำไปแล้ว (1 พ.ค. 69 – 28 ต.ค. 69)
25,189 ล้าน ลบ.ม. (168% จากแผนฯ)

คงเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรอีก
มากกว่าแผนฯ **10,233** ล้าน ลบ.ม. (68% จากแผนฯ)

คาดการณ์น้ำเก็บกัก 1 พ.ย. 69

(อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่+อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง)
64,472 ล้าน ลบ.ม. (84%)

ปริมาณน้ำเก็บกัก 1 พ.ย. 68
67,568 ล้าน ลบ.ม. (88%)
น้อยกว่าปี 2568 จำนวน **3,096** ล้าน ลบ.ม.(4%)

การบริหารจัดการน้ำ ฤดูฝน ปี 2569

ลุ่มเจ้าพระยา

ต้นฤดูฝน

ปริมาณน้ำต้นทุน 1 พ.ค. 69
(4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา)

14,228 ล้าน ลบ.ม.

ใช้การ 7,533 ล้าน ลบ.ม.

วางแผน


ความต้องการใช้น้ำ ฤดูฝน ปี 2569 **10,653** ล้าน ลบ.ม.

แผนจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2569 **4,500** ล้าน ลบ.ม.

แผนแยกกิจกรรม

- อุปโภค – บริโภค: **570** ล้าน ลบ.ม. (13%)
- รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ: **1,266** ล้าน ลบ.ม. (28%)
- เกษตรกรรม: **2,664** ล้าน ลบ.ม. (59%)
- อุตสาหกรรม: -

น้ำกักเก็บ

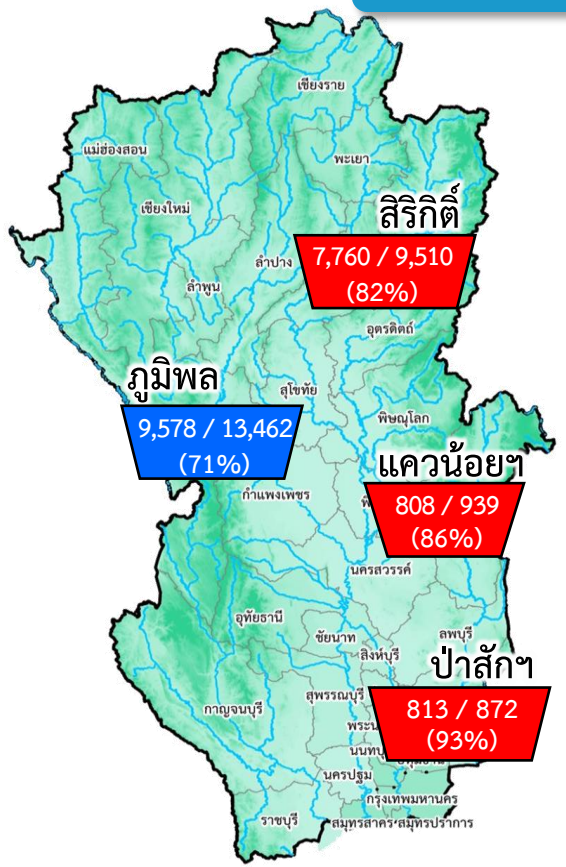

การเพาะปลูกข้าวนาปี 2569 (21 ต.ค. 69)

แผนนาปี	เพาะปลูกแล้ว	เก็บเกี่ยว
8.08 ล้านไร่	7.64 ล้านไร่ (94%)	6.76 ล้านไร่ (84%)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ต.ค. 69

ปัจจุบัน

ปริมาณน้ำเก็บกัก
18,960 ล้าน ลบ.ม. (77%)

ปริมาณน้ำใช้การ
12,252 ล้าน ลบ.ม. (68%)
(เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์)

จัดสรรน้ำไปแล้ว

จัดสรรน้ำไปแล้ว (1 พ.ค. 69 – 28 ต.ค. 69)
6,815 ล้าน ลบ.ม. (151% จากแผนฯ)

คงเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรอีก
มากกว่าแผนฯ **2,315** ล้าน ลบ.ม. (51% จากแผนฯ)

คาดการณ์น้ำเก็บกัก 1 พ.ย. 69

19,404 ล้าน ลบ.ม. (78%)

ปริมาณน้ำเก็บกัก 1 พ.ย. 68
23,940 ล้าน ลบ.ม. (97%)
น้อยกว่าปี 2568 จำนวน 4,536 ล้าน ลบ.ม.(18%)

การบริหารจัดการน้ำ ฤดูฝน ปี 2569

ลุ่มน้ำแม่กลอง

ต้นฤดูฝน

ปริมาณน้ำต้นทุน 1 ก.ค. 69
(2 เขื่อนหลักลุ่มน้ำแม่กลอง)

17,488 ล้าน ลบ.ม.

ใช้การ 4,211 ล้าน ลบ.ม.


วางแผน

ความต้องการใช้น้ำ ฤดูฝน ปี 2569	3,999	ล้าน ลบ.ม.
แผนจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2569	4,000	ล้าน ลบ.ม.

แผนแยกกิจกรรม

- อุปโภค – บริโภค: 490 ล้าน ลบ.ม. (12%)
- รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ: 1,340 ล้าน ลบ.ม. (34%)
- เกษตรกรรม: 2,170 ล้าน ลบ.ม. (54%)
- อุตสาหกรรม: -

น้ำกักเก็บ

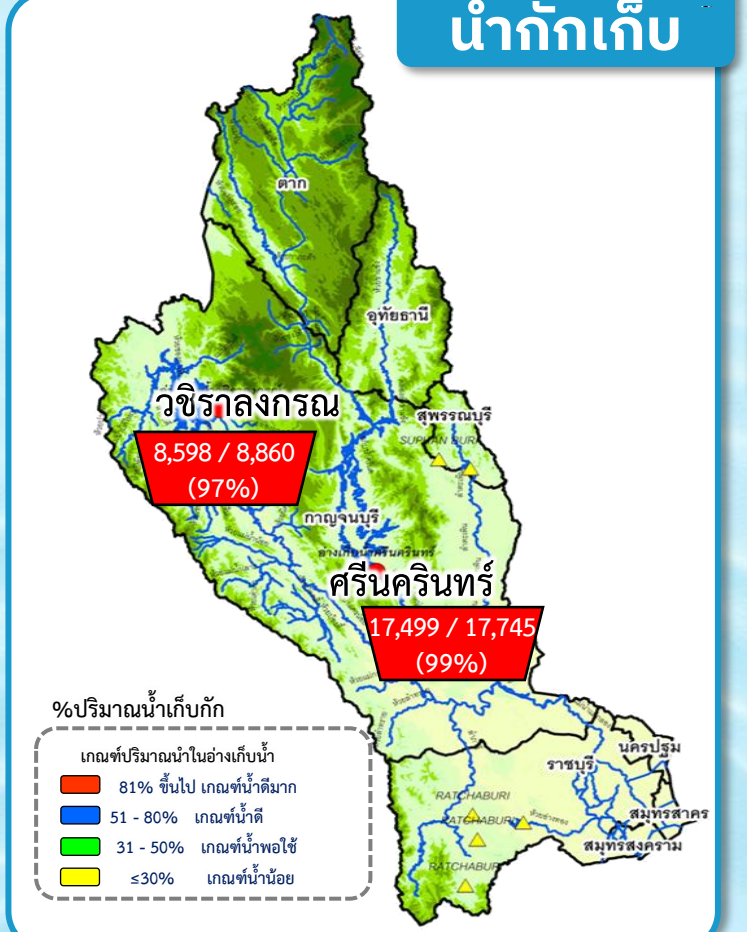

การเพาะปลูกข้าวนาปี 2569 (21 ต.ค. 69)

แผนนาปี	เพาะปลูกแล้ว	เก็บเกี่ยว
0.89 ล้านไร่	0.88 ล้านไร่ (99%)	0.23 ล้านไร่ (26%)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ต.ค. 69

ปัจจุบัน

ปริมาณน้ำเก็บกัก

26,097 ล้าน ลบ.ม. (98%)

ปริมาณน้ำใช้การ

12,820 ล้าน ลบ.ม. (96%)

(เขื่อนวชิราลงกรณ และศรีนครินทร์)

จัดสรรน้ำไปแล้ว

จัดสรรน้ำไปแล้ว (1 ก.ค. 69 – 28 ต.ค. 69)

3,114 ล้าน ลบ.ม. (78% จากแผนฯ)

คงเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรอีก

886 ล้าน ลบ.ม. (22% จากแผนฯ)

คาดการณ์น้ำเก็บกัก 1 ม.ค. 70

26,136 ล้าน ลบ.ม. (98%)

ปริมาณน้ำเก็บกัก 1 ม.ค. 69

23,420 ล้าน ลบ.ม. (83%)

น้อยกว่าปี 2569 จำนวน 2,716 ล้าน ลบ.ม.(10%)

5


แผนและผล
การเพาะปลูก

แผนผลการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝน ปี 2569


ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2569

ภาค	ข้าวนาปี					พืชไร่-พืชผัก				รวม				
	แผน (ล้านไร่)	ผล (ล้านไร่)	%	เสียหาย (ไร่)	เกี่ยว (ล้านไร่)	แผน (ล้านไร่)	ผล (ล้านไร่)	%	เกี่ยว (ล้านไร่)	แผน (ล้านไร่)	ผล (ล้านไร่)	%	เสียหาย (ไร่)	เกี่ยว (ล้านไร่)
เหนือ	2.61	2.45	94		0.72	0.06	0.04	68	0.01	2.67	2.49	93		0.74
ตะวันออกเฉียงเหนือ	3.72	3.49	94		0.09	0.04	0.02	66	0.003	3.76	3.51	93		0.09
กลาง	0.21	0.01	6		0.01	0.02	0.01	82		0.23	0.03	12		0.01
ตะวันออก	0.92	0.93	101	0.04	0.22	0.03	0.01	54	0.002	0.94	0.94	100	0.04	0.22
ตะวันตก	1.07	1.21	112		0.23	0.26	0.22	86	0.01	1.33	1.43	107		0.24
ใต้	0.35	0.17	50		0.10	0.07	0.01	12	0.01	0.42	0.18	43		0.10
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	8.08	7.64	94		6.76	0.12	0.10	84	0.07	8.20	7.74	94		6.83
ทั้งประเทศ	**16.97**	**15.89**	**94**	**0.04**	**8.12**	**0.58**	**0.42**	**72**	**0.11**	**17.55**	**16.32**	**93**	**0.04**	**8.23**

กราฟเปรียบเทียบผลการปลูกข้าวนาปี
รายสัปดาห์ในเขตทั้งประเทศ

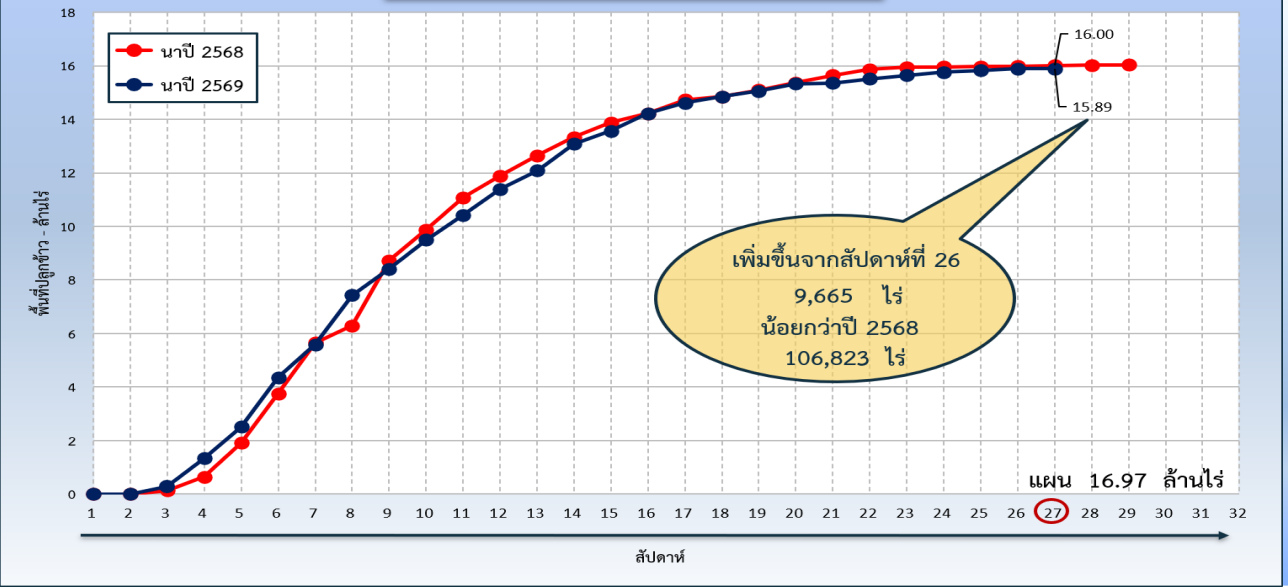

กราฟเปรียบเทียบผลการปลูกข้าวนาปี
รายสัปดาห์ในเขตลุ่มเจ้าพระยา

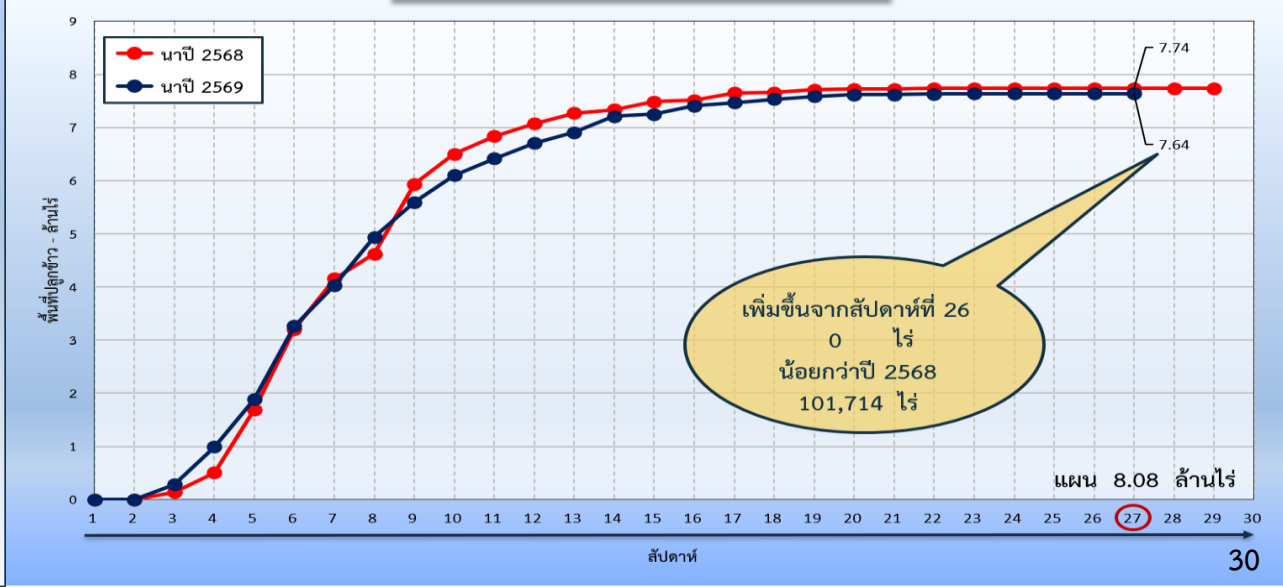

พื้นที่ปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

พื้นที่คาดการณ์นาปี ปี 2569
จำนวน 8.08 ล้านไร่

เพาะปลูกแล้ว 7.64 ล้านไร่

เจริญเติบโตและรอเก็บเกี่ยว 0.88 ล้านไร่

- อายุ 4 สัปดาห์ 2,000 ไร่ (30 ก.ย. 69) ต้องการใช้น้ำ 0.96 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 5 สัปดาห์ 3,000 ไร่ (23 ก.ย. 69) ต้องการใช้น้ำ 1.36 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 6 สัปดาห์ 5,349 ไร่ (16 ก.ย. 69) ต้องการใช้น้ำ 2.12 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 7 สัปดาห์ 2,419 ไร่ (9 ก.ย. 69) ต้องการใช้น้ำ 0.84 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 8 สัปดาห์ 23,940 ไร่ (2 ก.ย. 69) ต้องการใช้น้ำ 6.98 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 9 สัปดาห์ 26,851 ไร่ (26 ส.ค. 69) ต้องการใช้น้ำ 6.32 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 10 สัปดาห์ 25,308 ไร่ (19 ส.ค. 69) ต้องการใช้น้ำ 4.48 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 11 สัปดาห์ 22,192 ไร่ (12 ส.ค. 69) ต้องการใช้น้ำ 2.91 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 12 สัปดาห์ 125,182 ไร่ (5 ส.ค. 69) ต้องการใช้น้ำ 11.05 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 13 สัปดาห์ 41,859 ไร่ (29 ก.ค. 69) ต้องการใช้น้ำ 2.07 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 14 สัปดาห์ 101,601 ไร่ (22 ก.ค. 69) ต้องการใช้น้ำ 1.66 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 15 สัปดาห์ 130,011 ไร่ (15 ก.ค. 69) ต้องการใช้น้ำ 1.05 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 16 สัปดาห์ 186,624 ไร่ (8 ก.ค. 69) ไม่ต้องการใช้น้ำ
- อายุ 17 สัปดาห์ 63,959 ไร่ (1 ก.ค. 69) ไม่ต้องการใช้น้ำ
- อายุ 18 สัปดาห์ 116,193 ไร่ (24 มิ.ย. 69) ไม่ต้องการใช้น้ำ

พื้นที่ 0.88 ล้านไร่ มีพื้นที่ปลูกข้าว 0.51 ล้านไร่
ที่ยังคงต้องการใช้น้ำอยู่ คิดเป็นน้ำจำนวน 41.80 ล้าน ลบ.ม.

เก็บเกี่ยว 6.76 ล้านไร่

นาปีต่อเนื่อง จำนวน 0.70 ล้านไร่

- อายุ 1 สัปดาห์ 82,583 ไร่ (21 ต.ค. 69) ต้องการใช้น้ำ 50.72 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 2 สัปดาห์ 56,931 ไร่ (14 ต.ค. 69) ต้องการใช้น้ำ 33.29 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 3 สัปดาห์ 89,367 ไร่ (7 ต.ค. 69) ต้องการใช้น้ำ 47.93 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 4 สัปดาห์ 73,452 ไร่ (30 ก.ย. 69) ต้องการใช้น้ำ 35.38 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 5 สัปดาห์ 119,164 ไร่ (23 ก.ย. 69) ต้องการใช้น้ำ 54.01 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 6 สัปดาห์ 106,980 ไร่ (16 ก.ย. 69) ต้องการใช้น้ำ 42.45 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 7 สัปดาห์ 62,798 ไร่ (9 ก.ย. 69) ต้องการใช้น้ำ 21.68 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 8 สัปดาห์ 44,951 ไร่ (2 ก.ย. 69) ต้องการใช้น้ำ 13.11 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 9 สัปดาห์ 41,082 ไร่ (26 ส.ค. 69) ต้องการใช้น้ำ 9.67 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 10 สัปดาห์ 18,971 ไร่ (19 ส.ค. 69) ต้องการใช้น้ำ 3.36 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่ 0.70 ล้านไร่
ต้องการใช้น้ำ 311.60 ล้าน ลบ.ม.

ลุ่มน้ำแม่กลอง

พื้นที่คาดการณ์นาปี ปี 2569
จำนวน 0.89 ล้านไร่

เพาะปลูกแล้ว 0.89 ล้านไร่

เจริญเติบโตและรอเก็บเกี่ยว 0.66 ล้านไร่

- อายุ 2 สัปดาห์ 3,215 ไร่ (14 ต.ค. 69) ต้องการใช้น้ำ 2.00 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 3 สัปดาห์ 2,179 ไร่ (7 ต.ค. 69) ต้องการใช้น้ำ 1.24 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 4 สัปดาห์ 3,697 ไร่ (30 ก.ย. 69) ต้องการใช้น้ำ 1.89 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 5 สัปดาห์ 16,241 ไร่ (23 ก.ย. 69) ต้องการใช้น้ำ 7.74 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 6 สัปดาห์ 145,229 ไร่ (16 ก.ย. 69) ต้องการใช้น้ำ 60.29 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 7 สัปดาห์ 17,344 ไร่ (9 ก.ย. 69) ต้องการใช้น้ำ 6.22 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 8 สัปดาห์ 160,039 ไร่ (2 ก.ย. 69) ต้องการใช้น้ำ 58.03 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 9 สัปดาห์ 69,668 ไร่ (26 ส.ค. 69) ต้องการใช้น้ำ 16.69 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 10 สัปดาห์ 56,695 ไร่ (19 ส.ค. 69) ต้องการใช้น้ำ 10.10 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 11 สัปดาห์ 33,174 ไร่ (12 ส.ค. 69) ต้องการใช้น้ำ 4.33 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 12 สัปดาห์ 135,271 ไร่ (5 ส.ค. 69) ต้องการใช้น้ำ 11.68 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 13 สัปดาห์ - ไร่ (29 ก.ค. 69) ต้องการใช้น้ำ - ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 14 สัปดาห์ 2,115 ไร่ (22 ก.ค. 69) ต้องการใช้น้ำ 0.06 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 15 สัปดาห์ 9,532 ไร่ (15 ก.ค. 69) ต้องการใช้น้ำ 0.07 ล้าน ลบ.ม.
- อายุ 16 สัปดาห์ 607 ไร่ (8 ก.ค. 69) ไม่ต้องการใช้น้ำ
- อายุ 17 สัปดาห์ 2,035 ไร่ (1 ก.ค. 69) ไม่ต้องการใช้น้ำ
- อายุ 18 สัปดาห์ 1,841 ไร่ (24 มิ.ย. 69) ไม่ต้องการใช้น้ำ

พื้นที่ 0.66 ล้านไร่ มีพื้นที่ปลูกข้าว 0.65 ล้านไร่
ที่ยังคงต้องการใช้น้ำอยู่ คิดเป็นจำนวน 170.34 ล้าน ลบ.ม.

เก็บเกี่ยว 0.23 ล้านไร่


นาปีต่อเนื่อง จำนวน 0.04 ล้านไร่

- อายุ 4 สัปดาห์ 43,237 ไร่ (30 ก.ย. 69) ต้องการใช้น้ำ 22.16 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่ 0.04 ล้านไร่
ต้องการใช้น้ำ 22.16 ล้าน ลบ.ม.

การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ 11 ทุ่ง ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปี 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2569

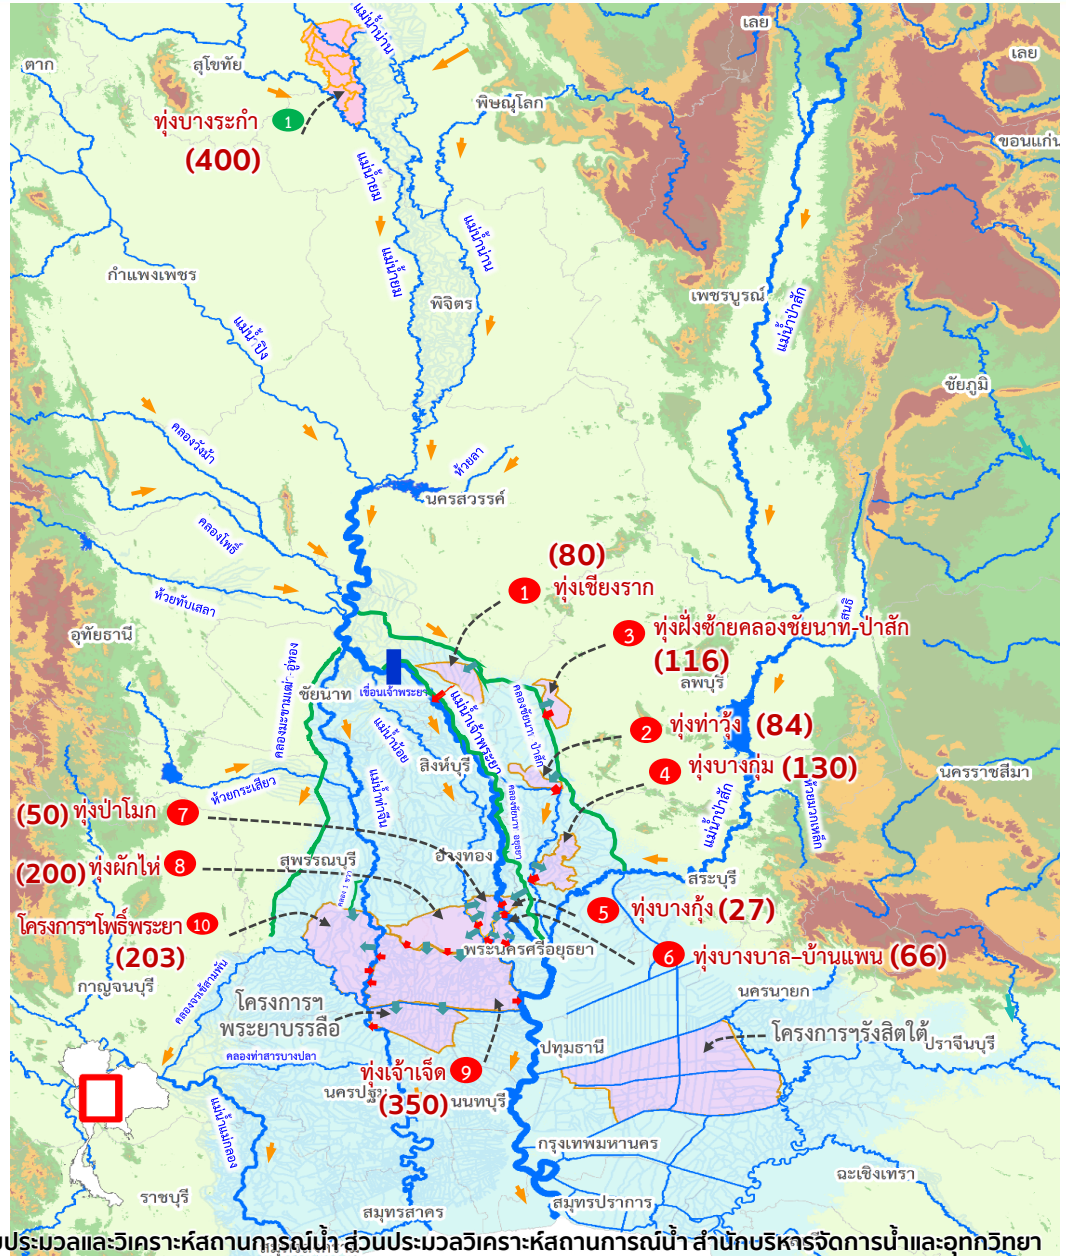

ทุ่งลุ่มต่ำตอนบน (บางระกำ)


(ศักยภาพรองรับน้ำได้ 400 ล้าน ลบ.ม.)
พื้นที่คาดการณ์ 276,744 ไร่ (เริ่มปลูก 1 เม.ย. 69)
ปลูกแล้ว 276,744 ไร่ คิดเป็น 100%
เก็บเกี่ยวแล้ว 276,744 คิดเป็น 100%

10 ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่าง

(ศักยภาพรองรับน้ำได้ 1,300 ล้าน ลบ.ม.)
พื้นที่คาดการณ์ 920,536 ไร่ (เริ่มปลูก 1 พ.ค. 69)
ปลูกแล้ว 920,536 ไร่ คิดเป็น 100%
เก็บเกี่ยวแล้ว 920,536 คิดเป็น 100%

ลำดับที่	พื้นที่ทุ่งรับน้ำ	ศักยภาพในการรับน้ำของทุ่ง (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่คาดการณ์เพาะปลูก (ไร่)	พื้นที่ปลูก		พื้นที่เก็บเกี่ยว	
				(ไร่)	%	(ไร่)	%
ทุ่งบางระกำ							
1	ทุ่งบางระกำ	400	276,744	276,744	100	276,744	100
10 ทุ่งลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่าง							
1	ทุ่งเชียงราก	80	38,300	38,300	100	38,300	100
2	ทุ่งท่าวุ้ง	84	45,700	45,700	100	45,700	100
3	ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก	116	72,680	72,680	100	72,680	100
4	ทุ่งบางกุ่ม	130	83,000	83,000	100	83,000	100
5	ทุ่งบางกุ้ง	27	17,000	17,000	100	17,000	100
6	ทุ่งบางบาล - บ้านแพน	66	23,911	23,911	100	23,911	100
7	ทุ่งป่าโมก	50	22,371	22,371	100	22,371	100
8	ทุ่งผักไห่	200	116,599	116,599	100	116,599	100
9	ทุ่งเจ้าเจ็ด	350	304,468	304,468	100	304,468	100
10	โครงการฯ โพธิ์พระยา	203	196,507	196,507	100	196,507	100
รวม 10 ทุ่งลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่าง		**1,306**	**920,536**	**920,536**	**100**	**920,536**	**100**
รวม 11 ทุ่งลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา		**1,706**	**1,197,280**	**1,197,280**	**100**	**1,197,280**	**100**

การรับน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ 11 ทุ่ง

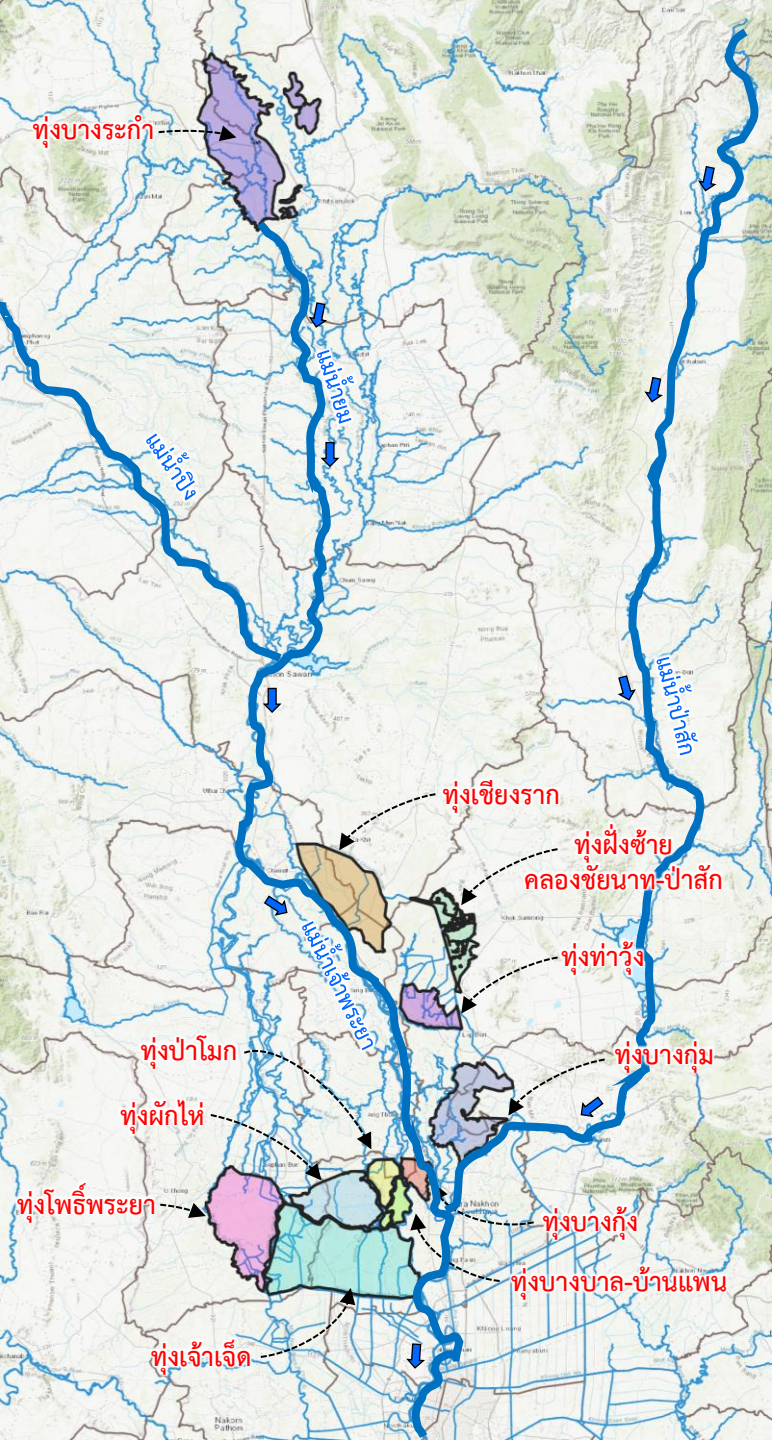

ตารางคาดการณ์การระบายน้ำออกจากทุ่ง ณ วันที่ 28 ต.ค. 69

ที่	พื้นที่ลุ่มต่ำ	จุดตรวจวัด	ศักยภาพในการรับน้ำของทุ่ง (ล้าน ลบ.ม.)	รับน้ำตามประชาคม ปี 2569 (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำค้างทุ่ง (น้ำเตรียมแปลง) (ล้าน ลบ.ม.)	ระบายน้ำออกจากทุ่งอีก (ล้าน ลบ.ม.)	ศักยภาพการระบายน้ำเฉลี่ยปี 2569 (ลบ.ม./วิ)	คาดการณ์เริ่มระบายน้ำวันที่	คาดการณ์ระบายน้ำแล้วเสร็จวันที่	ระบายน้ำอีก (วัน)
พื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนบน											
1	ทุ่งบางระกำ	เหนือ ปตร.บางแก้ว	400.00	400.00	64.26	30.00	34.26	20.87	1 พ.ย. 69	15 พ.ย. 69	19
พื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่าง (ฝั่งตะวันออก)											
1	ทุ่งเชียงราก	เหนือ ปตร.บางโฉมศรี	80.00	80.00	70.45	15.32	55.13	14.50	26 ต.ค. 69	10 ธ.ค. 69	44
2	ทุ่งท่าวุ้ง	เหนือ ปตร.วัดมณีชลขันธ์	84.00	84.00	52.75	18.28	34.47	23.47	12 ต.ค. 69	13 พ.ย. 69	17
3	ทุ่งฝั่งซ้าย คลองชัยนาท-ป่าสัก	ระดับหลังคันจุดตรวจ (TCP008)	116.00	11.92	11.87	11.90	0.00	0.00	10 ต.ค. 69	22 ต.ค. 69	สิ้นสุดการระบาย
4	ทุ่งบางกุ่ม	ปตร.บางกุ่ม	130.00	76.00	50.16	33.20	16.96	10.33	12 ต.ค. 69	15 พ.ย. 69	19
5	ทุ่งบางกุ้ง	เหนือ ปตร.บางกุ้ง	27.00	27.00	27.29	6.80	20.49	6.98	31 ต.ค. 69	30 พ.ย. 69	34
รวมฝั่งตะวันออก			437.00	278.92	209.92	85.50	124.42	32.73	10 ต.ค. 69	10 ธ.ค. 69	44
พื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่าง (ฝั่งตะวันตก)											
6	ทุ่งบางบาล - บ้านแพน	ระดับ ถ. 3412	66.00	48.00	27.69	10.20	17.49	10.66	13 ต.ค. 69	15 พ.ย. 69	19
7	ทุ่งป่าโมก	หน้า ปตร.กฎี	50.00	50.00	43.12	10.00	33.12	11.27	25 ต.ค. 69	30 พ.ย. 69	34
8	ทุ่งผักไห่	ท้าย ปตร.รางเข้	200.00	200	360.83	60.00	300.83	102.41	26 ต.ค. 69	30 พ.ย. 69	34
9	ทุ่งเจ้าเจ็ด	ระดับน้ำในคลองเจ้าเจ็ด	350.00	220	220.32	150.00	70.32	23.25	28 ต.ค. 69	1 ธ.ค. 69	35
10	ทุ่งโพธิ์พระยา	ระดับพื้นนาในทุ่ง	203.00	0	192.41	19.15	173.26	16.17	15 พ.ย. 69	28 ก.พ. 70	124
รวมฝั่งตะวันตก			869.00	518	844.37	249.35	595.02	55.54	13 ต.ค. 69	28 ก.พ. 70	124
รวม 10 ทุ่งลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่าง			1,306.00	797	1,054.28	324.85	719.43	67.15	10 ต.ค. 69	28 ก.พ. 70	124
รวม 11 ทุ่งลุ่มต่ำเจ้าพระยา			1,706.00	1,197	1,118.54	364.85	753.69	70.35	10 ต.ค. 69	28 ก.พ. 70	124

หมายเหตุ

11 ทุ่ง ปริมาณน้ำปัจจุบัน

1,118.54 ล้าน ลบ.ม.

(93%ของแผนประชาคม)

ปริมาณน้ำค้างทุ่ง

(น้ำเตรียมแปลง)

364.85 ล้าน ลบ.ม.


6

คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างฯ

คาดการณ์ปริมาณน้ำต้นฤดูแล้งปี 2569/70 (1 พ.ย.69)


กรมชลประทาน

ปริมาณน้ำ วันที่ 1 พ.ย.68

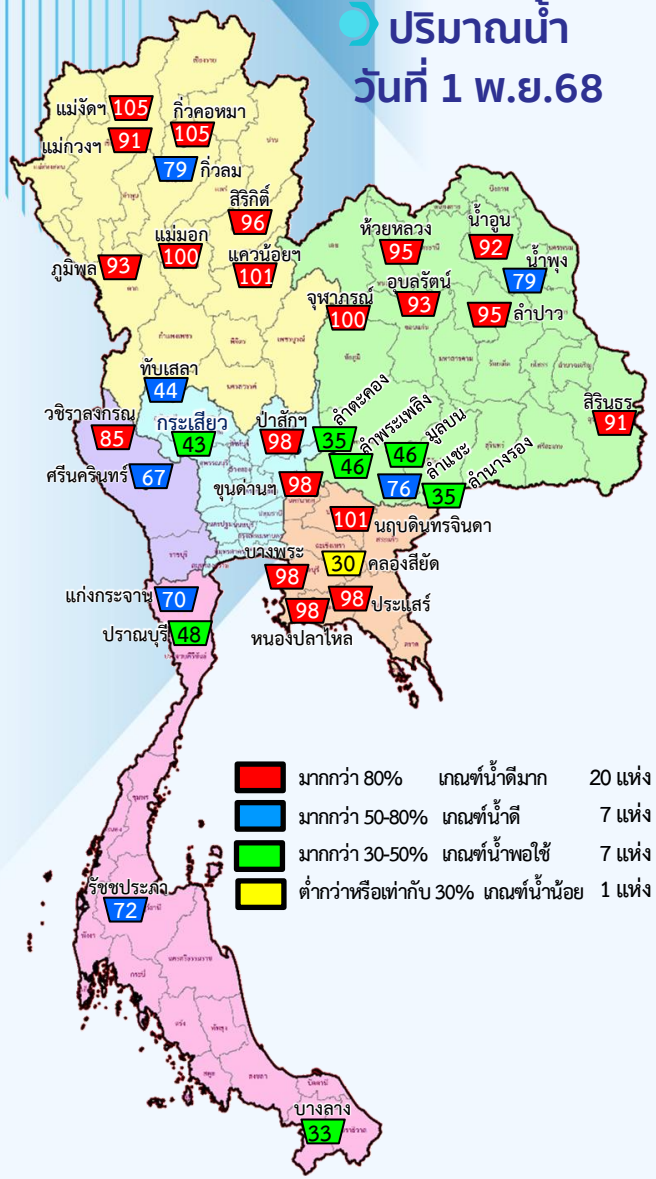


คาดการณ์ 1 พ.ย.69

ฝนคาดการณ์ 6 เดือน (TMD)
(คาดการณ์ ณ วันที่ 25 ต.ค.69)

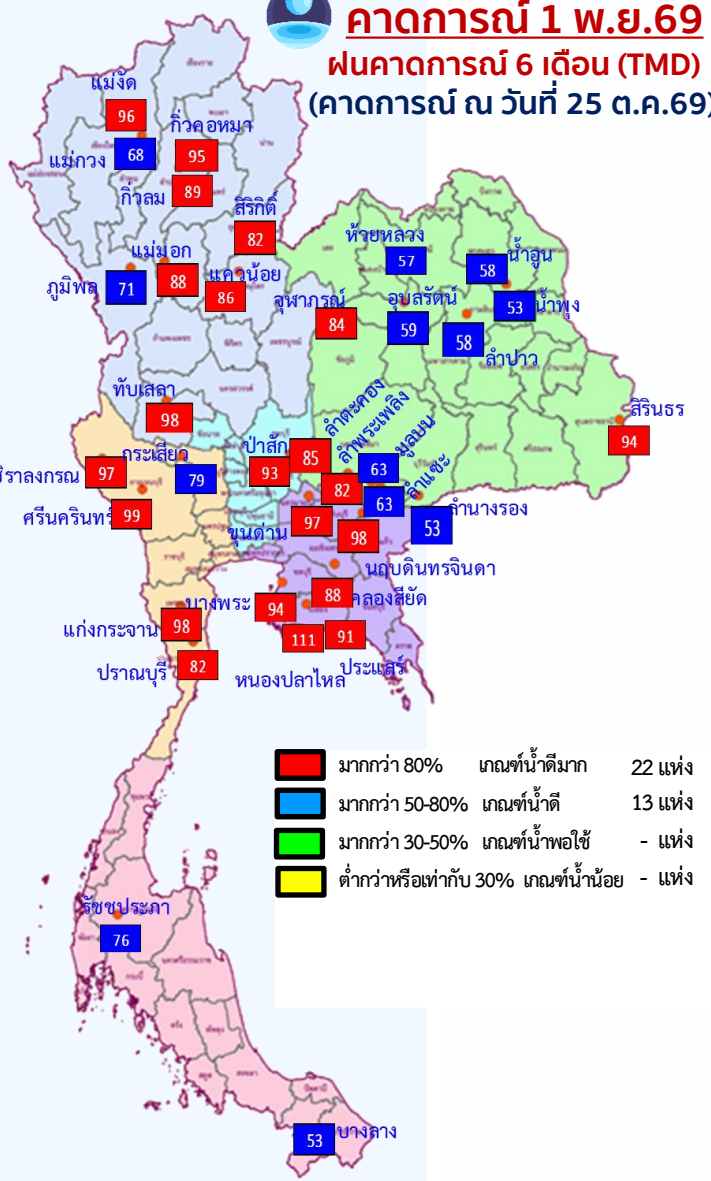


ทั้งประเทศ 35 อ่างฯ

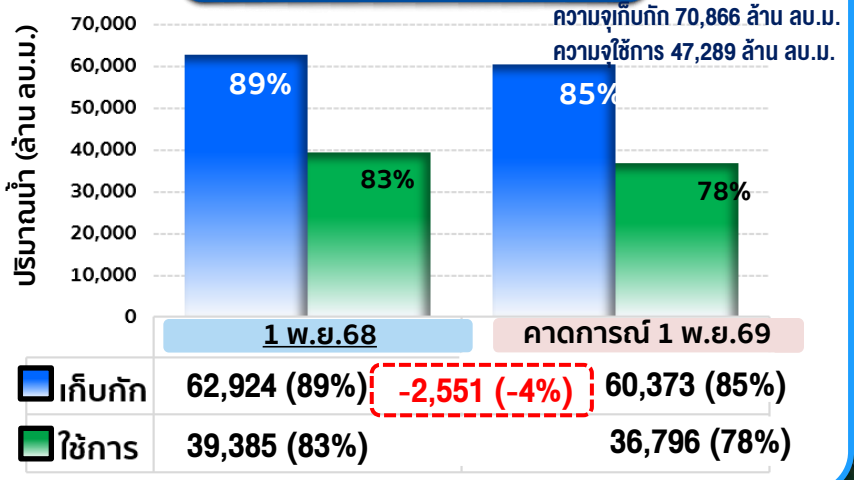

	1 พ.ย.68		คาดการณ์ 1 พ.ย.69
เก็บกัก	62,924 (89%)	-2,551 (-4%)	60,373 (85%)
ใช้การ	39,385 (83%)		36,796 (78%)

เจ้าพระยา 4 อ่างฯ

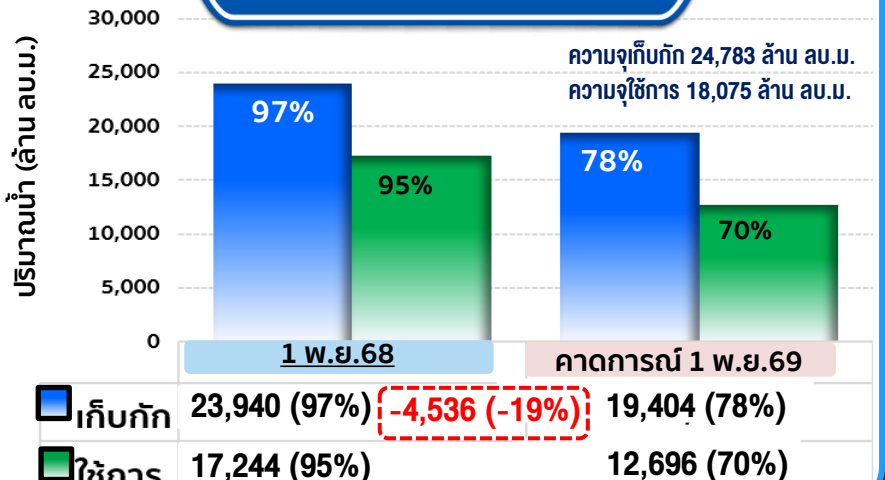

	1 พ.ย.68		คาดการณ์ 1 พ.ย.69
เก็บกัก	23,940 (97%)	-4,536 (-19%)	19,404 (78%)
ใช้การ	17,244 (95%)		12,696 (70%)

หมายเหตุ : ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำ กฟผ. ใช้ข้อมูลคาดการณ์จาก กฟผ. ณ วันที่ 19 ต.ค. 69

7

มาตรการบริหารจัดการน้ำ และการให้ความช่วยเหลือ

9 มาตรการ "รับมือฤดูฝน ปี 2569"

✓ กนช. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2569
✓ ครม. รับทราบ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2569



1. **คาดการณ์ชี้เป้า และแจ้งเตือน**



พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม และพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วง
(ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)

2. **ทบทวน ปรับปรุง**



เกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำ อาคารควบคุม บังคับน้ำอย่างบูรณาการในระบบลุ่มน้ำ และกลุ่มลุ่มน้ำ
(ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)

3. **เตรียมความพร้อม เครื่องจักรเครื่องมือ**



อาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ โทรมาตร บุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยง ให้สามารถรองรับสถานการณ์ในช่วงน้ำหลากและฝนทิ้งช่วง
(ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)

4. **ตรวจสอบ พร้อมติดตาม ความมั่นคง ปลอดภัย**



คันกั้นน้ำ ทำนบ พนังกั้นน้ำ
(ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)

5. **เพิ่มประสิทธิภาพ**



การระบายน้ำอย่างเป็นระบบ
(ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)

6. **จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำ ก่อนเกิดภัย**
(ตลอดช่วงฤดูฝน)



7. **เร่งพัฒนาและเก็บกักน้ำ**



ในแหล่งน้ำทุกประเภท ช่วงปลายฤดูฝน
(ตลอดช่วงฤดูฝน)

8. **สร้างการรับรู้ความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย**



ในการติดตามเฝ้าระวังรับมือภัยด้านน้ำ
(ก่อนฤดูฝน - ตลอดช่วงฤดูฝน)

9. **ติดตามประเมินผล**



ปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย
(ตลอดช่วงฤดูฝน)

www.onwr.go.th onwrnews ONWRnews

จัดทำโดย กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สทนช.

ผลการดำเนินงาน 9 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ย. 69

1 คาดการณ์ชี้เป้าและแจ้งเตือน



- พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย **1,352** จุด
- พื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วง **419** จุด

2 ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำ



- Rule Curve อ่างใหญ่ 1 แห่ง
- Rule Curve อ่างกลาง 14 แห่ง
- ปรับแผนเพาะปลูกพื้นที่ลุ่มต่ำ

3 เตรียมความพร่องเครื่องจักร/เครื่องมือ



เครื่องจักร
5,732 หน่วย
พร้อมใช้งาน
4,754 หน่วย (83%)

อาคารชลศาสตร์
3,481 แห่ง
พร้อมใช้งาน
3,468 หน่วย (99%)

สิ่งกีดขวางทางน้ำ
100 แห่ง
ดำเนินการแล้ว
81 แห่ง (81%)

ระบบโทรมาตร
631 สถานี
พร้อมใช้งาน
610 สถานี (97%)

4 ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย



คันกั้นน้ำ ทำนบและพนังกั้นน้ำ
รวม 529 แห่ง
พร้อมใช้งาน 502 แห่ง (95%)

5 เพิ่มประสิทธิภาการระบายน้ำ



กำจัดวัชพืช
แผน 6.6 ล้านตัน
ผล **6.36** ล้านตัน (96%)

ขุดลอกทางน้ำ
แผน 24.75 ล้าน ลบ.ม.
ผล **20.20** ล้าน ลบ.ม. (82%)

6 จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัย



- ร่วมเป็นคณะทำงาน
- สนับสนุนข้อมูล และเครื่องจักรเครื่องมือ

7 เร่งพัฒนาและเก็บกักน้ำ



- กักเก็บน้ำช่วงปลายฤดู
- สูบผันน้ำ เช่น พื้นที่ EEC

ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่ม
350.01 ล้าน ลบ.ม.

8 สร้างการรับรู้ความเสี่ยงและสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย



9,694 ครั้ง

31,067 คน

9 ติดตามและประเมินผล



- วิเคราะห์สถานการณ์
- บูรณาการหน่วยงาน
- สนับสนุนการตัดสินใจ

การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2569

แผน – ผลการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูก

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ต.ค. 69

ปริมาณน้ำเก็บกัก
64,241 ล้าน ลบ.ม. (84%)

ปริมาณน้ำใช้การ
40,262 ล้าน ลบ.ม. (76%)
(อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง)

การจัดสรรน้ำ

แผนจัดสรรน้ำชลประทานฤดูฝน ปี 2569
14,956 ล้าน ลบ.ม.

จัดสรรน้ำไปแล้ว (1 พ.ค. 69 – 26 ต.ค. 69)
24,867 ล้าน ลบ.ม. (166% จากแผนฯ)

คงเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรอีก
มากกว่าแผน 9,911 ล้าน ลบ.ม. (66% จากแผนฯ)

การเพาะปลูกข้าวนาปี 2569 (21 ต.ค. 69)

แผนนาปี	เพาะปลูกแล้ว	เก็บเกี่ยว
16.97 ล้านไร่	15.89 ล้านไร่ (94%)	8.12 ล้านไร่ (46%)

แผน - ผลกำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืช ด้วยเครื่องจักร

แผน 6,798,080 ตัน
ผล 6,865,901 ตัน
(101.00%)

กำจัดวัชพืช ด้วยแรงคน

แผน 46,823 ไร่
ผล 47,121 ไร่
(100.64%)

สรุปงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ
397,330,468 บาท
เบิกจ่ายแล้ว
394,640,311 บาท
(99.32%)
(ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 69)

แผน - ผลการขุดลอก

แผน 274 รายการ
ดำเนินการแล้ว 212 (77%)
ระหว่างดำเนินการ 56 (21%)
ยังไม่ดำเนินการ 6 (2%)

ปริมาณ ดินขุดลอก (ล้าน ลบ.ม.)

แผน 24.75
ดำเนินการแล้ว 20.79 (84%)
ระหว่างดำเนินการ 3.55 (14%)
ยังไม่ดำเนินการ 0.41 (2%)

สรุปงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ
1,110 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว
878.03 ล้านบาท (79%)
(ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 69)

เครื่องจักร - เครื่องมือ

ช่วยเหลือสะสม

รวม 69 จังหวัด
1,446 หน่วย

การช่วยเหลือทั้งหมด

เครื่องสูบน้ำ	1,018	เครื่อง
รถบรรทุกน้ำ	5	คัน
เครื่องผลักดันน้ำ	298	เครื่อง
เครื่องจักรอื่นๆ	125	หน่วย

(1 พ.ค. 69 – 25 ต.ค. 69)

การประชาสัมพันธ์

จำนวนครั้ง

สะสมรวม 16,457 ครั้ง

จำนวนเกษตรกรที่รับฟัง

สะสมรวม 39,634 คน
(1 พ.ค. 69 – 25 ต.ค. 69)

ชป.เตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ ฤดูฝน ปี 2569





โซนภาคเหนือ

สชป.1 – 4 และส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 - 2

เครื่องสูบน้ำ	373 เครื่อง
เครื่องผลักดันน้ำ	14 เครื่อง
รถบรรทุกน้ำ	54 คัน
เครื่องจักรอื่น ๆ	769 หน่วย
รวม	1,210 หน่วย



โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สชป.5 - 8 และ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 - 4

เครื่องสูบน้ำ	433 เครื่อง
เครื่องผลักดันน้ำ	110 เครื่อง
รถบรรทุกน้ำ	49 คัน
เครื่องจักรอื่น ๆ	720 หน่วย
รวม	1,312 หน่วย



โซนภาคกลางและตะวันตก

สชป.10 - 13 สำนักเครื่องจักรกล(ส่วนกลาง)
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 และ 7

เครื่องสูบน้ำ	805 เครื่อง
เครื่องผลักดันน้ำ	172 เครื่อง
รถบรรทุกน้ำ	37 คัน
เครื่องจักรอื่น ๆ	885 หน่วย
รวม	1,899 หน่วย



โซนภาคตะวันออก

สชป.9 และ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6

เครื่องสูบน้ำ	68 เครื่อง
เครื่องผลักดันน้ำ	34 เครื่อง
รถบรรทุกน้ำ	25 คัน
เครื่องจักรอื่น ๆ	236 หน่วย
รวม	363 หน่วย



โซนภาคใต้

สชป.14 - 17 และ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 8

เครื่องสูบน้ำ	235 เครื่อง
เครื่องผลักดันน้ำ	37 เครื่อง
รถบรรทุกน้ำ	38 คัน
เครื่องจักรอื่น ๆ	638 หน่วย
รวม	948 หน่วย




รวมทั้งประเทศ

เครื่องสูบน้ำ	1,914 เครื่อง
เครื่องผลักดันน้ำ	367 เครื่อง
รถบรรทุกน้ำ	203 คัน
เครื่องจักรอื่น ๆ	3,248 หน่วย

รวม 5,732 หน่วย

สรุปการให้ความช่วยเหลือเครื่องจักร-เครื่องมือ ฤดูฝน ปี2569

ประจำสัปดาห์
(19 ต.ค.69 – 25 ต.ค.69)

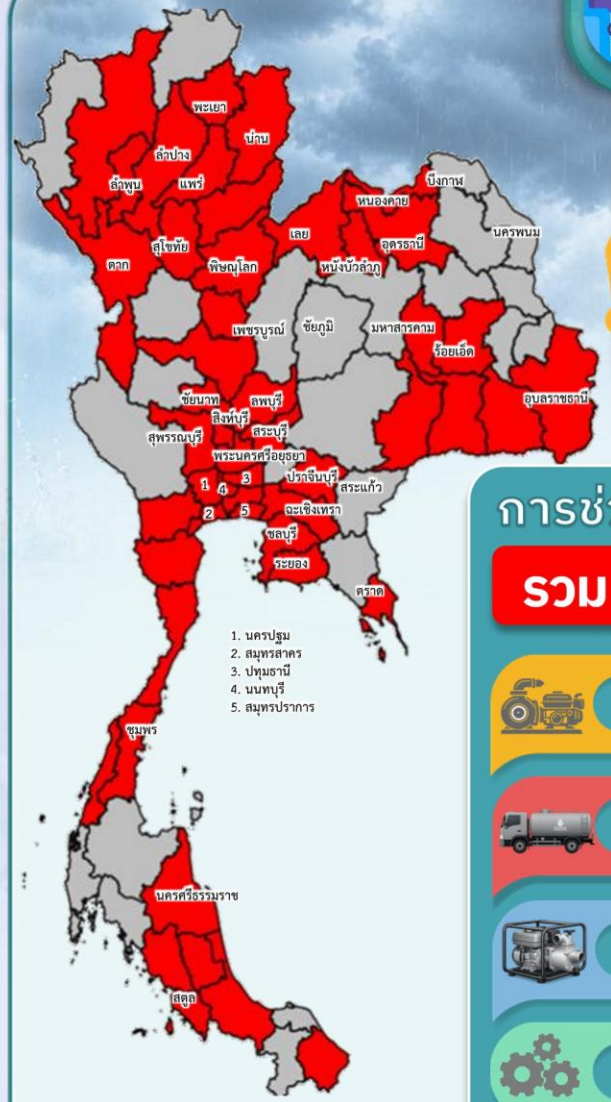

ช่วยเหลือประจำสัปดาห์
- รวม **52** จังหวัด

การช่วยเหลือทั้งหมด
รวม **804** หน่วย ผล

- เครื่องสูบน้ำ **539** เครื่อง
  ปริมาณน้ำที่สูบ 303,411,820 ลิตร
- รถบรรทุกน้ำ **-** คัน
  ปริมาณน้ำ - ลิตร
- เครื่องผลักดันน้ำ **212** เครื่อง
- เครื่องจักรอื่นๆ **53** หน่วย

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ต.ค.69

สะสมฤดูฝน
(1 พ.ค.69 – 25 ต.ค. 69)



ช่วยเหลือสะสม
- รวม **69** จังหวัด

การช่วยเหลือทั้งหมด
รวม **1,446** หน่วย ผล

- เครื่องสูบน้ำ **1,018** เครื่อง
  ปริมาณน้ำที่สูบ 361,963,114 ลิตร
- รถบรรทุกน้ำ **5** คัน
  ปริมาณน้ำ 432,000 ลิตร
- เครื่องผลักดันน้ำ **298** เครื่อง
- เครื่องจักรอื่นๆ **125** หน่วย

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2569

ระหว่างวันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2569

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)



จำนวน	เกษตรกร
10 ครั้ง	25 คน
สะสม 59 ครั้ง	สะสม 974 คน

คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)



จำนวน	เกษตรกร
15 ครั้ง	255 คน
สะสม 135 ครั้ง	สะสม 3,899 คน

กลุ่มผู้ใช้น้ำ



จำนวน	เกษตรกร
39 ครั้ง	575 คน
สะสม 1,724 ครั้ง	สะสม 34,761 คน

การประชาสัมพันธ์อื่นๆ



จำนวน
1,451 ครั้ง
สะสม 14,539 ครั้ง

จำนวนครั้งประชาสัมพันธ์

1,515 ครั้ง

สะสม 16,457 ครั้ง

จำนวนเกษตรกรที่รับการฟังประชาสัมพันธ์

855 คน

สะสม 39,634 คน

ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.69

8


สถานการณ์อุทกภัย ปี 2569

สรุปสถานการณ์อุทกภัย ปี 2569



อิทธิพลที่ส่งผลกระทบ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2569
เวลา 07.00 น.

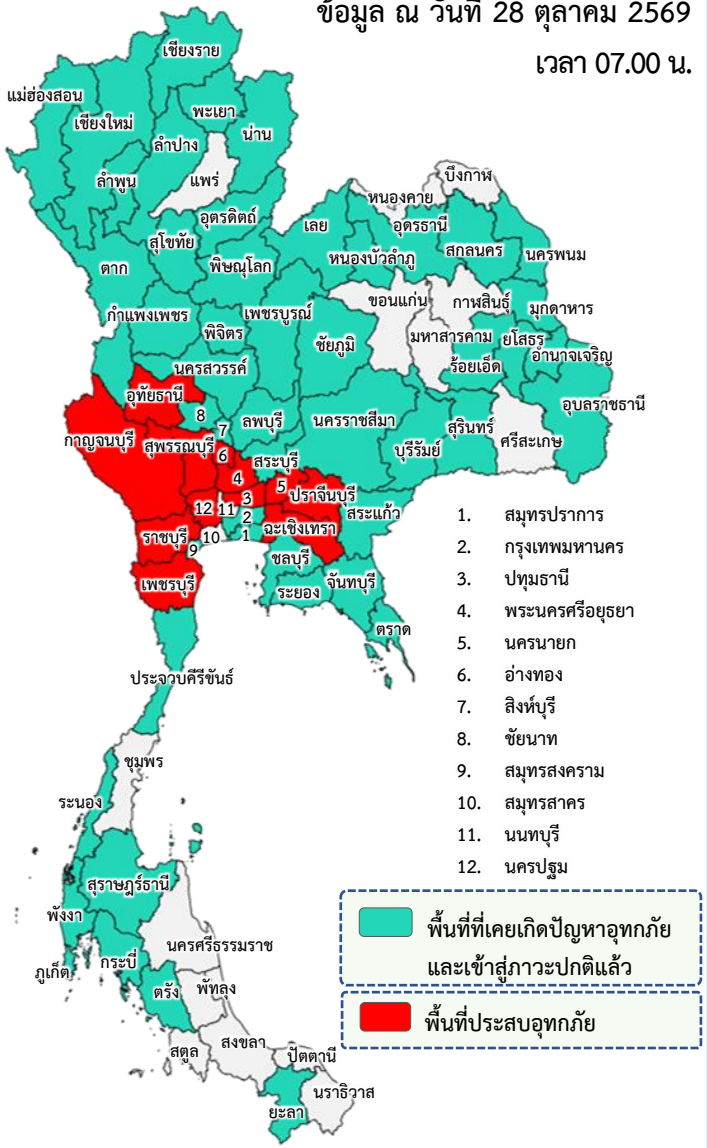


พื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2569 สาเหตุเนื่องจากอิทธิพล ดังนี้

1. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน (วันที่ 8 - 11 พ.ค. 69) (ประสบอุทกภัย 1 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง)
2. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทย (วันที่ 18 – 21 พ.ค. 69) (ประสบอุทกภัย 5 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน น่าน ลำปาง เพชรบูรณ์ และเพชรบุรี)
3. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบน (วันที่ 28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 69) (ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง เพชรบูรณ์ และเพชรบุรี)
4. ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย (วันที่ 10 - 12 มิ.ย. 69) (ประสบอุทกภัย 2 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ และตรัง)
5. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน (วันที่ 18 - 20 มิ.ย. 69) (ประสบอุทกภัย 2 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี และสระบุรี)
6. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน (วันที่ 28 มิ.ย. 69 – 3 ก.ค. 69) (ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย จันทบุรี ภูเก็ต และกระบี่)
7. ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ประเทศลาว และเวียดนามตอนบน เข้าสู่พายุโซนร้อน “ไมสัก” (MAYSAK) ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง (วันที่ 4 ก.ค. 69 – 5 ก.ค. 69) (ประสบอุทกภัย 1 จังหวัด ได้แก่ ตราด)
8. ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง (วันที่ 13 ก.ค. 69 – 14 ก.ค. 69) (ประสบอุทกภัย 1 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย)
9. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน (วันที่ 21 ก.ค. 69 – 25 ก.ค. 69) (ประสบอุทกภัย 1 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต)
10. ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย (วันที่ 28 ก.ค. 69 – 1 ส.ค. 69) (ประสบอุทกภัย 22 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู สกลนคร ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร จันทบุรี เพชรบูรณ์ สระบุรี และระนอง)
11. ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย (วันที่ 28 ส.ค. 69 – 7 ก.ย. 69) (ประสบอุทกภัย 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง นครพนม สระบุรี จันทบุรี และตราด)
12. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และอ่าวไทย (วันที่ 10 ก.ย. 69 – 13 ก.ย. 69) (ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย หนองบัวลำภู จันทบุรี และเพชรบูรณ์)

สรุปสถานการณ์อุทกภัย ปี 2569

อิทธิพลที่ส่งผลกระทบ


ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2569
เวลา 07.00 น.

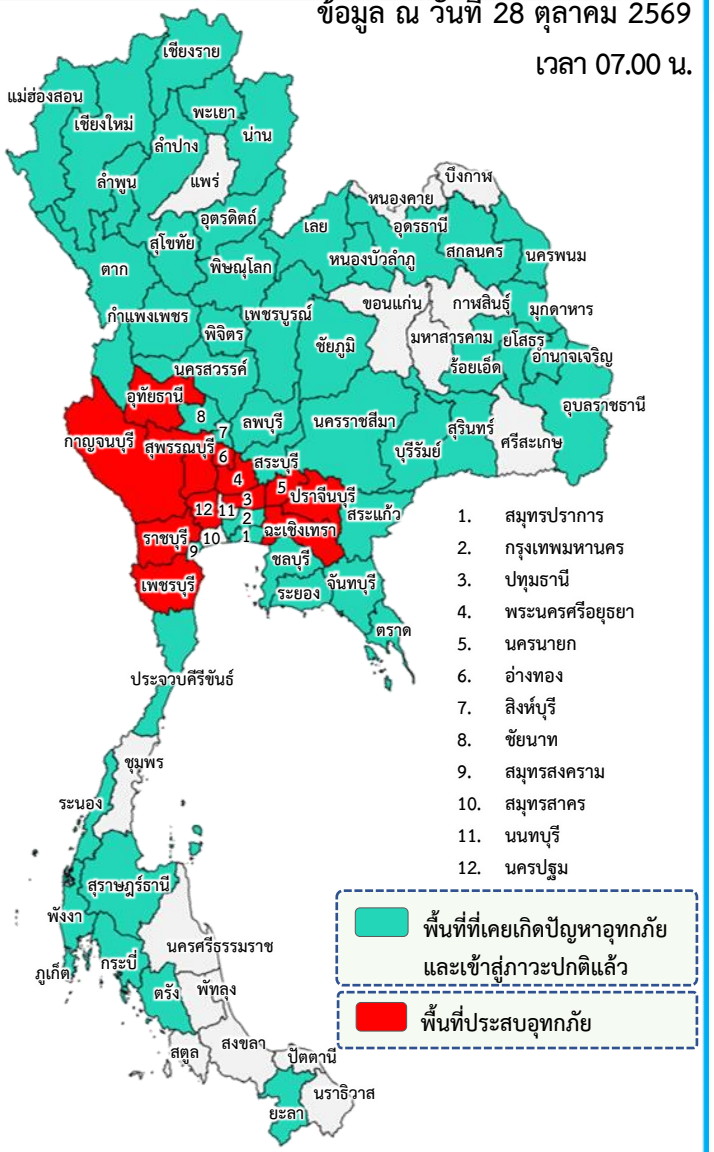

พื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2569 สาเหตุเนื่องจากอิทธิพล ดังนี้

13. ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย (วันที่ 13 ก.ย. 69 – 18 ก.ย. 69) (ประสบอุทกภัย 10 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง พิษณุโลก แพร่ หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด เพชรบูรณ์ กระบี่ พังงา และระนอง)
14. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนล่าง และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย (วันที่ 19 ก.ย. 69 – 22 ก.ย. 69) (ประสบอุทกภัย 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร เลย สระแก้ว ปราจีนบุรี ระยอง เพชรบูรณ์ สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อุทัยธานี และสุพรรณบุรี)
15. หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้บริเวณทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ขณะที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนลง (วันที่ 23 ก.ย. 69 – 29 ก.ย. 69) (ประสบอุทกภัย 30 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิจิตร นครสวรรค์ ตาก กำแพงเพชร ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว นครนายก จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง ตราด ลพบุรี เพชรบูรณ์ สระบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สิงห์บุรี อ่างทอง ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสงคราม และ พชรบุรี)
16. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ในขณะที่ยังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และอ่าวไทย ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน (วันที่ 4 ต.ค. 69 – 9 ต.ค. 69) (ประสบอุทกภัย 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำปาง กำแพงเพชร เลย และยะลา)
17. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และอ่าวไทย ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ (วันที่ 10 ต.ค. 69 – 14 ต.ค. 69) (ประสบอุทกภัย 2 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี)
18. ร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทย และภาคใต้ตอนล่าง ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน (วันที่ 19 ต.ค. 69 – ปัจจุบัน) (ประสบอุทกภัย 3 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี กระบี่)

สรุปสถานการณ์อุทกภัย ปี 2569

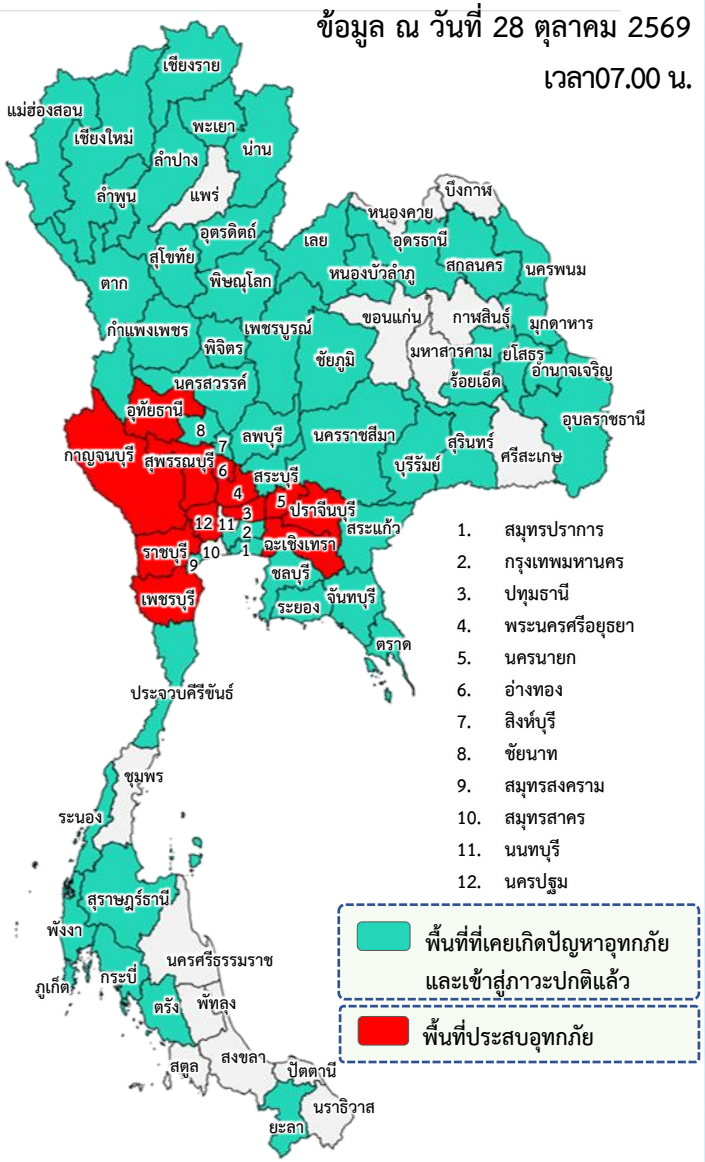

พื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งสิ้น 61 จังหวัด ดังนี้


จังหวัดที่เข้าสู่ภาวะปกติ 49 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชรอุดรธานี เลย สกลนคร หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ จันทบุรี สุรินทร์ สระแก้ว ชลบุรี ระยอง ตราดลพบุรี เพชรบูรณ์ สระบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท สิงห์บุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และยะลา

จังหวัดที่ประสบอุทกภัย 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี นครนายก ปทุมธานี นครปฐม ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี อ่างทอง อุทัยธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี

ลำดับ	วันเริ่มอุทกภัย	สชป.	ลุ่มน้ำ	จังหวัด	อำเภอ (จำนวน)	รายชื่ออำเภอ	จุดประสบภัย							พื้นที่ประสบภัย	
							ล้นตลิ่ง	ลำน้ำที่น้ำล้นตลิ่ง	น้ำป่าไหลหลาก	ท่วมขัง	ในเขตชลประทาน	นอกเขตชลประทาน	ระดับน้ำ (ม.)	ไร่	ครัวเรือน
1	10 ต.ค. 69	14	เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี	2	เขาย้อย เมืองเพชรบุรี	✓	คลองประดู่		✓	✓		0.20 - 0.50	5,200	150
2	27 ก.ย. 69	13	แม่กลอง	ราชบุรี	3	บ้านโป่ง โพธาราม เมืองราชบุรี	✓	แม่น้ำแม่กลอง	✓	✓	✓	✓	0.10 - 1.50	20,346	100
3	26 ก.ย. 69	9	บางปะกง	นครนายก	1	องครักษ์	✓	แม่น้ำนครนายก		✓	✓	✓	0.30 - 0.50		23,654
4	26 ก.ย. 69	11	เจ้าพระยา	ปทุมธานี	6	ธัญบุรี คลองหลวง หนองเสือ สามโคก เมืองปทุมธานี ลำลูกกา	✓	ค.1 - ค.3 ค.ระพีฯแยกใต้ คลองกลางพัฒนา		✓	✓	✓	0.10 - 1.65		20
5	24 ก.ย. 69	13	ท่าจีน	นครปฐม	4	บางเลน นครชัยศรี สามพราน กำแพงแสน	✓	แม่น้ำท่าจีน คลองเจดีย์บูชา คลองท่าผา-บางแก้ว คลองสัมปทวน คลองบางพระ คลองจินดา		✓	✓	✓	0.30 - 0.40	11,155	1,632
6	24 ก.ย. 69	11	บางปะกง	ฉะเชิงเทรา	6	พนมสารคาม บ้านโพธิ์ บางน้ำเปรี้ยว เมืองฉะเชิงเทรา บางคล้า ราชสาส์น	✓	คลองท่าลาด คลองบางขนาก คลองอุดมชลจร คลองประเวศบุรีรมย์	✓	✓	✓	✓	0.20	2,800	45
7	24 ก.ย. 69	13	แม่กลอง	กาญจนบุรี	3	หนองปรือ ท่ามะกา เมืองกาญจนบุรี	✓	อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน อ่างเก็บน้ำห้วยกระพ้อย แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำแควใหญ่		✓	✓	✓			
8	22 ก.ย. 69	12	เจ้าพระยา	อ่างทอง	2	วิเศษชัยชาญ เมืองอ่างทอง	✓	แม่น้ำน้อย คลอง ร.1 ว ม.น้อย 6 แม่น้ำเจ้าพระยา		✓		✓	0.10 - 1.00		87
9	22 ก.ย. 69	12	สระแกรกรัง	อุทัยธานี	1	เมืองอุทัยธานี	✓	แควตากแดด แม่น้ำเจ้าพระยา				✓	0.20 - 0.30		73
10	22 ก.ย. 69	9	บางปะกง	ปราจีนบุรี	5	กบินทร์บุรี ศรีมหาโพธิ เมืองปราจีนบุรี ประจันตคาม บ้านสร้าง	✓	แม่น้ำปราจีนบุรี ((Kgt.43A,Kgt.15A,Kgt.14,Kgt3)	✓	✓	✓	✓	0.10 - 1.50	2,250	210
11	21 ก.ย. 69	10	เจ้าพระยา	พระนครศรีอยุธยา	11	เสนา ผักไห่ บางบาล บางไทร พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางปะหัน ลาดบัวหลวง อุทัย บ้านแพรก บางซ้าย	✓	แม่น้ำน้อย แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก		✓		✓	0.10 - 0.60		50,697
12	18 ก.ย. 69	12	ท่าจีน	สุพรรณบุรี	10	บางปลาม้า สองพี่น้อง เมืองสุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ ศรีประจันต์ สามชุก เดิมบางนางบวช อู่ทอง ด่านช้าง หนองหญ้าไซ	✓	แม่น้ำท่าจีน คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง คลองท่าว้า		✓		✓	0.30 - 0.60		33,098
รวม					54		12		4	11	8	11		41,751	109,766

สรุปสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 07.00 น.

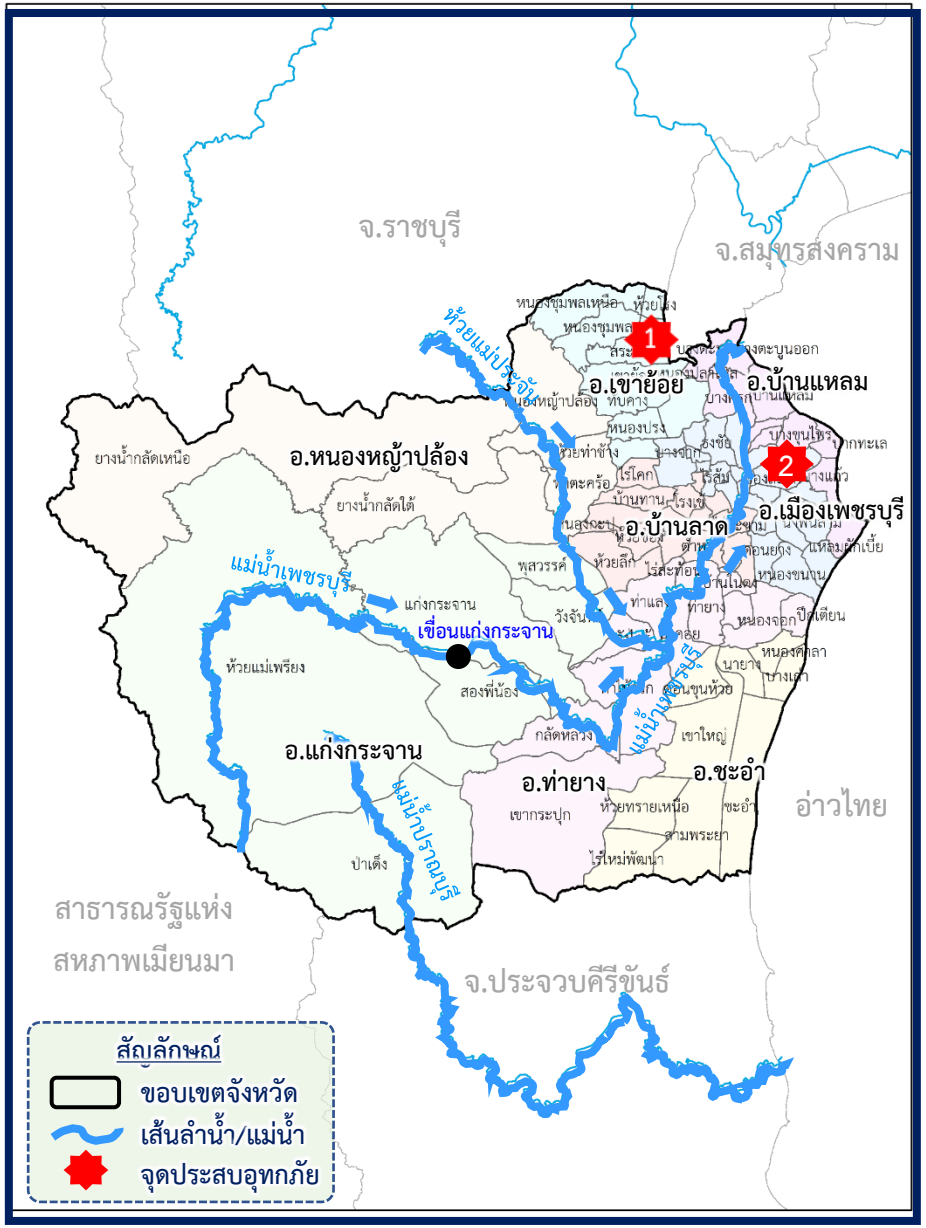

1. สาเหตุ

เนื่องจากเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 10 - 12 ต.ค. 69 โดยมีปริมาณฝนสะสมประมาณ 120 - 200 มม. ส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ ต.หนองชุมพลเหนือ, ต.หนองชุมพล และ ต.บางเค็ม ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวาเพิ่มสูงขึ้นและไหลลงสู่คลองบางเค็มเชื่อมกับคลองประดู่ เพื่อออกสู่ทะเลตามลำดับ

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

พื้นที่ประสบอุทกภัย รวมจำนวน **2 อำเภอ** ได้แก่ **อ.เขาย้อย** และ **อ.เมืองเพชรบุรี** รวมพื้นที่รับผลกระทบจำนวน 5,200 ไร่ 150 ครัวเรือน

3. รายละเอียด

ที่	วันเริ่มอุทกภัย	หมู่ที่ (จำนวน)	ตำบล (จำนวน)	อำเภอ	จุดประสบภัย						พื้นที่ประสบภัย		ประชากร (คน)	ระดับน้ำ (ม.)	การช่วยเหลือ
					ล้นตลิ่ง	ลำน้ำที่ล้นตลิ่ง	น้ำป่าไหลหลาก	ท่วมขัง	ในเขตชลประทาน	นอกเขตชลประทาน	ครัวเรือน	ไร่			
1	10 ต.ค. 69	3	1	เขาย้อย	✓	คลองประดู่	✓	✓	✓			4,000		0.20	
2	22 ต.ค. 69	1	1	เมืองเพชรบุรี				✓	✓		150	1,200		0.50	

4. การช่วยเหลือเพิ่มเติม

โครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักชลประทานที่ 14 ดำเนินการ**ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง** สูบน้ำจากคลองประดู่ลงสู่คลองขุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าว แจ้งเตือนข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ และเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย หากกรณีคาดการณ์ปริมาณฝนเพิ่มขึ้น

สรุปสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดราชบุรี

วันที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 07.00 น.



1. สาเหตุ

เนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 69 ปริมาณฝนสูงสุดที่อำเภอคลองลาน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่จำนวนมากและเกิดน้ำท่วมในพื้นที่

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

พื้นที่ประสบอุทกภัย รวมจำนวน **3 อำเภอ** ได้แก่ **อ.บ้านโป่ง อ.โพธาราม** และ **อ.เมืองราชบุรี** รวมพื้นที่รับผลกระทบจำนวน 20,346 ไร่ 100 ครัวเรือน

3. รายละเอียด

ที่	วันเริ่มอุทกภัย	หมู่ที่ (จำนวน)	ตำบล (จำนวน)	อำเภอ	จุดประสบภัย						พื้นที่ประสบภัย		ประชากร (คน)	ระดับน้ำ (ม.)	การช่วยเหลือ
					ล้นตลิ่ง	ลำน้ำที่ล้นตลิ่ง	น้ำป่าไหลหลาก	ท่วมขัง	ในเขตชลประทาน	นอกเขตชลประทาน	ครัวเรือน	ไร่			
1	27 ก.ย. 69	2	1	บ้านโป่ง	✓	แม่น้ำแม่กลอง	✓	✓	✓					0.30 – 1.20	
2	28 ก.ย. 69	12	4	โพธาราม	✓	แม่น้ำแม่กลอง	✓	✓	✓		100	9,080		0.30 – 1.50	
3	29 ก.ย. 69	12	6	เมืองราชบุรี	✓	แม่น้ำแม่กลอง	✓	✓	✓			11,266		0.10 – 1.20	

4. การช่วยเหลือเพิ่มเติม

โครงการชลประทานราชบุรี สำนักชลประทานที่ 13 ร่วมกับหน่วยงานปกครองท้องที่ เทศบาลและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้การช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของจำเป็นออกจากพื้นที่ พร้อมสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเมื่อได้รับการร้องขอ

สรุปสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดนครนายก

วันที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 07.00 น.



1. สาเหตุ

เนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จ.นครนายก เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 69 วัดปริมาณฝนสะสม 3 วัน สถานี NY.1B เขานางบวช 181.3 มม. ประกอบกับน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ลงสู่เขื่อนขุนด่านปราการชลเป็นจำนวนมาก มีความจำเป็นต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำมากขึ้น ส่งผลทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนครนายกและลำน้ำสาขา

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

พื้นที่ประสบอุทกภัย รวมจำนวน **1 อำเภอ** ได้แก่ **อ.องครักษ์** รวมพื้นที่รับผลกระทบจำนวน 23,654 ครัวเรือน

3. รายละเอียด


ที่	วันเริ่มอุทกภัย	หมู่ที่ (จำนวน)	ตำบล (จำนวน)	อำเภอ	จุดประสบภัย						พื้นที่ประสบภัย		ประชากร (คน)	ระดับน้ำ (ม.)	การช่วยเหลือ
					ล้นตลิ่ง	ลำน้ำที่ล้นตลิ่ง	น้ำป่าไหลหลาก	ท่วมขัง	ในเขตชลประทาน	นอกเขตชลประทาน	ครัวเรือน	ไร่			
1	28 ก.ย. 69	116	14	องครักษ์	✓	แม่น้ำนครนายก		✓	✓	✓	23,654			0.30 – 0.50	

4. การช่วยเหลือเพิ่มเติม

โครงการชลประทานนครนายก สำนักชลประทานที่ 9 ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมฝั่งแม่น้ำนครนายก และพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก ควรติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้น โดยมีการประสานหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าดูแลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

สรุปสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 07.00 น.

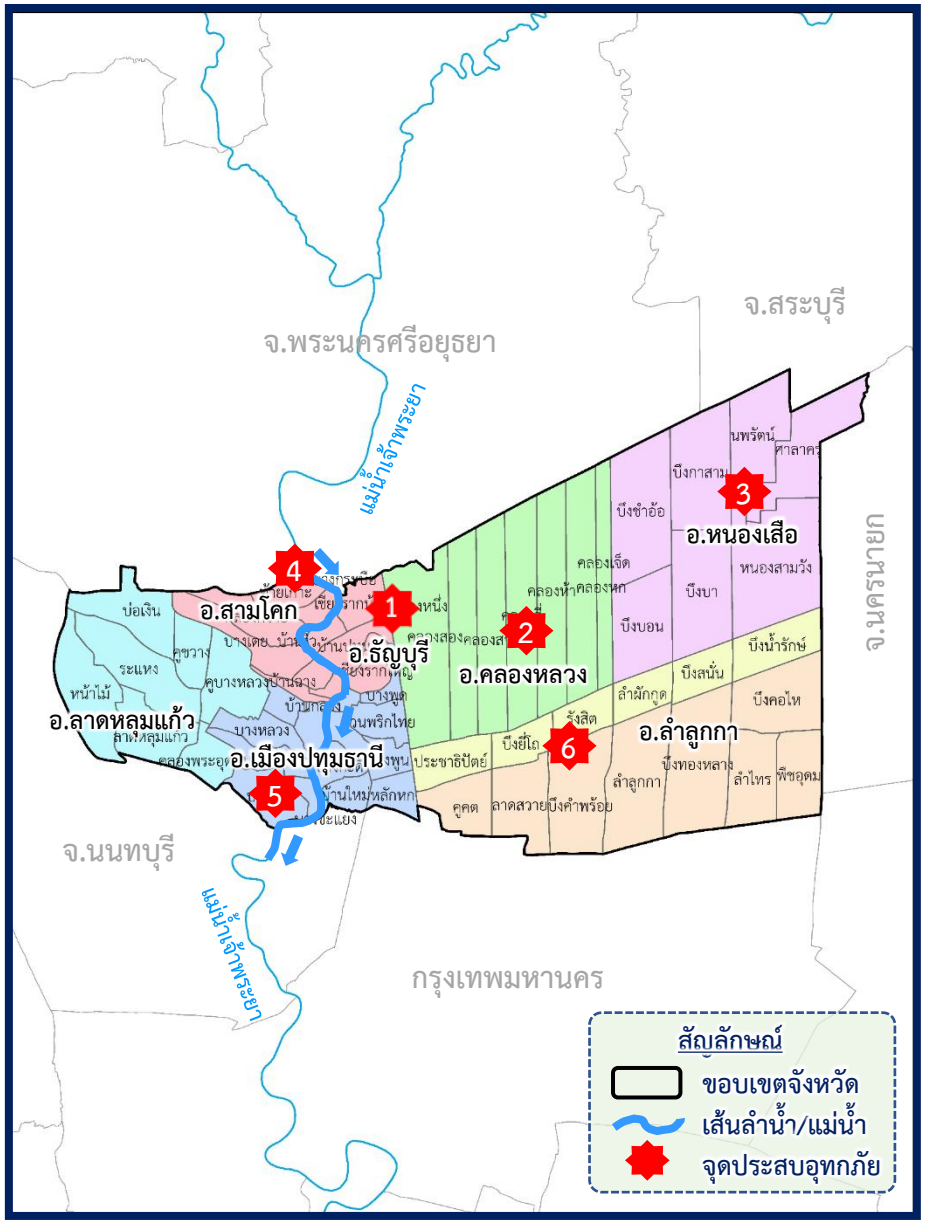

1. สาเหตุ

เนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จ.ปทุมธานี วัดปริมาณน้ำฝน สถานี ปตร.จุฬาลงกรณ์ 131.0 มม. ส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำท่าเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง และท่วมขัง

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

พื้นที่ประสบอุทกภัย รวมจำนวน **6 อำเภอ** ได้แก่ **อ.ธัญบุรี อ.คลองหลวง อ.หนองเสือ อ.สามโคก อ.เมืองปทุมธานี** และ **อ.ลำลูกกา** รวมพื้นที่รับผลกระทบจำนวน 20 ครัวเรือน

3. รายละเอียด

ที่	วันเริ่มอุทกภัย	หมู่ที่ (จำนวน)	ตำบล (จำนวน)	อำเภอ	จุดประสบภัย						พื้นที่ประสบภัย		ประชากร (คน)	ระดับน้ำ (ม.)	การช่วยเหลือ
					ล้นตลิ่ง	ลำน้ำที่ล้นตลิ่ง	น้ำป่าไหลหลาก	ท่วมขัง	ในเขตชลประทาน	นอกเขตชลประทาน	ครัวเรือน	ไร่			
1	26 ก.ย. 69		3	ธัญบุรี	✓	ค.1 – ค.3								0.10 – 0.20	
2	26 ก.ย. 69		6	คลองหลวง	✓	ค.1 – ค.3		✓						0.10 – 0.20	
3	26 ก.ย. 69		2	หนองเสือ	✓	ค.ระพีฯแยกใต้		✓						0.10	
4	26 ก.ย. 69	5	2	สามโคก				✓		✓				0.90 – 1.30	
5	26 ก.ย. 69	3	3	เมืองปทุมธานี				✓		✓				0.80 – 1.65	
6	29 ก.ย. 69			ลำลูกกา		คคลองกลางพัฒนา		✓	✓		20			0.30	


4. การช่วยเหลือเพิ่มเติม

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักชลประทานที่ 11 ร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเสริมคันกั้นน้ำในจุดที่มีระดับน้ำสูงกว่าคันกั้นน้ำ เพิ่มปริมาณการระบายน้ำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากคลองเส้นย่อยเข้าสู่คลองระพีพัฒน์แยกตก

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ 11 ร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมติดตั้ง**เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 2 ชุด** ที่ประตูระบายน้ำ

สรุปสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดนครปฐม

วันที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 07.00 น.

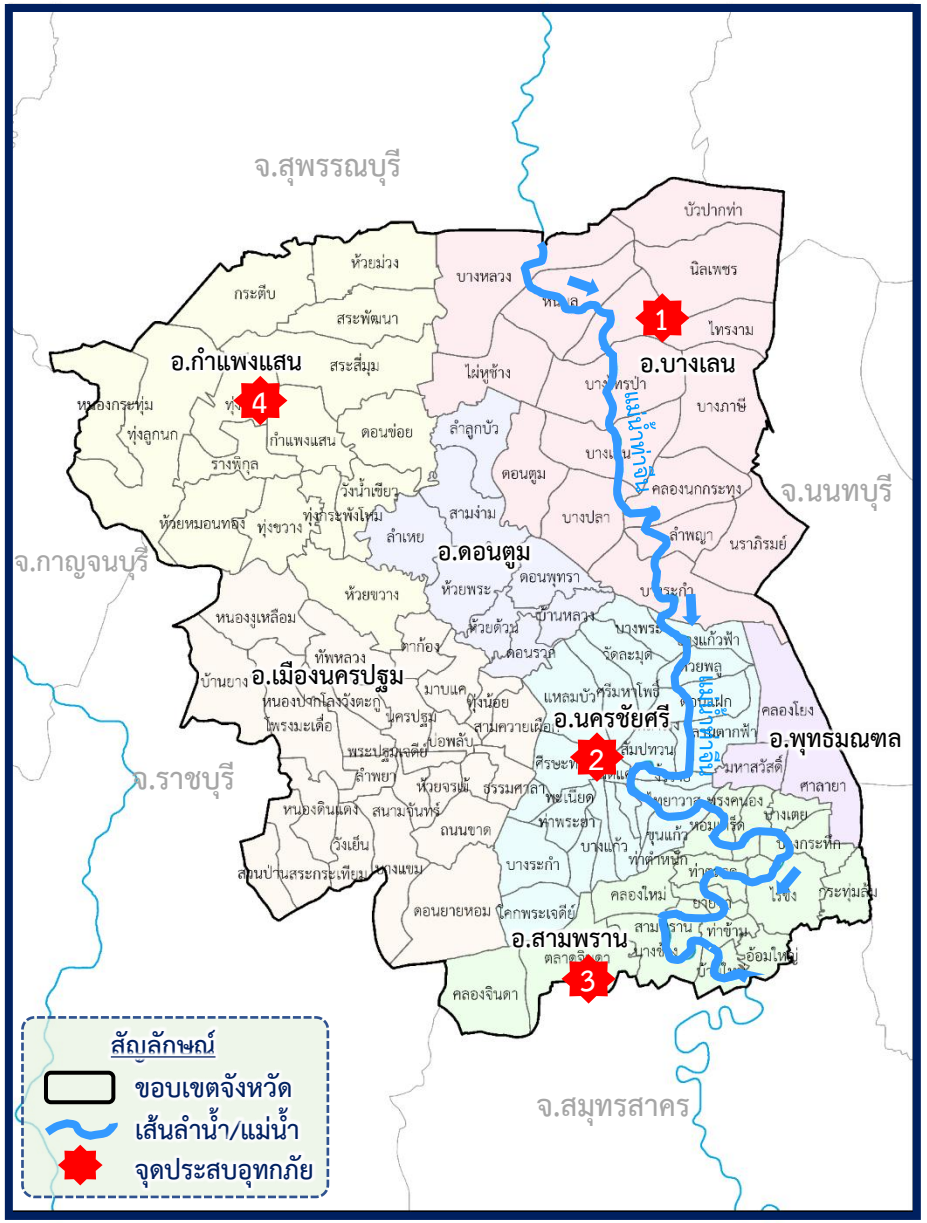

1. สาเหตุ

เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่จำนวนมากและระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

พื้นที่ประสบอุทกภัย รวมจำนวน **4 อำเภอ** ได้แก่ **อ.บางเลน อ.นครชัยศรี อ.สามพราน** และ **อ.กำแพงแสน** รวมพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 11,155 ไร่ 1,632 ครัวเรือน

3. รายละเอียด

ที่	วันเริ่มอุทกภัย	หมู่ที่ (จำนวน)	ตำบล (จำนวน)	อำเภอ	จุดประสบภัย						พื้นที่ประสบภัย		ประชากร (คน)	ระดับน้ำ (ม.)	การช่วยเหลือ
					ล้นตลิ่ง	ลำน้ำที่ล้นตลิ่ง	น้ำป่าไหลหลาก	ท่วมขัง	ในเขตชลประทาน	นอกเขตชลประทาน	ครัวเรือน	ไร่			
1	24 ก.ย. 69	56	4	บางเลน		แม่น้ำท่าจีน			✓			9,600			
2	26 ก.ย. 69	22	11	นครชัยศรี	✓	คลองเจดีย์บูชา คลองท่าผา-บางแก้ว คลองสัมปทวน คลองบางพระ		✓	✓	✓	1,320	185	1,220	0.30 – 0.40	
3	26 ก.ย. 69	15	8	สามพราน	✓	แม่น้ำท่าจีน คลองจินดา			✓		312	1,070		0.30	
4	28 ก.ย. 69	1	1	กำแพงแสน	✓	แม่น้ำท่าจีน		✓	✓			300			

4. การช่วยเหลือเพิ่มเติม

โครงการชลประทานนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 ดำเนินการติดตั้ง**เครื่องสูบน้ำ จำนวน 6 เครื่อง** และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ข้อมูลระดับน้ำให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

สรุปสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 07.00 น.



1. สาเหตุ

เนื่องจากผลกระทบจากร่องฝนพาดผ่านพื้นที่ภาคกลาง ทำให้มีบริมาณฝนตกสะสมและต่อเนื่องในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2569 จึงมีน้ำสะสมในพื้นที่และการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบน ทำให้ระดับน้ำในคลองต่างๆ สูงขึ้นต่อเนื่องจนเอ่อล้นคันคลอง เข้าท่วมบ่อปลา พื้นที่เกษตรกรรม และบ้านเรือนประชาชน

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

พื้นที่ประสบอุทกภัย รวมจำนวน **6 อำเภอ** ได้แก่ **อ.พนมสารคาม อ.บ้านโพธิ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว อ.เมืองฉะเชิงเทรา อ.บางคล้า** และ **อ.ราชสาส์น** รวมพื้นที่รับผลกระทบจำนวน 2,800 ไร่ 45 ครัวเรือน

3. รายละเอียด

ที่	วันเริ่มอุทกภัย	หมู่ที่ (จำนวน)	ตำบล (จำนวน)	อำเภอ	จุดประสบภัย						พื้นที่ประสบภัย		ประชากร (คน)	ระดับน้ำ (ม.)	การช่วยเหลือ
					ล้นตลิ่ง	ลำน้ำที่ล้นตลิ่ง	น้ำป่าไหลหลาก	ท่วมขัง	ในเขตชลประทาน	นอกเขตชลประทาน	ครัวเรือน	ไร่			
1	25 ก.ย. 69	15	3	พนมสารคาม	✓	คลองท่าลาด	✓	✓	✓		15				
2	25 ก.ย. 69	9	3	บ้านโพธิ์				✓	✓		30				
3	25 ก.ย. 69	2	1	บางน้ำเปรี้ยว	✓	คลองบางขนาก		✓	✓			1,500		0.20	
4	25 ก.ย. 69	4	2	เมืองฉะเชิงเทรา	✓	คลองอุดมชลจร คลองประเวศบุรีรมย์		✓	✓			1,300		0.20	
5	25 ก.ย. 69	19	4	บางคล้า	✓	คลองท่าลาด		✓	✓						
6	25 ก.ย. 69			ราชสาส์น				✓	✓						

4. การช่วยเหลือเพิ่มเติม

โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 ดำเนินการ**ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 ชุด** บริเวณปลายคลองท่าลาด ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง สำนักงานชลประทานที่ 9 เดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 3 ลบ.ม./วินาที ที่สถานีสูบน้ำบางพลวง หอทอง บางกระดาน บางกระเจ็ดและคูมอญ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่ประตูระบายน้ำบางกระดาน บางกระเจ็ด และคูมอญ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขนาด 14 นิ้ว ที่ประตูระบายน้ำบางเขียด และเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชนในพื้นที่เตรียมรับมือน้ำท่วม

สรุปสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 07.00 น.



1. สาเหตุ

เนื่องจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่โครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 69 ทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่จำนวนมาก

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

พื้นที่ประสบอุทกภัย รวมจำนวน **3 อำเภอ** ได้แก่ **อ.หนองปรือ อ.ท่ามะกา** และ **อ.เมืองกาญจนบุรี**

3. รายละเอียด

ที่	วันเริ่มอุทกภัย	หมู่ที่ (จำนวน)	ตำบล (จำนวน)	อำเภอ	จุดประสบภัย						พื้นที่ประสบภัย		ประชากร (คน)	ระดับน้ำ (ม.)	การช่วยเหลือ
					ล้นตลิ่ง	ลำน้ำที่ล้นตลิ่ง	น้ำป่าไหลหลาก	ท่วมขัง	ในเขตชลประทาน	นอกเขตชลประทาน	ครัวเรือน	ไร่			
1	28 ก.ย. 69	6	2	หนองปรือ	✓	อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย			✓						
2	1 ต.ค.69		1	ท่ามะกา	✓	แม่น้ำแม่กลอง		✓	✓	✓					
3	15 ต.ค. 69		2	เมืองกาญจนบุรี	✓	แม่น้ำแควใหญ่				✓					

4. การช่วยเหลือเพิ่มเติม

โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13 เตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานเมื่อมีการร้องขอ และลงพื้นที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินงาน พร้อมเร่งวางกระสอบทรายบริเวณแนวสันเขื่อน เพื่อเสริมความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำ

สรุปสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 07.00 น.



1. สาเหตุ

เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบาย จึงทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

พื้นที่ประสบอุทกภัย รวมจำนวน **2 อำเภอ** ได้แก่ **อ.วิเศษชัยชาญ** และ **อ.เมืองอ่างทอง** รวมพื้นที่รับผลกระทบจำนวน 87 ครัวเรือน

3. รายละเอียด

ที่	วันเริ่มอุทกภัย	หมู่ที่ (จำนวน)	ตำบล (จำนวน)	อำเภอ	จุดประสบภัย						พื้นที่ประสบภัย		ประชากร (คน)	ระดับน้ำ (ม.)	การช่วยเหลือ
					ล้นตลิ่ง	ลำน้ำที่ล้นตลิ่ง	น้ำป่าไหลหลาก	ท่วมขัง	ในเขตชลประทาน	นอกเขตชลประทาน	ครัวเรือน	ไร่			
1	22 ก.ย. 69	13	3	วิเศษชัยชาญ	✓	แม่น้ำน้อย คลอง ร.1ช ม.น้อย 6		✓		✓	58			0.10 – 1.00	
2	25 ก.ย. 69	4	4	เมืองอ่างทอง	✓	แม่น้ำเจ้าพระยา คลอง ร.1ช ม.น้อย 6		✓		✓	29			0.10 – 0.60	

4. การช่วยเหลือเพิ่มเติม

โครงการชลประทานอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ข้อมูลระดับน้ำให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องv.

สรุปสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 07.00 น.



1. สาเหตุ

เนื่องจากปริมาณน้ำ จ.นครสวรรค์ (สถานี C.2) จ.อุทัยธานี (สถานี C.19) การระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา (สถานี C.13) ปรับเพิ่มการระบาย จึงทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

พื้นที่ประสบอุทกภัย รวมจำนวน **1 อำเภอ** ได้แก่ **อ.เมืองอุทัยธานี** รวมพื้นที่รับผลกระทบจำนวน 73 ครัวเรือน

3. รายละเอียด

ที่	วันเริ่มอุทกภัย	หมู่ที่ (จำนวน)	ตำบล (จำนวน)	อำเภอ	จุดประสบภัย						พื้นที่ประสบภัย		ประชากร (คน)	ระดับน้ำ (ม.)	การช่วยเหลือ
					ล้นตลิ่ง	ลำน้ำที่ล้นตลิ่ง	น้ำป่าไหลหลาก	ท่วมขัง	ในเขตชลประทาน	นอกเขตชลประทาน	ครัวเรือน	ไร่			
1	22 ก.ย. 69	17	6	เมืองอุทัยธานี	✓	แควตากแดด แม่น้ำเจ้าพระยา				✓	73		146	0.20 – 0.30	

4. การช่วยเหลือเพิ่มเติม

โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 แจ้งเตือนข่าสารสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบ รวมทั้งประสานจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

สรุปสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 07.00 น.



1. สาเหตุ

เมื่อวันที่ 21 - 25 กันยายน 2569 มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง บริเวณพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่บริเวณตลาดเก่ากบินทร์บุรี

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

พื้นที่ประสบอุทกภัย รวมจำนวน **5 อำเภอ** ได้แก่ **อ.กบินทร์บุรี อ.ศรีมหาโพธิ อ.เมืองปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม** และ **อ.บ้านสร้าง** รวมพื้นที่รับผลกระทบจำนวน 2,250 ไร่ 210 ครัวเรือน

3. รายละเอียด


ที่	วันเริ่มอุทกภัย	หมู่ที่ (จำนวน)	ตำบล (จำนวน)	อำเภอ	จุดประสบภัย						พื้นที่ประสบภัย		ประชากร (คน)	ระดับน้ำ (ม.)	การช่วยเหลือ
					ล้นตลิ่ง	ลำน้ำที่ล้นตลิ่ง	น้ำป่าไหลหลาก	ท่วมขัง	ในเขตชลประทาน	นอกเขตชลประทาน	ครัวเรือน	ไร่			
1	22 ก.ย. 69	14	6	กบินทร์บุรี	✓	แม่น้ำปราจีนบุรี (Kgt.43A,Kgt.15A, Kgt.14,Kgt3)		✓	✓	✓	120	2,250		0.10 – 1.50	
2	22 ก.ย. 69	2	1	ศรีมหาโพธิ	✓				✓	✓				1.50	
3	25 ก.ย. 69	1	1	เมืองปราจีนบุรี				✓	✓	✓					
4	26 ก.ย.69	11	2	ประจันตคาม			✓	✓	✓	✓	90			0.80	
5	3 ต.ค.69	1	9	บ้านสร้าง	✓				✓	✓					

4. การช่วยเหลือเพิ่มเติม

โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 แจ้งเตือนเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล พร้อมหน่วยช่วยเหลือ ตลอด 24 ชม. เมื่อได้รับการร้องขอ รวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่ประสบปัญหา

สรุปสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 07.00 น.

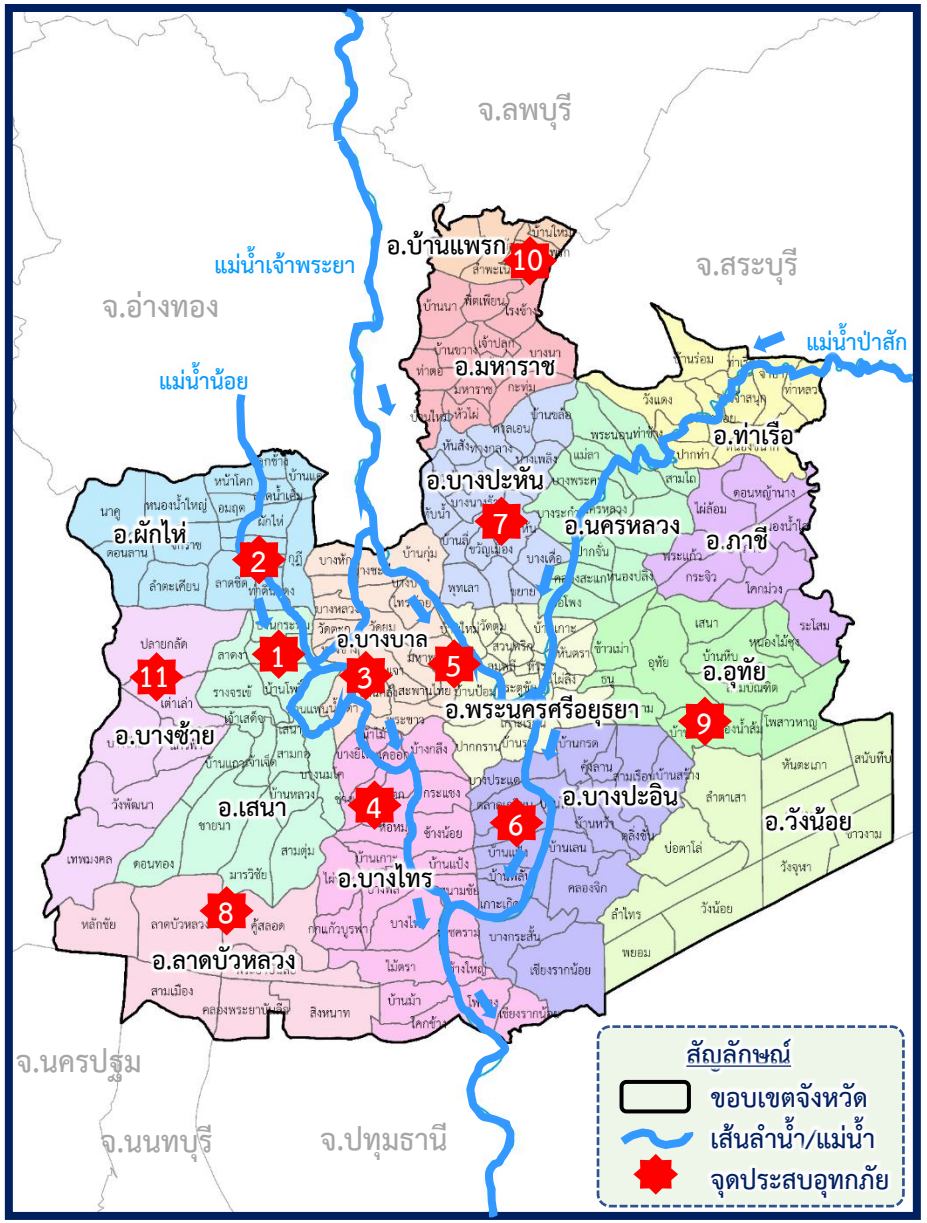

1. สาเหตุ

เนื่องจากปริมาณน้ำบริเวณ จ.นครสวรรค์ (สถานี C.2) และการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา (สถานี C.13) ปรับเพิ่มการระบาย จึงทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

พื้นที่ประสบอุทกภัยนอกคันกั้นน้ำ รวมจำนวน **11 อำเภอ** ได้แก่ **อ.เสนา อ.ผักไห่ อ.บางบาล อ.บางไทร อ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน อ.บางปะหัน อ.ลาดบัวหลวง อ.อุทัย อ.บ้านแพรก** และ**อ.บางซ้าย** รวมพื้นที่รับผลกระทบจำนวน 50,697 ครัวเรือน

3. รายละเอียด


ที่	วันเริ่มอุทกภัย	หมู่ที่ (จำนวน)	ตำบล (จำนวน)	อำเภอ	จุดประสบภัย						พื้นที่ประสบภัย		ประชากร (คน)	ระดับน้ำ (ม.)	การช่วยเหลือ
					ล้นตลิ่ง	ลำน้ำที่ล้นตลิ่ง	น้ำป่าไหลหลาก	ท่วมขัง	ในเขตชลประทาน	นอกเขตชลประทาน	ครัวเรือน	ไร่			
1	21 ก.ย. 69			เสนา	✓	แม่น้ำน้อย		✓		✓	6,684			0.10 – 0.60	
2	21 ก.ย. 69			ผักไห่	✓	แม่น้ำน้อย		✓		✓	7,307			0.10 – 0.60	
3	22 ก.ย. 69			บางบาล	✓	แม่น้ำน้อย แม่น้ำเจ้าพระยา		✓		✓	6,967			0.10 – 0.60	
4	22 ก.ย. 69			บางไทร	✓	แม่น้ำน้อย แม่น้ำเจ้าพระยา		✓		✓	8,682			0.10 – 0.60	
5	23 ก.ย. 69	1,004	149	พระนครศรีอยุธยา	✓	แม่น้ำเจ้าพระยา		✓		✓	2,739			0.10 – 0.60	
6	23 ก.ย. 69			บางปะอิน	✓	แม่น้ำเจ้าพระยา		✓		✓	10,424			0.10 – 0.60	
7	27 ก.ย. 69			บางปะหัน	✓	แม่น้ำลพบุรี		✓		✓	3,006			0.10 – 0.50	
8	28 ก.ย. 69			ลาดบัวหลวง	✓	แม่น้ำเจ้าพระยา		✓		✓	1,519			0.10 – 0.50	
9	29 ก.ย. 69			อุทัย	✓	แม่น้ำป่าสัก		✓		✓				0.10 – 0.50	
10	2 ต.ค. 69			บ้านแพรก	✓	แม่น้ำลพบุรี		✓			146			0.10 – 0.50	
11	2 ต.ค. 69			บางซ้าย	✓	แม่น้ำน้อย		✓			3,223			0.10 – 0.50	

4. การช่วยเหลือเพิ่มเติม

โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา สำนักงานชลประทานที่ 10 เตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ แจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

สรุปสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 07.00 น.

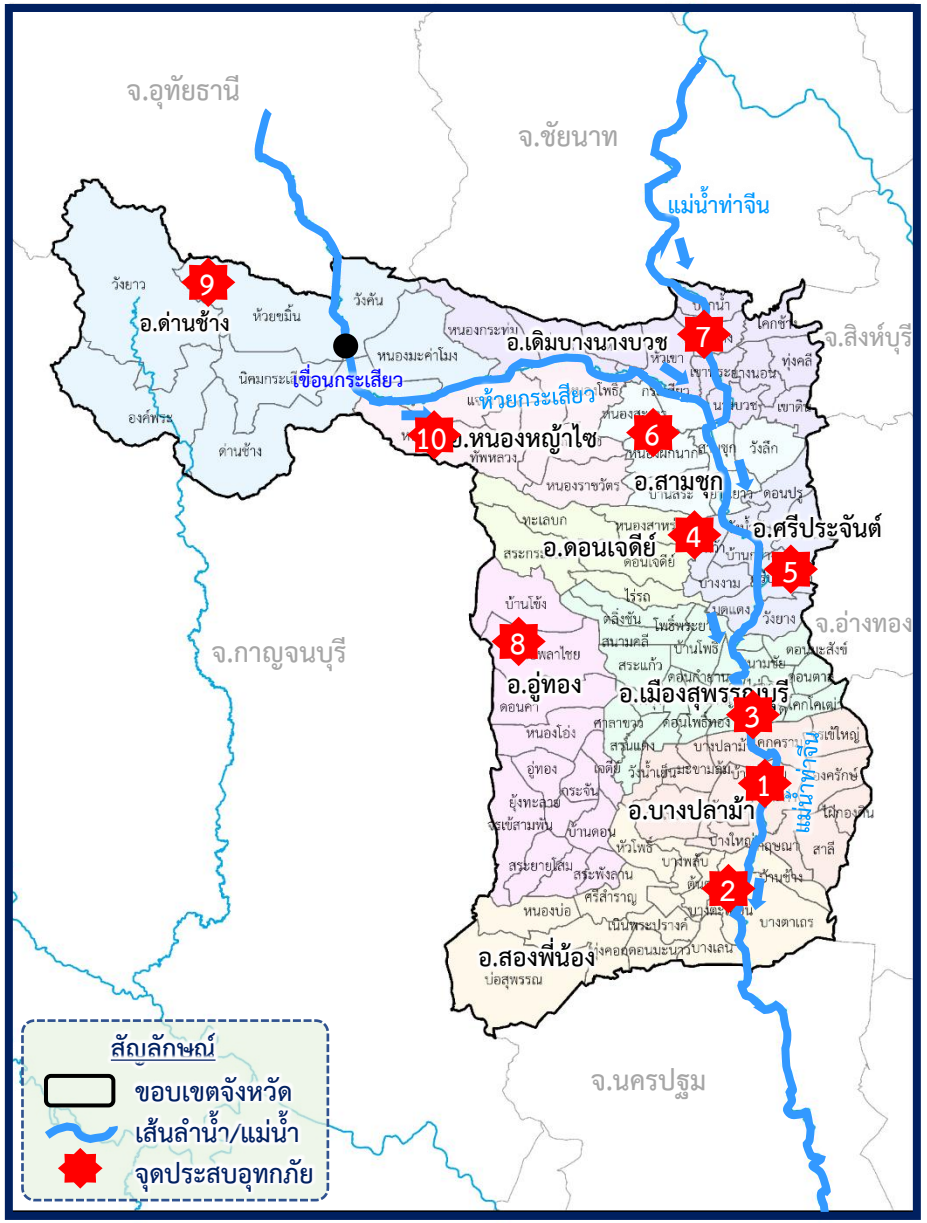

1. สาเหตุ

สืบเนื่องจากภาวะฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนตั้งแต่ 23/9/2569 ส่งผลให้การระบายน้ำล่าช้าและเอ่อท่วมพื้นที่เกษตรกรรม ทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่จำนวนมาก และระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนสูงขึ้น ประกอบกับมีปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงมาสมทบในแม่น้ำท่าจีนเกินกว่าศักยภาพของลำน้ำทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

2. สถานการณ์ปัจจุบัน

พื้นที่ประสบอุทกภัย รวมจำนวน **10 อำเภอ** ได้แก่ **อ.บางปลาม้า อ.สองพี่น้อง อ.เมืองสุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ อ.ศรีประจันต์ อ.สามชุก อ.เดิมบางนางบวช อ.อู่ทอง อ.ด่านช้าง** และ **อ.หนองหญ้าไซ** รวมพื้นที่รับผลกระทบจำนวน 33,098 ครัวเรือน

3. รายละเอียด

ที่	วันเริ่มอุทกภัย	หมู่ที่ (จำนวน)	ตำบล (จำนวน)	อำเภอ	จุดประสบภัย						พื้นที่ประสบภัย		ประชากร (คน)	ระดับน้ำ (ม.)	การช่วยเหลือ
					ล้นตลิ่ง	ลำน้ำที่ล้นตลิ่ง	น้ำป่าไหลหลาก	ท่วมขัง	ในเขตชลประทาน	นอกเขตชลประทาน	ครัวเรือน	ไร่			
1	18 ก.ย. 69	127	14	บางปลาม้า	✓	แม่น้ำท่าจีน คลองสาขา		✓		✓	6,358			0.30 – 0.50	
2	18 ก.ย. 69	130	16	สองพี่น้อง	✓	แม่น้ำท่าจีน คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง		✓		✓	5,434			0.50 – 0.60	
3	23 ก.ย. 69	124	19	เมืองสุพรรณบุรี	✓	แม่น้ำท่าจีน คลองท่าว้า		✓		✓	9,722			0.30 – 0.40	
4	23 ก.ย. 69	47	5	ดอนเจดีย์				✓		✓	903			0.30 – 0.40	
5	23 ก.ย. 69	64	9	ศรีประจันต์	✓	แม่น้ำท่าจีน		✓		✓	568			0.30 – 0.40	
6	27 ก.ย.69	68	7	สามชุก				✓		✓	1,611			0.30 – 0.40	
7	28 ก.ย.69	109	14	เดิมบางนาบวช				✓		✓	2,512			0.50	
8	28 ก.ย.69	145	13	อู่ทอง				✓		✓	5,388			0.50	
9	28 ก.ย.69	73	7	ด่านช้าง				✓		✓	142			0.50	
10	3 ต.ค. 69	54	6	หนองหญ้าไซ				✓		✓	460			0.50	

4. การช่วยเหลือเพิ่มเติม

โครงการชลประทานสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 แจ้งเตือนข่าวสารสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบ รวมทั้งประสานจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ช่วยเหลือในพื้นที่เกิดอุทกภัย





กรมชลประทาน

13 มิถุนายน 2569

Since 1902
