


รายงานสรุปสถานการณ์และการเฝ้าระวัง
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

1. การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่อากาศ

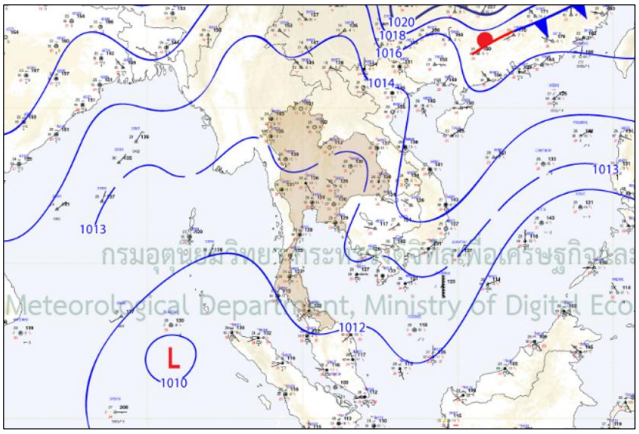

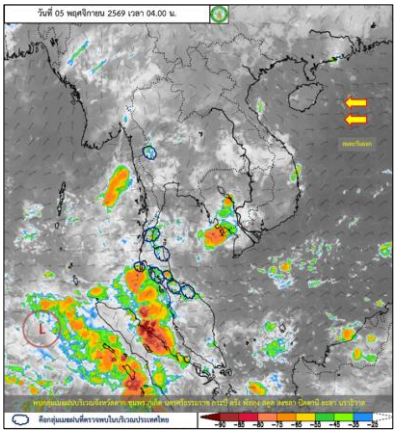

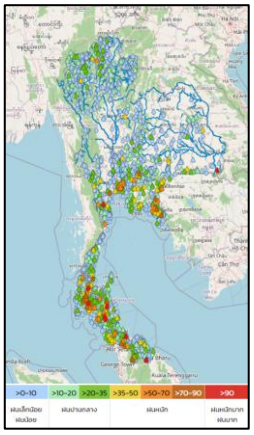


<u>แผนที่อากาศผิวพื้นและพยากรณ์อากาศ</u> (วันที่ 5 พ.ย. 69) ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ประเทศไทย และทะเลอันดามัน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบน จะมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งจะมีผลกระทบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก

<u>พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า (วันที่ 5 พ.ย. – 11 พ.ย. 69)</u> ช่วงวันที่ 5 –7 พ.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะแรก ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่วนในช่วงวันที่ 8 –10 พ.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย อากาศเย็นลงกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น

<u>ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 1 พ.ย. 69</u> ข้อมูลรายสัปดาห์จากกรมอุตุนิยมวิทยา ปริมาณฝนทั้งประเทศ <u>ต่ำกว่าค่าปกติ 4%</u> ค่าปกติ 1,477.9 มม. ปริมาณฝน 1,413.2 มม. แบ่งเป็น **ภาคเหนือ** ต่ำกว่าค่าปกติ 5% **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** ต่ำกว่าค่าปกติ 6% **ภาคกลาง** สูงกว่าค่าปกติ 2% **ภาคตะวันออก** ต่ำกว่าค่าปกติ 1% **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** ต่ำกว่าค่าปกติ 16% และ**ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** สูงกว่าค่าปกติ 1%

<u>โดยปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาสูงสุด 3 ลำดับ</u> (1) ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราชปริมาณฝน 137.5 มม. (2) ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ปริมาณฝน 136.8 มม. และ (3) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ปริมาณฝน 134.8 มม.

สถานการณ์เอลนีโญ/ลานีญา ปี 2569

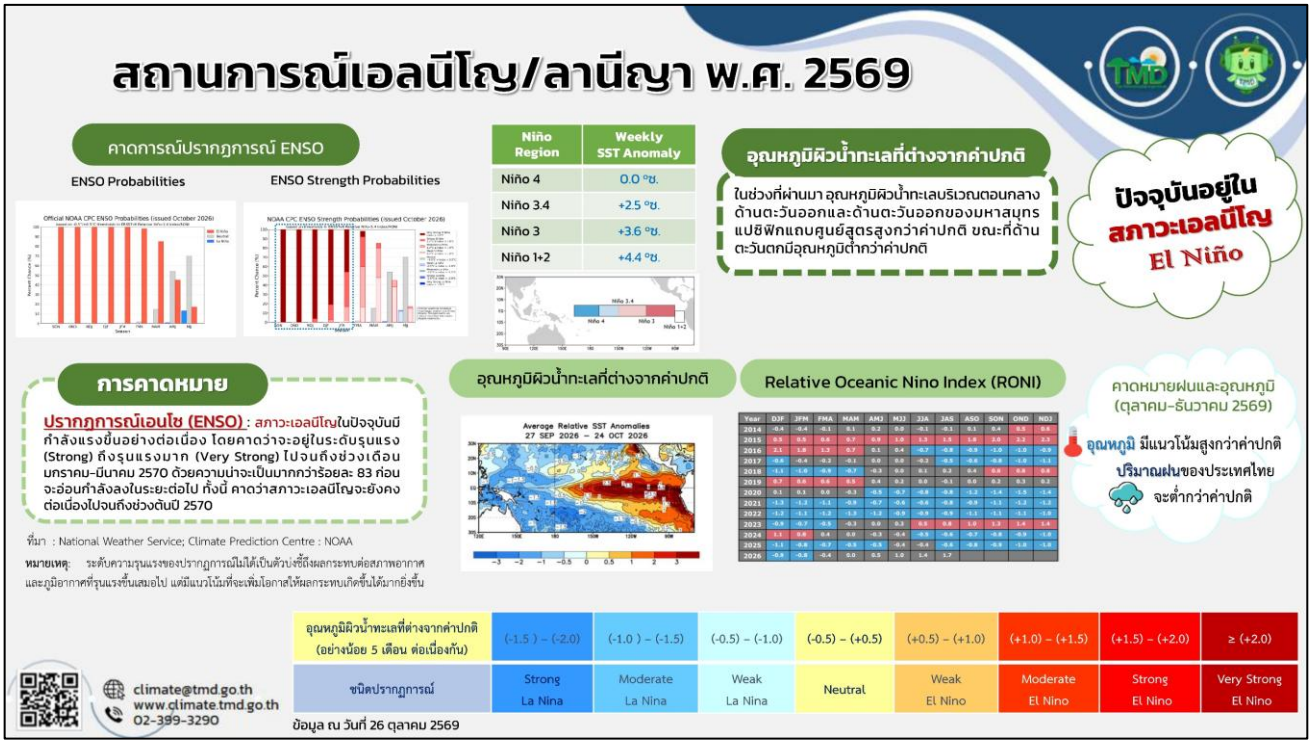

ปัจจุบันอยู่ใน**สภาวะเอลนีโญ** โดยมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะอยู่ในระดับรุนแรง (Strong) ถึงรุนแรงมาก (Very Strong) ไปจนถึงช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2570 ด้วยความน่าจะเป็นมากกว่าร้อยละ 83 ก่อนจะอ่อนกำลังลงในระยะต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าสภาวะเอลนีโญจะยังคงต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปี 2570

2. สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย. 69)

2.1 ปริมาณน้ำเก็บกักทั้งประเทศ 496 แห่ง (อ่างฯใหญ่ 35 แห่ง + อ่างฯกลาง 461 แห่ง) = 63,895 ล้าน ลบ.ม. (83%) (ปี 2568 = 68,393 ล้าน ลบ.ม.) **น้อยกว่าปีก่อน 4,498 ล้าน ลบ.ม.** ปริมาณน้ำใช้การ = 39,919 ล้าน ลบ.ม. (76%) (ปี 2568 = 44,111 ล้าน ลบ.ม.) **น้อยกว่าปีก่อน 4,492 ล้าน ลบ.ม.** รับน้ำได้อีก = 12,789 ล้าน ลบ.ม. (17%)

2.2 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง

- **อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่** มีปริมาณน้ำรวม 59,157 ล้าน ลบ.ม. (84%) เป็นน้ำใช้การได้ 35,607 ล้าน ลบ.ม. (75%)

  - **ปริมาณน้ำมากกว่า 80% มีจำนวน 22 แห่ง** คือ (1) สิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ (2) แม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ (3) กิ่วลมจ.ลำปาง (4) กิ่วคอหมา จ.ลำปาง (5) แควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก (6) แม่มอก จ.ลำปาง (7) จุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ (8) ลำตะคอง จ.นครราชสีมา (9) สิรินธร จ.อุบลราชธานี (10) ป่าสักชลสิทธิ์ จ.สระบุรี (11) ทับเสลา จ.อุทัยธานี (12) กระเสียว จ.สุพรรณบุรี (13) ศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี (14) วชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี (15) ขุนด่านปราการชล จ.นครนายก (16) คลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา (17) บางพระจ.ชลบุรี (18) หนองปลาไหล จ.ชลบุรี (19) ประแสร์ จ.ระยอง (20) นฤบดินทรจินดาจ.ปราจีนบุรี (21) แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี (22) ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

  - **ปริมาณน้ำมากกว่า 51% - 80% มีจำนวน 13 แห่ง** คือ (1) ภูมิพล จ.ตาก (2) แม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ (3) ห้วยหลวง จ.อุดรธานี (4) น้ำอูน จ.สกลนคร (5) น้ำพุง จ.สกลนคร (6) อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น (7) ลำปาว จ.กาฬสินธุ์ (8) ลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา (9) มูลบน จ.นครราชสีมา (10) ลำแชะ จ.นครราชสีมา (11) ลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ (12) รัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (13) บางลาง จ.ยะลา

  - **ปริมาณน้ำระหว่าง 31% - 50 % มีจำนวน - แห่ง** คือ

- **ปริมาณน้ำน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30% มีจำนวน - แห่ง** คือ -
- **อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่ปริมาณน้ำเกิน Upper Rule Curve (URC) จำนวน 4 แห่ง** คือ (1) ทับเสลา จ.อุทัยธานี (2) บางพระจ.ชลบุรี (3) หนองปลาไหล จ.ชลบุรี (4) นฤบดินทรจินดาจ.ปราจีนบุรี
- **อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่ปริมาณน้ำต่ำกว่า lower Rule Curve) LRC) จำนวน - แห่ง** คือ -

○ **สถานการณ์ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (5 พ.ย. 69)** ปริมาณน้ำในอ่าง 4 อ่างรวม = 18,890 ล้าน ลบ.ม. (76%) (ปี 2568 = 24,310 ล้าน ลบ.ม.) **น้อยกว่าปีก่อน 5,420 ล้าน ลบ.ม.** ปริมาณน้ำใช้การ = 12,182 ล้าน ลบ.ม. (68%) **ลดลงจากวันก่อน 16 ล้าน ลบ.ม** (ปี 2568 = 17,602 ล้าน ลบ.ม.) **น้อยกว่าปีก่อน 5,420 ล้าน ลบ.ม.**รับน้ำได้อีก = 5,893 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569

อ่างเก็บน้ำ	ความจุ ที่ รนก.	ความจุ ใช้การ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		รับน้ำได้อีก
			ปริมาณน้ำ	% ความจุ	ปริมาณน้ำ	% ใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	13,462	9,662	9,610	71	5,810	60	21.00	10.72	10.00	10.00	3,852
สิริกิติ์	9,510	6,660	7,643	80	4,793	72	2.76	9.84	29.95	30.06	1,867
ภูมิพล+สิริกิติ์	22,972	16,322	17,253	75	10,603	65	23.76	20.56	39.95	40.06	5,719
แควน้อยฯ	939	896	817	87	774	86	2.35	1.92	0.86	0.86	122
ป่าสักชลสิทธิ์	872	857	820	94	805	94	0.95	2.51	0.44	0.44	52
รวมทั้งหมด	24,783	18,075	18,890	76	12,182	67	27.06	24.99	41.25	41.36	5,893

*หมายเหตุ : ( ) คือ เก็บความจุเก็บกักปกติ / ปรับความจุเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ วันที่ 22 มิ.ย.69 (หนวย : ลาน ลบ.ม.)

2.3 สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 461 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย. 69)

อ่างเก็บน้ำขนาดกลางปริมาณน้ำปัจจุบัน 4,738 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 81% โดยอ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำมากกว่า 100 % จำนวน 86 แห่ง ปริมาณน้ำระหว่าง 80-100 % จำนวน 172 แห่ง ปริมาณน้ำระหว่าง 50-80 % จำนวน 126 แห่ง ปริมาณน้ำระหว่าง 31-50 % จำนวน 50 แห่งและปริมาณน้ำน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 % จำนวน 27 แห่ง

2.4 การจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC

การจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ สนับสนุน การผลิตน้ำประปา รักษาระบบนิเวศน์ การเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ปริมาณน้ำในอ่างอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีปริมาณน้ำเก็บกัก ณ วันที่ 4 พ.ย. 69 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่ง ดังนี้

ลำดับ	เขื่อน	ความจุอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น % ความจุ	ไหลเข้าอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)	ระบาย (ล้าน ลบ.ม.)
	อ่างเก็บน้ำขนาดขนาดใหญ่					
1	คลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา	420	371	88%	-	0.01
2	บางพระ จ.ชลบุรี*	117	116	99%	0.29	0.63
3	หนองปลาไหล จ.ระยอง*	164	179	109%	1.49	2.68
4	ประแสร์ จ.ระยอง*	295	269	91%	0.69	0.44
	อ่างเก็บน้ำขนาดขนาดกลาง					
1	คลองระบม จ.ฉะเชิงเทรา	56	49	88%	-	0.01
2	คลองประแกด จ.จันทบุรี	60	66	109%	1.20	0.94
3	แก่งหางแมว จ.จันทบุรี	81	83	102%	0.03	0.03
4	หนองค้อ จ.ชลบุรี*	21	22	103%	0.52	0.57
5	คลองหลวงรัชชโลทร จ.ชลบุรี*	98	113	115%	1.87	0.36
6	ดอกกราย จ.ระยอง*	71	74	104%	1.46	1.57
7	คลองใหญ่ จ.ระยอง*	51	43	85%	0.50	0.17
8	5 อ่างฯพัทยา จ.ชลบุรี*	40	33	83%	0.71	0.42

และมีการสูบผันน้ำ วันที่ 3 พ.ย. 69 ดังนี้

ลำดับ	แนวผันน้ำ	แผนการสูบผันน้ำ (ลบ.ม.)	ปี พ.ศ.	สูบ/ผัน (ลบ.ม./วัน)	สะสม (ลบ.ม.)	หมายเหตุ
1	1.1 สูบผันน้ำคลองพระองค์ฯ – อ่างฯ บางพระ	70,000,000	ผลปี 2568	-	52,261,521 (74%)	1 ก.ค. – 31 ธ.ค.68
		70,000,000	ผลปี 2569	483,022	46,031,559 (66%)	ม.ค.69 - ปัจจุบัน
	1.2 สูบผันน้ำคลองพานทอง – อ่างฯ บางพระ		ผลปี 2569	หยุดสูบ	6,454,199 (73%)	ม.ค.69 - ปัจจุบัน
		-	ผลปี 2568	-	11,315,495	6 มิ.ย. – 31 ธ.ค.68
2	สูบผันน้ำคลองสะพาน – อ่างฯ ประแสร์	-	ผลปี 2568	-	14,627,011	3 พ.ค. – 11 ก.ย.68
		25,000,000	ผลปี 2569	หยุดสูบ	28,234,466(113%)	พ.ค.69 - ก.ย.69
3	สูบผันน้ำอ่างฯ ประแสร์ – อ่างฯ คลองใหญ่	23,000,000	ผลปี 2568	-	20,976,126 (91%)	1 ม.ค. – 31 ธ.ค.68
		78,000,000	ผลปี 2569	หยุดสูบ	57,805,248(74%)	1 ม.ค.69 – ก.ย.69
4	สูบผันน้ำคลองวังโตนด - อ่างฯประแสร์	-	ผลปี 2568	-	-	-
		38,700,000	ผลปี 2569	หยุดสูบ	22,275,000(58%)	ม.ค. 69 - ก.ย.69
5	สูบกลับวัดละหารไร่ - อ่างฯหนองปลาไหล	-	ผลปี 2568	-	2,103,649	ม.ค.68 – 13 ก.ย.68
		7,000,000	ผลปี 2569	หยุดสูบ	3,741,015 (53%)	ม.ค. 69– ต.ค.69
6	สูบผันน้ำแม่น้ำบางปะกง – อ่างฯ บางพระ	22,000,000	ผลปี 2568	-	9,804,000 (45%)	17 ก.ค. - 17 ต.ค.68
		20,000,000	ผลปี 2569	หยุดสูบ	13,669,256(68%)	ม.ค. 69 – ต.ค.69
7	สูบผันน้ำอ่างฯ คลองใหญ่ – อ่างฯ หนองปลาไหล	-	ผลปี 2568	-	83,695,000	1 ม.ค. – 31 ธ.ค.68
		-	ผลปี 2569	หยุดสูบ	95,333,000	1 ม.ค. – ต.ค.69

3. สถานการณ์ระดับน้ำล้นตลิ่งปัจจุบัน ณ วันที่ 5 พ.ย. 69 เวลา 06.00 น. มีสถานีที่ระดับน้ำล้นตลิ่ง 4 สถานี (แม่น้ำน้อย และแม่น้ำท่าจีน)

วันที่ 5 พ.ย. 2569 เวลา 06.00 น.

ลำดับ	ชื่อสถานี	ลุ่มน้ำ	แม่น้ำ	อำเภอ	จังหวัด	ระดับตลิ่ง (เมตร-รสม.)	ความจุลำน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ (เมตร-รสม.)	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง (เมตร)	แนวโน้ม
1	C.67	เจ้าพระยา	แม่น้ำน้อย	อ.เสนา	จ.พระนครศรีอยุธยา	2.75	-	3.20	-	0.45	▼
2	T.1	ท่าจีน	แม่น้ำท่าจีน	อ.นครชัยศรี	จ.นครปฐม	11.20	-	11.79	-	0.59	▼
3	T.13	ท่าจีน	แม่น้ำท่าจีน	อ.สองพี่น้อง	จ.สุพรรณบุรี	6.40	-	7.16	-	0.76	▼
4	T.15	ท่าจีน	แม่น้ำท่าจีน	อ.บางเลน	จ.นครปฐม	7.80	-	8.93	-	1.13	▼

▼ ลดลง — ทรงตัว ▲ เพิ่มขึ้น

4. สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ (เวลา 06.00 น.) **P.17** (92 ลบ.ม./วินาที เมื่อวาน 87 ลบ.ม./วินาที), **N.67** (549 ลบ.ม./วินาที เมื่อวาน 585 ลบ.ม./วินาที), **C.2** (760 ลบ.ม./วินาที เมื่อวาน 823 ลบ.ม./วินาที, **C.13 ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา** 700 ลบ.ม./วินาที เมื่อวาน 700 ลบ.ม./วินาที) และมีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา +14.94 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.23 ม.รทก.) ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ **C.29B** อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เฉลี่ย 841 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 852 ลบ.ม./วินาที), **รับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก** 250 ลบ.ม./วินาที เมื่อวาน 258 ลบ.ม./วินาที (ฝั่งตะวันตก 129 ลบ.ม./วินาที เมื่อวาน 136 ลบ.ม./วินาที, ฝั่งตะวันออก 121 ลบ.ม./วินาที เมื่อวาน 122 ลบ.ม./วินาที)

แจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 7 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569 จากการคาดการณ์ ที่สถานี C2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่าน ประมาณ 3,010 ลบ.ม./วินาที กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ระหว่าง 2,200 - 2,500 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.40 – 0.70 ม. บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโยโย จังหวัดอ่างทอง อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมที่ชุมชนในคันกั้นน้ำ



5. สถานการณ์ลุ่มน้ำชี-มูล

5.1 ลุ่มน้ำชี

ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 3 แห่ง

ลำดับ	เขื่อน	ความจุอ่าง (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น % ความจุ	ไหลเข้าอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม./วัน)	ระบาย (ล้าน ลบ.ม./วัน)
1	เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	2,431	1,396	57%	3.37	2.00
2	เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์	1,980	1,114	56%	0.21	2.33
3	เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ	164	140	85%	0.12	-

เขื่อนระบายน้ำกลางแม่น้ำชี 6 แห่ง

ลำดับ	เขื่อน	ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ระดับน้ำหน้าเขื่อน (ม.ทรก.)	คิดเป็น % ความจุ	ระบาย (ลบ.ม./วินาที)	เปิดบาน (ระยะ ม. X จำนวนบาน)
1	เขื่อนชนบท จ.ขอนแก่น	16	+162.58	95%	10.84	0.02x6
2	เขื่อนมหาสารคาม จ.มหาสารคาม	24	+146.90	82%	35.60	0.05x1,0.10x5
3	เขื่อนวังยาง จ.กาฬสินธุ์	34	+137.46	86%	56.00	0.10x4,0.15x2
4	เขื่อนร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	16	+130.80	77%	83.79	0.20x6
5	เขื่อนยโสธร จ.ยโสธร	19	+124.89	91%	99.95	0.10x4,0.15x4
6	เขื่อนธาตุน้อย จ.อุบลราชธานี	56	+115.90	96%	177.85	0.30x8

สถานการณ์น้ำท่า อยู่ในสภาวะปกติ

5.2 ลุ่มน้ำมูล

ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 6 แห่ง

ลำดับ	เขื่อน	ความจุอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น % ความจุ	ไหลเข้าอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม./วัน)	ระบาย (ล้าน ลบ.ม./วัน)
1	เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา	314	272	87%	5.44	0.47
2	เขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา	155	124	80%	61.20	5.29
3	เขื่อนมูลบน จ.นครราชสีมา	141	87	62%	40.99	3.54
4	เขื่อนลำแชะ จ.นครราชสีมา	275	169	62%	76.76	6.63
5	เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์	121	65	54%	101.22	8.75
6	เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี	1,966	1,782	90%	117.44	10.15

เขื่อนระบายน้ำกลางแม่น้ำมูล 4 แห่ง

ลำดับ	เขื่อน	ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ระดับน้ำหน้าเขื่อน (ม.ทรก.)	คิดเป็น % ความจุ	ระบาย (ลบ.ม./วินาที)	เปิดบาน (ระยะ ม. X จำนวนบาน)
1	เขื่อนพิมาย จ.นครราชสีมา	3.6	+152.36	109%	26.24	1.00x1
2	เขื่อนราศีไศล จ.ศรีสะเกษ	74	+118.80	97%	152.26	0.20x7
3	เขื่อนหัวนา จ.ศรีสะเกษ	65	+112.01	100%	219.53	0.60x6,ปิดบานx8
4	เขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี	225	+106.63	N/A	659.61	ปิดบาน

สถานการณ์น้ำท่า ที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี มีการติดตามที่สถานีวัดน้ำ **M.7** สะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนลงแม่น้ำโขง ที่ระดับตลิ่ง +113.50 ม.รทก. มีความจุลำน้ำ 3,200 ลบ.ม./วินาที (กรมชลประทานเสริมกำแพงปิดช่องว่าง) ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ +107.85 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 340.00 ลบ.ม./วินาที คิดเป็น 11% ของความจุลำน้ำ (ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งเสริมคัน 5.65 เมตร ปริมาณน้ำน้อยกว่าความจุ 2,860.00 ลบ.ม./วินาที)

สถานการณ์น้ำท่า อยู่ในสภาวะปกติ

6. สถานการณ์ลุ่มน้ำโขง

ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง

ลำดับ	เขื่อน	ความจุอ่าง (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น % ความจุ	ไหลเข้าอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม./วัน)	ระบาย (ล้าน ลบ.ม./วัน)
1	เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี	136	74	54%	-	0.20
2	เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร	520	294	56%	0.26	-

ประตูระบายน้ำ 8 แห่ง ริมแม่น้ำโขง

ลำดับ	เขื่อน	อัตราระบายสูงสุด (ล้าน ลบ.ม./วัน)	ระบาย (ลบ.ม./วินาที)	เปิดบาน (ระยะ ม. X จำนวนบาน)
1	ปตร.ลำน้ำเลยเดิม จ.เลย	35	15.30	0.25x2
2	ปตร.ศรีสองรัก จ.เลย	216	-	ปิดบาน
3	ปตร.ห้วยโมง จ.หนองคาย	118	-	ปิดบาน
4	ปตร.น้ำสวย จ.หนองคาย	86	-	ปิดบาน
5	ปตร.ห้วยหลวง จ.หนองคาย	86	32.61	0.25x1
6	ปตร.ห้วยคาด จ.บึงกาฬ	78	-	ปิดบาน
7	ปตร.ห้วยกำแพง จ.บึงกาฬ	43	1.37	0.05x1
8	ปตร.ห้วยบางบาด จ.บึงกาฬ	19	2.10	0.20x1

สถานการณ์น้ำท่าในแม่น้ำโขง

ลำดับ	สถานี	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	+สูง/-ต่ำกว่าตลิ่ง (ม.รทก.)
1	สถานีจิ่งหง ประเทศจีน	+549.20	+535.89	-13.31
2	สถานีเชียงแสน จ.เชียงราย	+369.91	+359.76	-10.15
3	หลวงพระบาง สปป.ลาว	+285.20	+276.30	-8.90
4	สถานีเชียงคาน จ.เลย	+210.12	+199.42	-10.70
5	สถานีหนองคาย จ.หนองคาย	+165.85	+155.58	-10.27
6	สถานีนครพนม จ.นครพนม	+144.68	+134.85	-9.83
7	สถานีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร	+136.72	+126.78	-9.94
8	สถานีโขงเจียม จ.อุบลราชธานี	+103.53	+92.45	-11.08

สถานการณ์น้ำท่า อยู่ในสภาวะปกติ

7. สถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลอง

ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง

ลำดับ	เขื่อน	ความจุอ่าง (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น % ความจุ	ไหลเข้าอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)	ระบาย (ล้าน ลบ.ม.)
1	เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี	17,745	17,403	98%	19.04	19.98
2	เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี	8,860	8,549	96%	5.26	12.00

ระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนแม่กลอง 422 ลบ.ม./วินาที กรณีระบาย 800 ลบ.ม./วินาที จึงมีผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณท้ายน้ำ

สถานการณ์น้ำท่า อยู่ในสภาวะปกติ

8. สถานการณ์น้ำภาคใต้

ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง

ลำดับ	เขื่อน	ความจุอ่าง (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น % ความจุ	ไหลเข้าอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)	ระบาย (ล้าน ลบ.ม.)
1	เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี	710	679	96%	2.71	3.03
2	เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์	391	331	85%	2.66	2.05
3	เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี	5,639	4,249	75%	7.64	11.87
4	เขื่อนบางลาง จ.ยะลา	1,454	771	53%	5.81	3.85

ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 44 แห่ง (4 พ.ย. 69) ความจุรวม 727 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน 388 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 53% โดยอ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำมากกว่า 100 % จำนวน 2 แห่ง ปริมาณน้ำระหว่าง 80 - 100% จำนวน 11 แห่ง ปริมาณน้ำระหว่าง 50 - 80 % จำนวน 12 แห่ง ปริมาณน้ำระหว่าง 31 - 50 % จำนวน 11 แห่ง และปริมาณน้ำน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 % จำนวน 8 แห่ง

สถานการณ์น้ำท่า อยู่ในสภาวะปกติ

9. แผน-ผลการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2569

กรมชลประทาน วางแผนจัดสรรน้ำจากโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางในช่วงฤดูฝนปี 2569 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 – 31 ธันวาคม 2569) ดังนี้

- **ลุ่มน้ำแม่กลอง** ปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 จำนวน 4,211 ล้าน ลบ.ม. มีความต้องการใช้น้ำ 3,999 ล้าน ลบ.ม. วางแผนจัดสรรน้ำ จำนวน 4,000 ล้าน ลบ.ม. โดยจัดลำดับความสำคัญตามกิจกรรม ดังนี้ อุปโภค-บริโภค 490 ล้าน ลบ.ม. การรักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 1,340 ล้าน ลบ.ม. และการเกษตร 2,170 ล้าน ลบ.ม. วางแผนการเพาะปลูกข้าวนาปี จำนวน 0.89 ล้านไร่

สรุปแผน-ผลจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2569 การเพาะปลูกข้าวนาปี (1 ก.ค. 69 – 31 ธ.ค. 70)							
ลุ่มน้ำ	การจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2569 (ล้าน ลบ.ม.) ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย. 69			การเพาะปลูกข้าวนาปี (ล้านไร่) ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 69			
	แผน	ผล	คงเหลือ	แผน	ผล	เพิ่มจากสัปดาห์ที่แล้ว	เก็บเกี่ยว
แม่กลอง (1 ก.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69)	4,000	3,425 (86%)	575 (14%)	0.89	0.89 (99%)	0.01	0.23

10. แผน-ผลการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2569/70

กรมชลประทาน วางแผนจัดสรรน้ำจากโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศในช่วงฤดูแล้งปี 2569/70 (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 – 30 เมษายน 2570) ดังนี้

- **ทั้งประเทศ** มีปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 จำนวน 43,479 ล้าน ลบ.ม. สำรองน้ำไว้สำหรับต้นฤดูฝน 15,470 ล้าน ลบ.ม. โดยมีแผนจัดสรรน้ำ 28,009 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นความต้องการใช้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค 2,738 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศ 7,991 ล้าน ลบ.ม. เกษตรกรรม 16,807 ล้าน ลบ.ม. อุตสาหกรรม 468 ล้าน ลบ.ม. และคาดการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปรัง 9.39 ล้านไร่
- **ลุ่มน้ำเจ้าพระยา** มีปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 จำนวน 12,239 ล้าน ลบ.ม. สำรองน้ำไว้สำหรับต้นฤดูฝน 4,239 ล้าน ลบ.ม. โดยมีแผนจัดสรรน้ำ 9,000 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นความต้องการใช้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค 1,150 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศ 1,285 ล้าน ลบ.ม. เกษตรกรรม 6,430 ล้าน ลบ.ม. อุตสาหกรรม 135 ล้าน ลบ.ม. และคาดการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปรัง 6.28 ล้านไร่

สรุปแผน-ผลจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2569/70 การเพาะปลูกข้าวนาปรัง (1 พ.ย. 69 – 30 เม.ย. 70)

ลุ่มน้ำ	การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2569/70 (ล้าน ลบ.ม.) ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย. 69			การเพาะปลูกข้าวนาปรัง (ล้านไร่) ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 69			
	แผน	ผล	คงเหลือ	แผน	ผล	เพิ่มจากสัปดาห์ที่แล้ว	เก็บเกี่ยว
ทั้งประเทศ	28,009	583 (3%)	27,426 (97%)	9.39	-	-	-
เจ้าพระยา	9,000	146 (2%)	8,854 (98%)	6.28	-	-	-

11. การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ

- **พื้นที่บางระกำ** กรมชลประทานเริ่มส่งน้ำเข้าระบบชลประทาน วันที่ 15 มี.ค. 69 เกษตรกรเริ่มการเพาะปลูกข้าวนาปี วันที่ 1 เม.ย. 69 คาดว่าสิ้นสุดการส่งน้ำ วันที่ 31 ก.ค. 69 ทั้งนี้ กรมชลประทานวางแผนให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวนาปีแล้วเสร็จภายในกลางเดือนสิงหาคม 2569 เพื่อเตรียมรองรับน้ำหลาก **พื้นที่คาดการณ์ 0.28 ล้านไร่ ปัจจุบัน (7 ต.ค. 69) เพาะปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 0.28 ล้านไร่ (100%) เก็บเกี่ยวแล้ว 0.28 ล้านไร่ (100%)** พื้นที่ทุ่งบางระกำ **รับน้ำเข้าพื้นที่เต็มความจุได้ 400 ล้าน ลบ.ม.**ปัจจุบัน (4 พ.ย. 69) มีการรับน้ำเข้าพื้นที่รวมกับปริมาณน้ำที่เกิดจากฝนในพื้นที่ 51 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 13
- **พื้นที่ลุ่มต่ำ 10 ทุ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง** กรมชลประทานส่งน้ำเข้าระบบชลประทาน วันที่ 15 เม.ย. 69 เกษตรกรเริ่มการเพาะปลูกข้าวนาปี วันที่ 1 พ.ค. 69 คาดว่าสิ้นสุดการส่งน้ำ วันที่ 31 ส.ค. 69 ทั้งนี้ กรมชลประทานวางแผนให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวนาปีแล้วเสร็จภายในกลางเดือนกันยายนถึงต้นตุลาคม 2569 เพื่อเตรียมรองรับน้ำหลาก**พื้นที่คาดการณ์ 0.92 ล้านไร่ ปัจจุบัน (7 ต.ค. 69) เพาะปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 0.92 ล้านไร่ (100%) เก็บเกี่ยวแล้ว 0.92 ล้านไร่ (100%)** พื้นที่ 10 ทุ่งลุ่มต่ำ **รับน้ำเข้าพื้นที่เต็มความจุได้ 1,306 ล้าน ลบ.ม.** ปัจจุบัน (4 พ.ย. 69) มีการรับน้ำเข้าพื้นที่รวมกับปริมาณน้ำที่เกิดจากฝนในพื้นที่ 998 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76

12. คุณภาพน้ำ วันที่ 5 พ.ย. 69 เวลา (07.00 น.)

กรมชลประทานดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) บริเวณพื้นที่เฝ้าระวัง 4 แม่น้ำสายหลัก ประกอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง ค่าความเค็ม ณ จุดเฝ้าระวังอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้ง 4 แม่น้ำ มีรายละเอียดดังนี้

แม่น้ำ	สถานีเฝ้าระวัง/ควบคุม	เกณฑ์เฝ้าระวัง (กรัม/ลิตร)	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)
แม่น้ำเจ้าพระยา	ประปาสำแล จ.ปทุมธานี	0.25	0.13 (ปกติ)
		วันที่ 4 พ.ย. 69 ค่าความเค็มสูงสุด 0.14 กรัมต่อลิตร	
แม่น้ำบางปะกง	วัดบางคาง	1.00	0.04 (ปกติ)
แม่น้ำท่าจีน	ด้านนอกคลองจินดา	0.75	0.44 (ปกติ)
	ด้านในคลองจินดา	0.75	0.39 (ปกติ)
แม่น้ำแม่กลอง	อัมพวา	2.00	0.13 (ปกติ)

13. การให้ความช่วยเหลือเครื่องจักร-เครื่องมือ สำหรับช่วงฤดูฝน ปี 2569

กรมชลประทาน เตรียมความพร้อมเครื่องจักร - เครื่องมือ ไว้ดังนี้ เครื่องสูบน้ำ 1,914 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 367 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 203 เครื่อง และเครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 3,248 หน่วย รวมทั้งสิ้น 5,732 หน่วย ปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 69 **ดำเนินการช่วยเหลือแล้ว 70 จังหวัด เครื่องจักร-เครื่องมือรวม 1,657 หน่วย แบ่งเป็นเครื่องสูบน้ำ 1,197 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 5 คัน เครื่องผลักดันน้ำ 319 เครื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ 136 หน่วย** (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 69)

14. การคาดการณ์ปริมาณน้ำ ณ วันที่ 1 พ.ค. 70 กรณีฝนคาดการณ์ 6 เดือน TMD (คาดการณ์ ณ วันที่ 1 พ.ย. 69)

ลุ่มน้ำ	น้ำเก็บกัก	น้ำใช้การ	เทียบน้ำใช้การ
ทั้งประเทศ (อ่างฯใหญ่)	45,308 (64%)	21,759 (46%)	ปี 70 มากกว่า ปี 69 **2,866**
เจ้าพระยา	13,240 (53%)	6,532 (36%)	ปี 70 น้อยกว่า ปี 69 **1,001**
แม่กลอง (1 ม.ค. 70)	26,136 (98%)	12,859 (96%)	ปี 69 มากกว่า ปี 68 **2,716**

หน่วย ล้าน ลบ.ม.

15. โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อการช่วยเหลือเกษตรกร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 กรมชลประทาน รวมระยะเวลาการจ้างแรงงาน 12 เดือน (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569)

หลักเกณฑ์การจ้างแรงงาน ประกอบด้วย (1) เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินโครงการ (2) สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ (3) ประชาชนทั่วไป และผู้ใช้แรงงานทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย/ภัยแล้ง (4) เกษตรกรลูกหนี้ในโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) (5) ประชาชน และผู้ใช้แรงงานทั่วไปในพื้นที่ (6) หากแรงงานที่ต้องการในพื้นที่เป้าหมายมีไม่เพียงพอ ให้พิจารณาจ้างเกษตรกร/แรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงจากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับ **แผนการจ้างแรงงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 84,512 คน วงเงิน 5,824.55 ล้านบาท ปัจจุบัน (30 ก.ย. 69) มีการจ้างแรงงานไปแล้ว 94,122 คน วงเงิน 4,670.23 ล้านบาท**

16.พื้นที่ประสบอุทกภัย 2569

จากอิทธิพลของ ร่องมรสุม/มรสุม ที่พัดผ่านประเทศไทย มีพื้นที่ ประสบอุทกภัยรวมทั้งสิ้น 62 จังหวัด ดังนี้

○ จังหวัดที่เข้าสู่สภาวะปกติ 56 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร อุดรธานี เลย สกลนคร หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด ลพบุรี เพชรบูรณ์ สระบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และยะลา

○ จังหวัดที่ประสบอุทกภัย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก นครปฐม ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี

ลำดับ	วันเริ่มอุทกภัย	สชป.	ลุ่มน้ำ	จังหวัด	อำเภอ (จำนวน)	รายชื่ออำเภอ	จุดประสบภัย							พื้นที่ประสบภัย	
							ล้นตลิ่ง	ลำน้ำที่น้ำล้นตลิ่ง	น้ำป่าไหลหลาก	ท่วมขัง	ในเขตชลประทาน	นอกเขตชลประทาน	ระดับน้ำ (ม.)	ไร่	ครัวเรือน
1	26 ก.ย. 69	9	บางปะกง	นครนายก	1	องครักษ์	✓	แม่น้ำนครนายก		✓	✓	✓	0.30 - 0.50		23,654
2	24 ก.ย. 69	13	ท่าจีน	นครปฐม	4	บางเลน นครชัยศรี สามพราน กำแพงแสน	✓	แม่น้ำท่าจีน คลองเจดีย์บูชา คลองท่าผา-บางแก้ว คลองสัมปทวน คลองบางพระ คลองจินดา		✓	✓	✓	0.20 - 0.30	12,155	1,632
3	24 ก.ย. 69	11	บางปะกง	ฉะเชิงเทรา	3	บางคล้า พนมสารคาม ราชสาส์น				✓	✓				4
4	22 ก.ย. 69	9	บางปะกง	ปราจีนบุรี	4	บ้านสร้าง เมืองปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ศรีมโหสถ				✓	✓	✓			
5	21 ก.ย. 69	10	เจ้าพระยา	พระนครศรีอยุธยา	9	เสนา ผักไห่ บางบาล บางไทร พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางปะหัน ลาดบัวหลวง บางซ้าย	✓	แม่น้ำน้อย แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี		✓		✓	0.10 - 0.60		24,536
6	18 ก.ย. 69	12	ท่าจีน	สุพรรณบุรี	4	บางปลาม้า สองพี่น้อง เมืองสุพรรณบุรี อู่ทอง	✓	แม่น้ำท่าจีน คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง คลองท่าว้า		✓		✓	0.30 - 0.60		21,735
รวม					25		4		0	6	4	5		12,155	71,561

17. การประเมินแนวโน้มสถานการณ์และการเตรียมความพร้อม ปี 2569

กรมชลประทานได้ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง พบว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มคลี่คลาย โดยปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์และท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลดลงจากวันก่อน อย่างไรก็ตาม ยังมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 10 จังหวัด และมีระดับน้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำบางสาย จึงให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร พร้อมปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนและอาคารชลประทานตามปริมาณน้ำไหลเข้าและสภาพพื้นที่ท้ายน้ำ โดยคำนึงถึงฝนที่อาจตกเพิ่มเติมและอิทธิพลน้ำทะเลหนุน เพื่อให้พื้นที่ได้รับผลกระทบกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ควบคู่กันนี้ ได้บริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รายพื้นที่ โดยอ่างที่มีระดับน้ำสูงให้ควบคุมการระบายอย่างเหมาะสมกับความสามารถในการรองรับน้ำของลำน้ำท้ายน้ำ ส่วนพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เก็บกักน้ำเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน พร้อมประเมินน้ำใช้การและวางแผนจัดสรรน้ำรองรับฤดูแล้งปี 2569/2570 โดยให้ความสำคัญกับการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ และการเกษตรตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่
