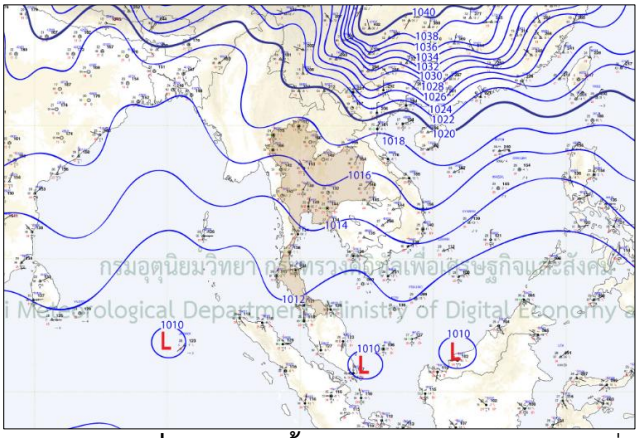
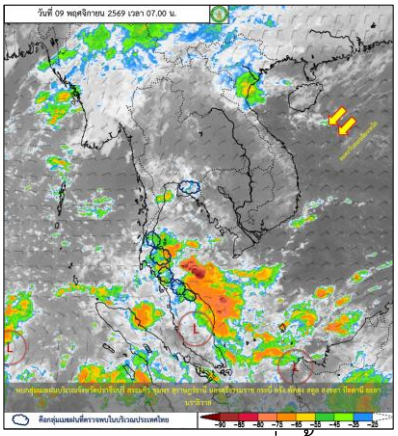
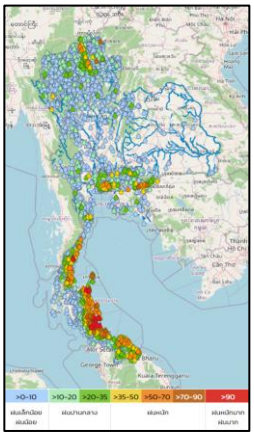
รายงานสรุปสถานการณ์และการเฝ้าระวัง
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

1. การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่อากาศ


<u>แผนที่อากาศผิวพื้นและพยากรณ์อากาศ</u> (วันที่ 9 พ.ย. 69) ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้น

<u>พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า (วันที่ 9 พ.ย. – 15 พ.ย. 69)</u> ในช่วงวันที่ 9 – 12 พ.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนน้อย และมีอากาศเย็นลง กับมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 3 - 5 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก จะมีอุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ สำหรับภาคเหนือตอนบนในวันที่ 11 พ.ย. 69 จะมีฝนฟ้าคะนอง ลูกเห็บตก และลมกระโชกแรงบางพื้นที่ เนื่องจากจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านบริเวณดังกล่าว หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 13 - 15 พ.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 9 – 15 พ.ย. 69 ยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง เนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน จะมีกำลังแรงขึ้น หลังจากนั้นภาคใต้จะมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง

<u>ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 1 พ.ย. 69</u> ข้อมูลรายสัปดาห์จากกรมอุตุนิยมวิทยา ปริมาณฝนทั้งประเทศ <u>ต่ำกว่าค่าปกติ 4%</u> ค่าปกติ 1,477.9 มม. ปริมาณฝน 1,413.2 มม. แบ่งเป็น **ภาคเหนือ** ต่ำกว่าค่าปกติ 5% **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** ต่ำกว่าค่าปกติ 6% **ภาคกลาง** สูงกว่าค่าปกติ 2% **ภาคตะวันออก** ต่ำกว่าค่าปกติ 1% **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** ต่ำกว่าค่าปกติ 16% และ**ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** สูงกว่าค่าปกติ 1%

<u>โดยปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาสูงสุด 3 ลำดับ</u> (1) ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ปริมาณฝน 137.0 มม. (2) ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ปริมาณฝน 137.0 มม. และ (3) ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ปริมาณฝน 125.5 มม.

<u>สถานการณ์เอลนีโญ/ลานีญา ปี 2569</u>

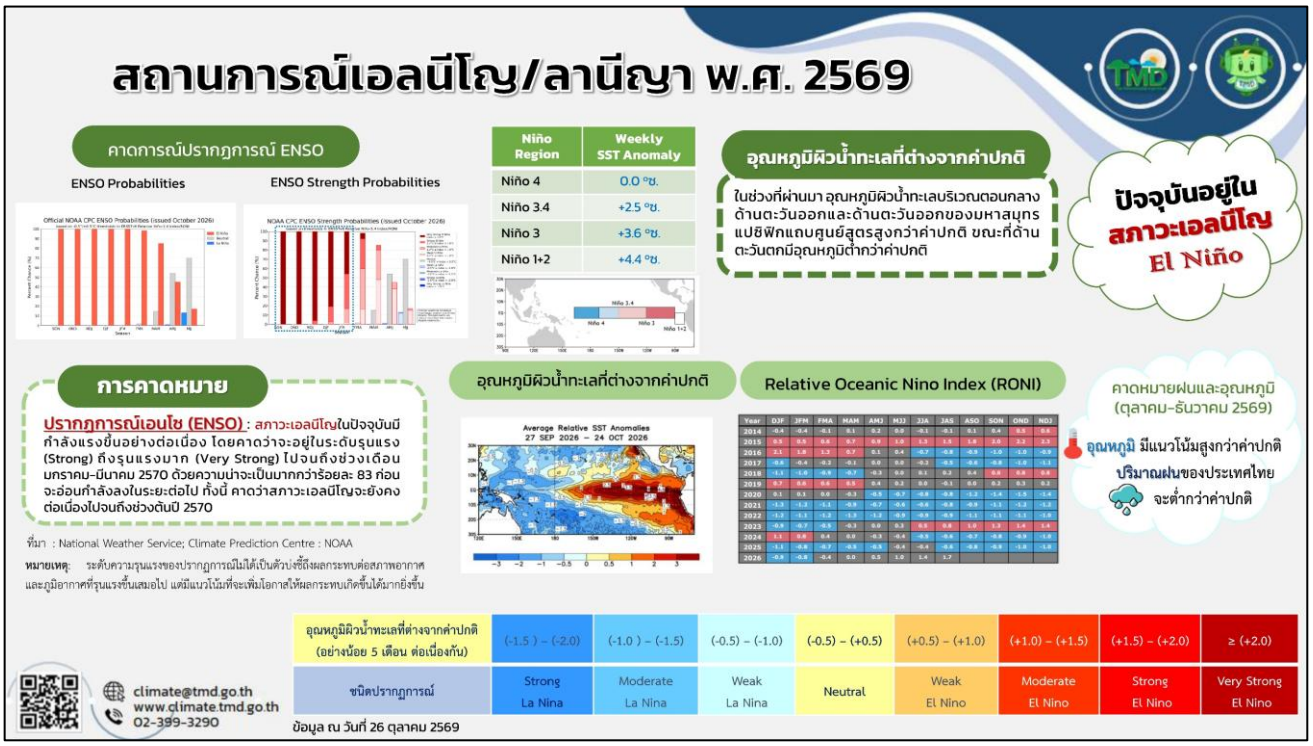

ปัจจุบันอยู่ใน**สภาวะเอลนีโญ** โดยมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะอยู่ในระดับรุนแรง (Strong) ถึงรุนแรงมาก (Very Strong) ไปจนถึงช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2570 ด้วยความน่าจะเป็นมากกว่าร้อยละ 83 ก่อนจะอ่อนกำลังลงในระยะต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าสภาวะเอลนีโญจะยังคงต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปี 2570

2. สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย. 69)

2.1 ปริมาณน้ำเก็บกักทั้งประเทศ 496 แห่ง (อ่างฯใหญ่ 35 แห่ง + อ่างฯกลาง 461 แห่ง) = 63,910 ล้าน ลบ.ม. (83%) (ปี 2568 = 68,849 ล้าน ลบ.ม.) **<u>น้อยกว่าปีก่อน 4,939 ล้าน ลบ.ม.</u>** ปริมาณน้ำใช้การ = 39,934 ล้าน ลบ.ม. (76%) (ปี 2568 = 44,867 ล้าน ลบ.ม.) **<u>น้อยกว่าปีก่อน 4,933 ล้าน ลบ.ม.</u>** รับน้ำได้อีก = <u>12,786</u> ล้าน ลบ.ม. (17%)

2.2 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง

- **อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่** มีปริมาณน้ำรวม 59,104 ล้าน ลบ.ม. (83%) เป็นน้ำใช้การได้ 35,554 ล้าน ลบ.ม. (75%)
  - **ปริมาณน้ำมากกว่า 80% <u>มีจำนวน 22 แห่ง</u>** คือ (1) แม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ (2) กิ่วลม จ.ลำปาง (3) กิ่วคอหมา จ.ลำปาง (4) แควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก (5) แม่มอก จ.ลำปาง (6) จุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ (7) ลำตะคอง จ.นครราชสีมา (8) ลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา (9) สิรินธร จ.อุบลราชธานี (10) ป่าสักชลสิทธิ์ จ.สระบุรี (11) ทับเสลา จ.อุทัยธานี (12) กระเสียว จ.สุพรรณบุรี (13) ศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี (14) วชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี (15) ขุนด่านปราการชล จ.นครนายก (16) คลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา (17) บางพระ จ.ชลบุรี (18) หนองปลาไหล จ.ชลบุรี (19) ประแสร์ จ.ระยอง (20) นฤบดินทรจินดาจ.ปราจีนบุรี (21) แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี (22) ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

- **ปริมาณน้ำมากกว่า 51% - 80% มีจำนวน 13 แห่ง** คือ (1) ภูมิพล จ.ตาก (2) สิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ (3) แม่กวงอุดมธาราจ.เชียงใหม่ (4) ห้วยหลวง จ.อุดรธานี (5) น้ำอูน จ.สกลนคร (6) น้ำพุง จ.สกลนคร (7) อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น (8) ลำปาว จ.กาฬสินธุ์ (9) มูลบน จ.นครราชสีมา (10) ลำแชะ จ.นครราชสีมา (11) ลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ (12) รัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี (13) บางลาง จ.ยะลา
- **ปริมาณน้ำระหว่าง 31% - 50 % มีจำนวน - แห่ง** คือ
- **ปริมาณน้ำน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30% มีจำนวน - แห่ง** คือ -
- **อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่ปริมาณน้ำเกิน Upper Rule Curve (URC) จำนวน 4 แห่ง** คือ (1) ทับเสลา จ.อุทัยธานี (2) บางพระ จ.ชลบุรี (3) หนองปลาไหล จ.ชลบุรี (4) นฤบดินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี
- **อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่ปริมาณน้ำต่ำกว่า lower Rule Curve) LRC) จำนวน - แห่ง** คือ -

○ **สถานการณ์ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (9 พ.ย. 69)** ปริมาณน้ำในอ่าง 4 อ่างรวม = 18,885 ล้าน ลบ.ม. (76%) (ปี 2568 = 24,435 ล้าน ลบ.ม.) **น้อยกว่าปีก่อน 5,550 ล้าน ลบ.ม.** ปริมาณน้ำใช้การ = 12,177 ล้าน ลบ.ม. (67%) **เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 15 ล้าน ลบ.ม** (ปี 2568 = 17,727 ล้าน ลบ.ม.) **น้อยกว่าปีก่อน 5,550 ล้าน ลบ.ม.**รับน้ำได้อีก = 5,898 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569

อ่างเก็บน้ำ	ความจุ ที่ รนก.	ความจุ ใช้การ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		รับน้ำได้อีก
			ปริมาณน้ำ	% ความจุ	ปริมาณน้ำ	% ใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	13,462	9,662	9,636	72	5,836	60	26.31	18.48	10.00	10.00	3,826
สิริกิติ์	9,510	6,660	7,574	80	4,724	71	16.93	16.75	30.06	29.89	1,936
ภูมิพล+สิริกิติ์	22,972	16,322	17,209	75	10,559	65	43.24	35.23	40.06	39.89	5,763
แควน้อยฯ	939	896	839	89	796	89	8.63	8.94	0.86	0.86	100
ป่าสักชลสิทธิ์	872	857	836	96	822	96	7.06	7.06	0.44	0.44	35
รวมทั้งหมด	24,783	18,075	18,885	76	12,177	67	58.93	51.23	41.36	41.19	5,898

*หมายเหตุ : ( ) คือ เกินความจุเก็บกักปกติ / ปรับความจุเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ วันที่ 22 มิ.ย.69 (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

2.3 สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 461 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย. 69)

อ่างเก็บน้ำขนาดกลางปริมาณน้ำปัจจุบัน 4,762 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 82% โดยอ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำมากกว่า 100 % จำนวน 96 แห่ง ปริมาณน้ำระหว่าง 80-100 % จำนวน 163 แห่ง ปริมาณน้ำระหว่าง 50-80 % จำนวน 125 แห่ง ปริมาณน้ำระหว่าง 31-50 % จำนวน 50 แห่งและปริมาณน้ำน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 % จำนวน 27 แห่ง

2.4 การจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC

การจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ สนับสนุน การผลิตน้ำประปา รักษาระบบนิเวศน์ การเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ปริมาณน้ำในอ่างอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีปริมาณน้ำเก็บกัก ณ วันที่ 8 พ.ย. 69 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่ง ดังนี้

ลำดับ	เขื่อน	ความจุอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น % ความจุ	ไหลเข้าอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)	ระบาย (ล้าน ลบ.ม.)
	อ่างเก็บน้ำขนาดขนาดใหญ่					
1	คลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา	420	382	91%	2.15	0.01
2	บางพระ จ.ชลบุรี*	117	119	102%	1.66	0.70
3	หนองปลาไหล จ.ระยอง*	164	180	110%	2.01	2.96
4	ประแสร์ จ.ระยอง*	295	288	98%	3.10	0.79
	อ่างเก็บน้ำขนาดขนาดกลาง					
1	คลองระบม จ.ฉะเชิงเทรา	56	50	90%	0.03	0.01
2	คลองประแกด จ.จันทบุรี	60	67	111%	1.48	1.48
3	แก่งหางแมว จ.จันทบุรี	81	83	102%	0.41	0.23
4	หนองค้อ จ.ชลบุรี*	21	22	103%	0.59	0.59
5	คลองหลวงรัชชโลทร จ.ชลบุรี*	98	121	123%	1.18	1.18
6	ดอกกราย จ.ระยอง*	71	75	105%	1.57	1.57
7	คลองใหญ่ จ.ระยอง*	51	44	88%	0.09	0.09
8	5 อ่างฯพัทยา จ.ชลบุรี*	40	34	84%	0.50	0.39

และมีการสูบผันน้ำ วันที่ 7 พ.ย. 69 ดังนี้

ลำดับ	แนวผันน้ำ	แผนการสูบผันน้ำ (ลบ.ม.)	ปี พ.ศ.	สูบ/ผัน (ลบ.ม./วัน)	สะสม (ลบ.ม.)	หมายเหตุ
1	1.1 สูบผันน้ำคลองพระองค์ฯ – อ่างฯ บางพระ	70,000,000	ผลปี 2568	-	52,261,521 (74%)	1 ก.ค. – 31 ธ.ค.68
		70,000,000	ผลปี 2569	หยุดสูบ	46,516,770 (66%)	ม.ค.69 - ปัจจุบัน
	1.2 สูบผันน้ำคลองพานทอง – อ่างฯ บางพระ		ผลปี 2569	หยุดสูบ	6,454,199 (73%)	ม.ค.69 - ปัจจุบัน
		-	ผลปี 2568	-	11,315,495	6 มิ.ย. – 31 ธ.ค.68
2	สูบผันน้ำคลองสะพาน – อ่างฯ ประแสร์	-	ผลปี 2568	-	14,627,011	3 พ.ค. – 11 ก.ย.68
		25,000,000	ผลปี 2569	หยุดสูบ	28,234,466(113%)	พ.ค.69 - ก.ย.69
3	สูบผันน้ำอ่างฯ ประแสร์ – อ่างฯ คลองใหญ่	23,000,000	ผลปี 2568	-	20,976,126 (91%)	1 ม.ค. – 31 ธ.ค.68
		78,000,000	ผลปี 2569	หยุดสูบ	57,805,248(74%)	1 ม.ค.69 – ก.ย.69
4	สูบผันน้ำคลองวังโตนด - อ่างฯประแสร์	-	ผลปี 2568	-	-	-
		38,700,000	ผลปี 2569	หยุดสูบ	22,275,000(58%)	ม.ค. 69 - ก.ย.69
5	สูบกลับวัดละหารไร่ - อ่างฯหนองปลาไหล	-	ผลปี 2568	-	2,103,649	ม.ค.68 – 13 ก.ย.68
		7,000,000	ผลปี 2569	หยุดสูบ	3,741,015 (53%)	ม.ค. 69– ต.ค.69
6	สูบผันน้ำแม่น้ำบางปะกง – อ่างฯ บางพระ	22,000,000	ผลปี 2568	-	9,804,000 (45%)	17 ก.ค. - 17 ต.ค.68
		20,000,000	ผลปี 2569	หยุดสูบ	13,669,256(68%)	ม.ค. 69 – ต.ค.69
7	สูบผันน้ำอ่างฯ คลองใหญ่ – อ่างฯ หนองปลาไหล	-	ผลปี 2568	-	83,695,000	1 ม.ค. – 31 ธ.ค.68
		-	ผลปี 2569	หยุดสูบ	95,333,000	1 ม.ค. – ต.ค.69

3. สถานการณ์ระดับน้ำล้นตลิ่งปัจจุบัน ณ วันที่ 9 พ.ย. 69 เวลา 06.00 น. มีสถานีที่ระดับน้ำล้นตลิ่ง 7 สถานี (แม่น้ำน้อย ลำตะเพิน และแม่น้ำท่าจีน)

ลำดับ	ชื่อสถานี	ลุ่มน้ำ	แม่น้ำ	อำเภอ	จังหวัด	ระดับตลิ่ง (เมตร รทม.)	ความจุลำน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ (เมตร รทม.)	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง (เมตร)	แนวโน้ม
1	Kgt.30	บางปะกง	แม่น้ำบางปะกง	อ.เมือง	จ.ฉะเชิงเทรา	1.70	-	1.79	**	0.09	▲
2	K.49	แม่กลอง	ลำตะเพิน	อ.บ่อพลอย	จ.กาญจนบุรี	4.50	-	4.83	-	0.33	▼
3	T.1	ท่าจีน	แม่น้ำท่าจีน	อ.นครชัยศรี	จ.นครปฐม	11.20	-	11.64	**	0.44	▼
4	T.10	ท่าจีน	แม่น้ำท่าจีน	อ.เมือง	จ.สุพรรณบุรี	6.00	-	6.70	-	0.70	▲
5	T.13	ท่าจีน	แม่น้ำท่าจีน	อ.สองพี่น้อง	จ.สุพรรณบุรี	6.40	-	7.13	**	0.73	▲
6	T.14	ท่าจีน	แม่น้ำท่าจีน	อ.สามพราน	จ.นครปฐม	10.30	-	10.40	**	0.10	▲
7	T.15	ท่าจีน	แม่น้ำท่าจีน	อ.บางเลน	จ.นครปฐม	7.80	-	8.89	**	1.09	▲

▼ ลดลง — ทรงตัว ▲ เพิ่มขึ้น ข้อมูลจาก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน 1-8

4. สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ (เวลา 06.00 น.) **P.17** (260 ลบ.ม./วินาที เมื่อวาน 94 ลบ.ม./วินาที), **N.67** (692 ลบ.ม./วินาที เมื่อวาน 601 ลบ.ม./วินาที), **C.2** (969 ลบ.ม./วินาที เมื่อวาน 746 ลบ.ม./วินาที, **C.13 ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา** 500 ลบ.ม./วินาที เมื่อวาน 500 ลบ.ม./วินาที) และมีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา +16.58 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.38 ม.รทก.) ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ **C.29B** อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เฉลี่ย 725 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 725 ลบ.ม./วินาที), **รับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก** 476 ลบ.ม./วินาที เมื่อวาน 203 ลบ.ม./วินาที (ฝั่งตะวันตก 245 ลบ.ม./วินาที เมื่อวาน 122 ลบ.ม./วินาที, ฝั่งตะวันออก 231 ลบ.ม./วินาที เมื่อวาน 81 ลบ.ม./วินาที)

แจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 7 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569 จากการคาดการณ์ ที่สถานี C2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่าน ประมาณ 3,010 ลบ.ม./วินาที กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ระหว่าง 2,200 - 2,500 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.40 – 0.70 ม. บริเวณพื้นที่ลุ่มตำนอกคันกั้นน้ำบริเวณ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโยโย จังหวัดอ่างทอง อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมที่ชุมชนในคันกั้นน้ำ



5. สถานการณ์ลุ่มน้ำชี-มูล

5.1 ลุ่มน้ำชี

ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 3 แห่ง

ลำดับ	เขื่อน	ความจุอ่าง (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น % ความจุ	ไหลเข้าอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม./วัน)	ระบาย (ล้าน ลบ.ม./วัน)
1	เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	2,431	1,388	57%	-	2.03
2	เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์	1,980	1,109	56%	-	2.12
3	เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ	164	142	87%	0.62	-

เขื่อนระบายน้ำกลางแม่น้ำชี 6 แห่ง

ลำดับ	เขื่อน	ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ระดับน้ำหน้าเขื่อน (ม.ทรก.)	คิดเป็น % ความจุ	ระบาย (ลบ.ม./วินาที)	เปิดบาน (ระยะ ม. X จำนวนบาน)
1	เขื่อนชนบท จ.ขอนแก่น	16	+162.60	96%	14.90	0.03x6
2	เขื่อนมหาสารคาม จ.มหาสารคาม	24	+147.00	83%	101.00	0.15x1,0.20x5
3	เขื่อนวังยาง จ.กาฬสินธุ์	34	+137.49	86%	70.06	0.15x6
4	เขื่อนร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	16	+131.00	80%	84.11	0.20x6
5	เขื่อนยโสธร จ.ยโสธร	19	+125.19	95%	103.13	0.10x4,0.15x4
6	เขื่อนธาตุน้อย จ.อุบลราชธานี	56	+116.10	99%	91.61	0.10x4,0.20x4

สถานการณ์น้ำท่า อยู่ในสภาวะปกติ

5.2 ลุ่มน้ำมูล

ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 6 แห่ง

ลำดับ	เขื่อน	ความจุอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น % ความจุ	ไหลเข้าอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม./วัน)	ระบาย (ล้าน ลบ.ม./วัน)
1	เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา	314	274	87%	1.00	0.09
2	เขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา	155	126	81%	0.49	-
3	เขื่อนมูลบน จ.นครราชสีมา	141	89	63%	0.60	0.04
4	เขื่อนลำแชะ จ.นครราชสีมา	275	168	61%	0.66	0.81
5	เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์	121	67	55%	0.05	-
6	เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี	1,966	1,750	89%	-	7.02

เขื่อนระบายน้ำกลางแม่น้ำมูล 4 แห่ง

ลำดับ	เขื่อน	ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ระดับน้ำหน้าเขื่อน (ม.ทรก.)	คิดเป็น % ความจุ	ระบาย (ลบ.ม./วินาที)	เปิดบาน (ระยะ ม. X จำนวนบาน)
1	เขื่อนพิมาย จ.นครราชสีมา	3.6	+152.26	109%	36.33	1.50x1
2	เขื่อนราศีไศล จ.ศรีสะเกษ	74	+119.14	102%	-	ปิดบานx7
3	เขื่อนหัวนา จ.ศรีสะเกษ	65	+112.41	110%	125.58	0.90x2,ปิดบานx12
4	เขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี	225	+106.83	N/A	279.05	ปิดบาน

สถานการณ์น้ำท่า ที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี มีการติดตามที่สถานีวัดน้ำ **M.7** สะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนลงแม่น้ำโขง ที่ระดับตลิ่ง +113.50 ม.รทก. มีความจุลำน้ำ 3,200 ลบ.ม./วินาที (กรมชลประทานเสริมกำแพงปิดช่องว่าง) ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ +107.47 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 211.00 ลบ.ม./วินาที คิดเป็น 7% ของความจุลำน้ำ (ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งเสริมคัน 6.03 เมตร ปริมาณน้ำน้อยกว่าความจุ 2,989.00 ลบ.ม./วินาที)

สถานการณ์น้ำท่า อยู่ในสภาวะปกติ

6. สถานการณ์ลุ่มน้ำโขง

ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง

ลำดับ	เขื่อน	ความจุอ่าง (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น % ความจุ	ไหลเข้าอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม./วัน)	ระบาย (ล้าน ลบ.ม./วัน)
1	เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี	136	74	54%	-	0.08
2	เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร	520	293	56%	0.22	0.01

ประตูระบายน้ำ 8 แห่ง ริมแม่น้ำโขง

ลำดับ	เขื่อน	อัตราระบายสูงสุด (ล้าน ลบ.ม./วัน)	ระบาย (ลบ.ม./วินาที)	เปิดบาน (ระยะ ม. X จำนวนบาน)
1	ปตร.ลำน้ำเลยเดิม จ.เลย	35	26.19	0.25x2
2	ปตร.ศรีสองรัก จ.เลย	216	-	ปิดบาน
3	ปตร.ห้วยโมง จ.หนองคาย	118	-	ปิดบาน
4	ปตร.น้ำสวย จ.หนองคาย	86	-	ปิดบาน
5	ปตร.ห้วยหลวง จ.หนองคาย	86	48.47	0.40x2
6	ปตร.ห้วยคาด จ.บึงกาฬ	78	-	ปิดบาน
7	ปตร.ห้วยกำแพง จ.บึงกาฬ	43	1.21	0.05x1
8	ปตร.ห้วยบางบาด จ.บึงกาฬ	19	-	ปิดบาน

สถานการณ์น้ำท่าในแม่น้ำโขง

ลำดับ	สถานี	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	+สูง/-ต่ำกว่าตลิ่ง (ม.รทก.)
1	สถานีจิ่งหง ประเทศจีน	+549.20	+535.52	-13.13
2	สถานีเชียงแสน จ.เชียงราย	+369.91	+359.77	-10.14
3	หลวงพระบาง สปป.ลาว	+285.20	+276.25	-8.87
4	สถานีเชียงคาน จ.เลย	+210.12	+200.20	-9.92
5	สถานีหนองคาย จ.หนองคาย	+165.85	+156.19	-9.66
6	สถานีนครพนม จ.นครพนม	+144.68	+134.78	-9.90
7	สถานีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร	+136.72	+126.76	-9.96
8	สถานีโขงเจียม จ.อุบลราชธานี	+103.53	+92.23	-11.30

สถานการณ์น้ำท่า อยู่ในสภาวะปกติ

7. สถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลอง

ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง

ลำดับ	เขื่อน	ความจุอ่าง (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น % ความจุ	ไหลเข้าอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)	ระบาย (ล้าน ลบ.ม.)
1	เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี	17,745	17,411	98%	29.35	19.96
2	เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี	8,860	8,556	97%	9.14	12.07

ระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนแม่กลอง 394 ลบ.ม./วินาที กรณีระบาย 800 ลบ.ม./วินาที จึงมีผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณท้ายน้ำ

สถานการณ์น้ำท่า อยู่ในสภาวะปกติ

8. สถานการณ์น้ำภาคใต้

ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง

ลำดับ	เขื่อน	ความจุอ่าง (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น % ความจุ	ไหลเข้าอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)	ระบาย (ล้าน ลบ.ม.)
1	เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี	710	681	96%	3.16	3.03
2	เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์	391	334	85%	2.66	2.05
3	เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี	5,639	4,231	75%	1.52	5.74
4	เขื่อนบางลาง จ.ยะลา	1,454	773	53%	4.87	4.02

ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 44 แห่ง (8 พ.ย. 69) ความจุรวม 727 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน 394 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 54% โดยอ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำมากกว่า 100 % จำนวน 3 แห่ง ปริมาณน้ำระหว่าง 80 - 100% จำนวน 11 แห่ง ปริมาณน้ำระหว่าง 50 - 80 % จำนวน 11 แห่ง ปริมาณน้ำระหว่าง 31 - 50 % จำนวน 11 แห่ง และปริมาณน้ำน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 % จำนวน 8 แห่ง

สถานการณ์น้ำท่า อยู่ในสภาวะปกติ

9. แผน-ผลการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2569

กรมชลประทาน วางแผนจัดสรรน้ำจากโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางในช่วงฤดูฝนปี 2569 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 – 31 ธันวาคม 2569) ดังนี้

- **ลุ่มน้ำแม่กลอง** ปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 จำนวน 4,211 ล้าน ลบ.ม. มีความต้องการใช้น้ำ 3,999 ล้าน ลบ.ม. วางแผนจัดสรรน้ำ จำนวน 4,000 ล้าน ลบ.ม. โดยจัดลำดับความสำคัญตามกิจกรรม ดังนี้ อุปโภค-บริโภค 490 ล้าน ลบ.ม. การรักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 1,340 ล้าน ลบ.ม. และการเกษตร 2,170 ล้าน ลบ.ม. วางแผนการเพาะปลูกข้าวนาปี จำนวน 0.89 ล้านไร่

สรุปแผน-ผลจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2569 การเพาะปลูกข้าวนาปี (1 ก.ค. 69 – 31 ธ.ค. 70)							
ลุ่มน้ำ	การจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2569 (ล้าน ลบ.ม.) ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย. 69			การเพาะปลูกข้าวนาปี (ล้านไร่) ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย. 69			
	แผน	ผล	คงเหลือ	แผน	ผล	เพิ่มจากสัปดาห์ที่แล้ว	เก็บเกี่ยว
แม่กลอง (1 ก.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69)	4,000	3,554 (89%)	446 (11%)	0.89	0.88 (99%)	0.01	0.23

10. แผน-ผลการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2569/70

กรมชลประทาน วางแผนจัดสรรน้ำจากโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศในช่วงฤดูแล้งปี 2569/70 (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 – 30 เมษายน 2570) ดังนี้

- **ทั้งประเทศ** มีปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 จำนวน 43,479 ล้าน ลบ.ม. สำรองน้ำไว้สำหรับต้นฤดูฝน 15,470 ล้าน ลบ.ม. โดยมีแผนจัดสรรน้ำ 28,009 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นความต้องการใช้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค 2,738 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศ 7,991 ล้าน ลบ.ม. เกษตรกรรม 16,807 ล้าน ลบ.ม. อุตสาหกรรม 468 ล้าน ลบ.ม. และคาดการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปรัง 9.39 ล้านไร่
- **ลุ่มน้ำเจ้าพระยา** มีปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 จำนวน 12,239 ล้าน ลบ.ม. สำรองน้ำไว้สำหรับต้นฤดูฝน 4,239 ล้าน ลบ.ม. โดยมีแผนจัดสรรน้ำ 9,000 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นความต้องการใช้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค 1,150 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศ 1,285 ล้าน ลบ.ม. เกษตรกรรม 6,430 ล้าน ลบ.ม. อุตสาหกรรม 135 ล้าน ลบ.ม. และคาดการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปรัง 6.28 ล้านไร่

สรุปแผน-ผลจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2569/70 การเพาะปลูกข้าวนาปรัง (1 พ.ย. 69 – 30 เม.ย. 70)

ลุ่มน้ำ	การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2569/70 (ล้าน ลบ.ม.) ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย. 69			การเพาะปลูกข้าวนาปรัง (ล้านไร่) ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย. 69			
	แผน	ผล	คงเหลือ	แผน	ผล	เพิ่มจากสัปดาห์ที่แล้ว	เก็บเกี่ยว
ทั้งประเทศ	28,009	1,151 (5%)	26,858 (95%)	9.39	0.09 (1%)	0.09	-
เจ้าพระยา	9,000	309 (4%)	8,691 (97%)	6.28	0.07 (1%)	0.07	-

11. การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ

- **พื้นที่บางระกำ** กรมชลประทานเริ่มส่งน้ำเข้าระบบชลประทาน วันที่ 15 มี.ค. 69 เกษตรกรเริ่มการเพาะปลูกข้าวนาปี วันที่ 1 เม.ย. 69 คาดว่าสิ้นสุดการส่งน้ำ วันที่ 31 ก.ค. 69 ทั้งนี้ กรมชลประทานวางแผนให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวนาปีแล้วเสร็จภายในกลางเดือนสิงหาคม 2569 เพื่อเตรียมรองรับน้ำหลาก **พื้นที่คาดการณ์ 0.28 ล้านไร่ ปัจจุบัน (7 ต.ค. 69) เพาะปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 0.28 ล้านไร่ (100%) เก็บเกี่ยวแล้ว 0.28 ล้านไร่ (100%)** พื้นที่ทุ่งบางระกำ **รับน้ำเข้าพื้นที่เต็มความจุได้ 400 ล้าน ลบ.ม.**ปัจจุบัน (7 พ.ย. 69) มีการรับน้ำเข้าพื้นที่รวมกับปริมาณน้ำที่เกิดจากฝนในพื้นที่ 45 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 11
- **พื้นที่ลุ่มต่ำ 10 ทุ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง** กรมชลประทานส่งน้ำเข้าระบบชลประทาน วันที่ 15 เม.ย. 69 เกษตรกรเริ่มการเพาะปลูกข้าวนาปี วันที่ 1 พ.ค. 69 คาดว่าสิ้นสุดการส่งน้ำ วันที่ 31 ส.ค. 69 ทั้งนี้ กรมชลประทานวางแผนให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวนาปีแล้วเสร็จภายในกลางเดือนกันยายนถึงต้นตุลาคม 2569 เพื่อเตรียมรองรับน้ำหลาก**พื้นที่คาดการณ์ 0.92 ล้านไร่ ปัจจุบัน (7 ต.ค. 69) เพาะปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 0.92 ล้านไร่ (100%) เก็บเกี่ยวแล้ว 0.92 ล้านไร่ (100%)** พื้นที่ 10 ทุ่งลุ่มต่ำ **รับน้ำเข้าพื้นที่เต็มความจุได้ 1,306 ล้าน ลบ.ม.** ปัจจุบัน (7 พ.ย. 69) มีการรับน้ำเข้าพื้นที่รวมกับปริมาณน้ำที่เกิดจากฝนในพื้นที่ 955 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 73

12. คุณภาพน้ำ วันที่ 9 พ.ย. 69 เวลา (07.00 น.)

กรมชลประทานดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) บริเวณพื้นที่เฝ้าระวัง 4 แม่น้ำสายหลัก ประกอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง ค่าความเค็ม ณ จุดเฝ้าระวังอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้ง 4 แม่น้ำ มีรายละเอียดดังนี้

แม่น้ำ	สถานีเฝ้าระวัง/ควบคุม	เกณฑ์เฝ้าระวัง (กรัม/ลิตร)	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)
แม่น้ำเจ้าพระยา	ประปาสำแล จ.ปทุมธานี	0.25	0.14 (ปกติ)
		วันที่ 8 พ.ย. 69 ค่าความเค็มสูงสุด 0.14 กรัมต่อลิตร	
แม่น้ำบางปะกง	วัดบางคาง	1.00	0.05 (ปกติ)
แม่น้ำท่าจีน	ด้านนอกคลองจินดา	0.75	0.26 (ปกติ)
	ด้านในคลองจินดา	0.75	0.40 (ปกติ)
แม่น้ำแม่กลอง	อัมพวา	2.00	0.13 (ปกติ)

13. การให้ความช่วยเหลือเครื่องจักร-เครื่องมือ สำหรับช่วงฤดูฝน ปี 2569

กรมชลประทาน เตรียมความพร้อมเครื่องจักร - เครื่องมือ ไว้ดังนี้ เครื่องสูบน้ำ 1,991 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 397 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 206 เครื่อง และเครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 3,223 หน่วย รวมทั้งสิ้น 5,817 หน่วย ปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 69 **ดำเนินการช่วยเหลือแล้ว 70 จังหวัด เครื่องจักร-เครื่องมือรวม 1,657 หน่วย แบ่งเป็นเครื่องสูบน้ำ 1,197 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 5 คัน เครื่องผลักดันน้ำ 319 เครื่อง และเครื่องจักรอื่น ๆ 136 หน่วย** (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 69)

14. การคาดการณ์ปริมาณน้ำ ณ วันที่ 1 พ.ค. 70 กรณีฝนคาดการณ์ 6 เดือน TMD (คาดการณ์ ณ วันที่ 6 พ.ย. 69)

ลุ่มน้ำ	น้ำเก็บกัก	น้ำใช้การ	เทียบน้ำใช้การ
ทั้งประเทศ (อ่างฯใหญ่)	47,632 (62%)	23,699 (45%)	ปี 70 มากกว่า ปี 69 **2,301**
เจ้าพระยา	12,265 (49%)	5,557 (31%)	ปี 70 น้อยกว่า ปี 69 **1,976**
แม่กลอง (1 ม.ค. 70)	26,136 (98%)	12,859 (96%)	ปี 69 มากกว่า ปี 68 **2,716**

หน่วย ล้าน ลบ.ม.

15. โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อการช่วยเหลือเกษตรกร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 กรมชลประทาน รวมระยะเวลาการจ้างแรงงาน 12 เดือน (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569)

หลักเกณฑ์การจ้างแรงงาน ประกอบด้วย (1) เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินโครงการ (2) สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ (3) ประชาชนทั่วไป และผู้ใช้แรงงานทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย/ภัยแล้ง (4) เกษตรกรลูกหนี้ในโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) (5) ประชาชน และผู้ใช้แรงงานทั่วไปในพื้นที่ (6) หากแรงงานที่ต้องการในพื้นที่เป้าหมายมีไม่เพียงพอ ให้พิจารณาจ้างเกษตรกร/แรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงจากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับ **แผนการจ้างแรงงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 84,512 คน วงเงิน 5,824.55 ล้านบาท ปัจจุบัน (30 ก.ย. 69) มีการจ้างแรงงานไปแล้ว 94,122 คน วงเงิน 4,670.23 ล้านบาท**

16.พื้นที่ประสบอุทกภัย 2569

จากอิทธิพลของ ร่องมรสุม/มรสุม ที่พัดผ่านประเทศไทย มีพื้นที่ ประสบอุทกภัยรวมทั้งสิ้น 62 จังหวัด ดังนี้

○ จังหวัดที่เข้าสู่สภาวะปกติ 56 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร อุดรธานี เลย สกลนคร หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด ลพบุรี เพชรบูรณ์ สระบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และยะลา

○ จังหวัดที่ประสบอุทกภัย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก นครปฐม ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี

ลำดับ	วันเริ่มอุทกภัย	สชป.	ลุ่มน้ำ	จังหวัด	อำเภอ (จำนวน)	รายชื่ออำเภอ	จุดประสบภัย							พื้นที่ประสบภัย	
							ล้นตลิ่ง	ลำน้ำที่น้ำล้นตลิ่ง	น้ำป่าไหลหลาก	ท่วมขัง	ในเขตชลประทาน	นอกเขตชลประทาน	ระดับน้ำ (ม.)	ไร่	ครัวเรือน
1	28 ก.ย. 69	9	บางปะกง	นครนายก	1	องครักษ์	✓	แม่น้ำนครนายก		✓	✓	✓	0.30 - 0.50		23,654
2	24 ก.ย. 69	13	ท่าจีน	นครปฐม	4	บางเลน นครชัยศรี สามพราน กำแพงแสน	✓	แม่น้ำท่าจีน คลองเจดีย์บูชา คลองท่าผา-บางแก้ว คลองสัมปทวน คลองบางพระ คลองจินดา		✓	✓	✓	0.15 - 0.30	11,520	1,092
3	24 ก.ย. 69	11	บางปะกง	ฉะเชิงเทรา	3	บางคล้า พนมสารคาม ราชสาส์น				✓	✓				
4	22 ก.ย. 69	9	บางปะกง	ปราจีนบุรี	4	บ้านสร้าง เมืองปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ศรีมโหสถ				✓	✓	✓			
5	21 ก.ย. 69	10	เจ้าพระยา	พระนครศรีอยุธยา	9	เสนา ผักไห่ บางบาล บางไทร พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางปะหัน ลาดบัวหลวง บางซ้าย	✓	แม่น้ำน้อย แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี		✓		✓	0.10 - 0.60		24,536
6	18 ก.ย. 69	12	ท่าจีน	สุพรรณบุรี	4	บางปลาม้า สองพี่น้อง เมืองสุพรรณบุรี อู่ทอง	✓	แม่น้ำท่าจีน คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง คลองท่าว้า		✓		✓	0.30 - 0.60		21,859
รวม					25		4		0	6	4	5		11,520	71,141

17. การประเมินแนวโน้มสถานการณ์และการเตรียมความพร้อม ปี 2569

กรมชลประทานได้ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง พบว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มคลี่คลาย โดยปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์และท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลดลงจากวันก่อน อย่างไรก็ตาม ยังมีพื้นที่ประสบอุทกภัย และมีระดับน้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำบางสาย จึงให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร พร้อมปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนและอาคารชลประทานตามปริมาณน้ำไหลเข้าและสภาพพื้นที่ท้ายน้ำ โดยคำนึงถึงฝนที่อาจตกเพิ่มเติมและอิทธิพลน้ำทะเลหนุน เพื่อให้พื้นที่ได้รับผลกระทบกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ควบคู่กันนี้ ได้บริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รายพื้นที่ โดยอ่างที่มีระดับน้ำสูงให้ควบคุมการระบายอย่างเหมาะสมกับความสามารถในการรองรับน้ำของลำน้ำท้ายน้ำ ส่วนพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เก็บกักน้ำเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน พร้อมประเมินน้ำใช้การและวางแผนจัดสรรน้ำรองรับฤดูแล้งปี 2569/2570 โดยให้ความสำคัญกับการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ และการเกษตรตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่
