



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๔๒๘

ที่ กพง ๐๖/๑๓๕๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง คู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม online กองแผนงาน) ฉบับปรับปรุงใหม่ งบ ๑๐๕๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม สำเนาเรียน อธิบดี รองอธิบดี

ด้วยกองแผนงาน ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม online) แก้ไขปรับปรุงใหม่ ตามนโยบาย RID No.๑ ด้านที่ ๒ ปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนงานและงบประมาณทั้งระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบติดตาม online สามารถบันทึกข้อมูลและรายงานผลได้ถูกต้อง พร้อมนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ QR code และเว็บไซต์กองแผนงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมทั้งได้แนบคู่มือการใช้งานมาด้วยแล้ว

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.



เรียน ผอ.สอ., ผอช.ทต., ทน ๑ - ๕ มอ.

ผอ. ๑ มท. มอ. (๐ ม. มอ.)

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)

ผอ.มอ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒



กรมชลประทาน

RID No.1

ระบบติดตาม

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

คู่มือ ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณปี พ.ศ.2562
-ปรับปรุงใหม่



Royal
Irrigation
Department



ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

คู่มือการใช้งานระบบติดตามออนไลน์

วัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรายงานผลของสำนักชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การใช้งานเข้าระบบติดตามทาง URL: <http://bid.rid.go.th/pbms/index.php> พร้อมกรอก Username และ Password เพื่อเข้าระบบ

ระบบติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน - การใช้จ่ายงบประมาณ

หน้าแรก รายงานผลฯ แจ้งรายการฯ หน้าระบบติดตาม แจ้งประวัติฯ รายงานสำหรับผู้บริหาร

User Login

Username
Password

Remember me next time **LOGIN**

คู่มือการใช้งานระบบติดตามออนไลน์-ระดับสำนักงาน

1.การเพิ่มค่าอำนาจการ

Logged in: test2 **เพิ่มค่าอำนาจการ** | งบประมาณและผลการเบิกจ่าย | ระดับหน่วยงาน - | Log out

ข่าวล่าสุดของคุณ:

1970
01/01 **การดึงข้อมูลการจ้างแรงงานเกษตรกร**

By: nidplms | 0 com | Category: agency,monitor,office

การดึงข้อมูลการจ้างแรงงานเกษตรกร ใช้วิธีการดึงโดย การdownload file excel ด้านล่าง แบ่งเป็นแต่ละส่วน...อ่านต่อ


1970
01/01 **แจ้งปรับปรุงระบบติดตามออนไลน์**

By: nidplms | 0 com | Category: agency,monitor,office,agency,monitor,office

เรียน สำนักฯ และโครงการฯ เนื่องด้วยคณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้...อ่านต่อ

1970
01/01 **ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล/หลักฐานการดำเนินงานของรายการในตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกรม(ระหว่างกรมชลประทานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ประจำปีงบประมาณ**

ระดับการใช้งานของระบบของคุณ:ระดับสำนักฯ



User: test2

รายละเอียด:

Email: ascyd@aaaaa.com

หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับสำนักฯ:
สำนักชลประทานที่ 1

id: 11b93d03e8e0ad3a4fd36ba806a68149

1.1 เลือกเมนูเพิ่มค่าอำนาจการ

กรุณาเลือก

ประเภทการ | งบประมาณและผลการเบิกจ่าย

- ส่วนกลาง สขบ.1 (ค่าอำนาจการ)
- ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขบ.1
- ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขบ.1
- ส่วนเครื่องจักรกล สขบ.1
- งานรักษานริเวณ สขบ.1
- โครงการชลประทานเชียงใหม่
- โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
- โครงการชลประทานสาหุณ
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จิด
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- โครงการก่อสร้าง 1/01 (2554)
- โครงการก่อสร้าง 2/01 (2554)
- โครงการก่อสร้าง 1
- ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 1


1.2 หน้าเว็บไซต์จะแสดงชื่อหน่วยงาน/โครงการ เลือกหน่วยงานที่ต้องการเพิ่มค่าอำนาจการ

การเพิ่มรายการคำอำนวยการของสำนัก

โปรดเลือกประมาณการ

- (1.3) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในที่ทำการโครงการ โครงการชลประทานเชียงใหม่
- (7) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่โกกั้น โครงการชลประทานเชียงใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ
- (8) ระบบส่งน้ำฝายเหมืองใหม่พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ
- (34.1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโกลเสื่อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
- (1.1) บ่อเก็บน้ำ คสล. พร้อมอาคารประกอบบ้านหนองเขี้ยว ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- (1.2) ระบบส่งน้ำบ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- (1.6) ฝายบ้านปืพล พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝ้ายที่ยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ

1.3 หน้าเว็บไซต์จะแสดงชื่อรายการประมาณในหน่วยงาน/โครงการที่เลือกทั้งหมด เลือกรายการประมาณการที่ต้องการเพิ่มรายการคำอำนวยการ

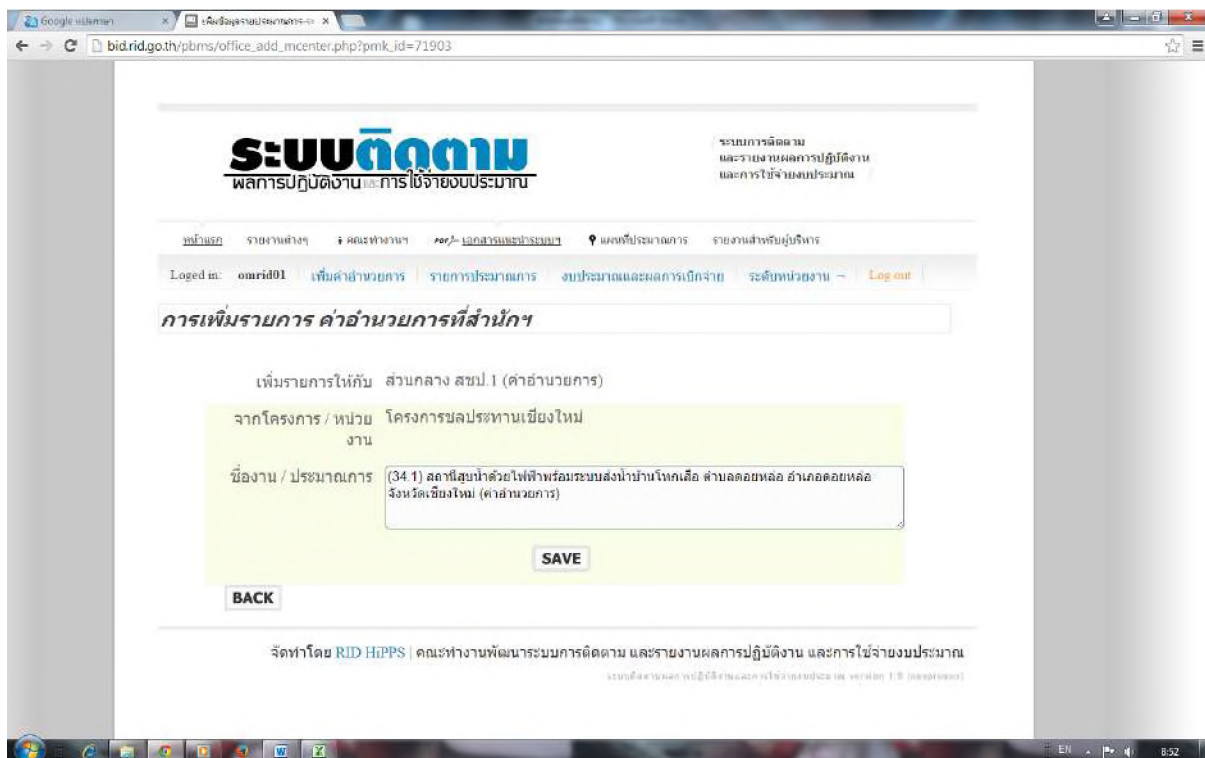

1.4 หน้าเว็บไซต์จะแสดงรายชื่อข้อมูลต่างๆ หากถูกต้องให้กด save เพื่อบันทึกข้อมูล

2. รายการประมาณการ เป็นการเพิ่มข้อมูลพื้นฐาน เช่น ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ และการระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละรายการงาน

The screenshot shows the bidrid.go.th website interface. At the top, there is a navigation menu with items like 'หน้าแรก', 'รายงานต่างๆ', 'คณะทำงานฯ', 'ประวัติ-เอกสารและงบประมาณ', 'แผนที่ประมาณการ', and 'รายงานสำหรับผู้บริหาร'. Below the menu, there is a 'Logged in: omrid01' section with a 'เพิ่มคำสั่งรายการ' button and a 'รายการประมาณการ' button highlighted with a red box and an arrow. The main content area displays 'แผนงานแยกเป็นรายโครงการ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2558' and a table with the following data:

โครงการ / หน่วยงาน	งานทั้งหมด ใน ปี 2558	
	จำนวน	พเงิน (บาท)
มีรายการ ที่ยังไม่ได้รับ โครงการ/แผนงาน จำนวน 22 รายการ [ดูรายละเอียด]		
ส่วนกลาง สขบ. 1 (ค่าจ้างรถเช่า)	189	16,019,050
ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขบ. 1	9	68,305,800
ส่วนจัดสรรเงินและบริหารงาน สขบ. 1	3	247,200
ส่วนเครื่องมือรถ สขบ. 1	1	9,500,000
งานศึกษาวิเคราะห์ สขบ. 1	0	0
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน	81	233,181,911
โครงการซ่อมแซมอาคารแม่ฮ่องสอน	36	139,063,200
โครงการซ่อมแซมอาคารต่างๆ	65	175,867,800
โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาแม่ฮ่อง	58	167,637,397
โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาแม่ฮ่อง	78	162,709,670
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ฮ่องสอน	41	86,601,500
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่	55	62,657,000
โครงการก่อสร้าง 2/01 (2554)	0	0
โครงการก่อสร้าง 2/01 (2554)	0	0
โครงการก่อสร้าง 2/01 (2554)	7	176,639,000

2.1 หากสำนักได้รับงบประมาณหรือรายการงานใหม่ แสดงรายการอยู่ในหัวข้อ “มีรายการ ที่ยังไม่ได้ระบุ โครงการ/หน่วยงาน “ จะต้องระบุโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบและกรอกข้อมูลพื้นฐานของโครงการเพื่อรายการจะถูกย้ายไปยังหน่วยงานนั้นๆและรายงานความก้าวหน้าต่อไป

โครงการ / หน่วยงาน	จำนวน	งบปีรวม ปี 2558	งบปี (บาท)
สิ้นรายการ ที่ยังไม่ได้รับ โครงการตามหมวดฯ จำนวน 22 รายการ [ดูรายละเอียด]			
ส่วนกลาง สาขา 1 (สายบังคับ)	189		18,018,000
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1	9		68,395,000
ส่วนกิจการและประชาสัมพันธ์ ชั้น 1	3		247,200
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1	1		5,500,000
โครงการระบบงานเชื่อมโยง	0		0
โครงการระบบงานเชื่อมโยง	81		233,181,911
โครงการระบบงานเชื่อมโยง	36		138,063,200
โครงการระบบงานเชื่อมโยง	66		175,867,600
โครงการระบบงานเชื่อมโยง	58		167,837,307
โครงการระบบงานเชื่อมโยง	78		182,799,670
โครงการระบบงานเชื่อมโยง	41		86,601,500
ศูนย์บริการที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	66		62,857,000
โครงการส่งเสริม 1/91 (2554)	0		0
โครงการส่งเสริม 2/91 (2554)	0		0
โครงการส่งเสริม 3/91 (2554)	7		128,633,000

2.3 หากต้องการแก้ไขหรือดูรายการงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้คลิกเลือกโครงการ/หน่วยงานที่ต้องการดูรายละเอียด

ชื่องาน	ผลผลิต	เริ่มต้น	สิ้นสุด	งบประมาณ		ประเภทงบ	จัดการข้อมูล
				รวม	ปี 2558		
(1.3) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายใน ที่ทำการโครงการ โครงการซ่อมแซมระบบงานเชื่อมโยง GFMIS:	การจัดการนำขอลประทาน	2558	2558	3,500,000	3,500,000	งบรายจ่าย ประจําปี-งบลงทุน ทบ. 2558	<input checked="" type="checkbox"/>
(7) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่โคก โครงการซ่อมแซมระบบงานเชื่อมโยง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ GFMIS:	การจัดการนำขอลประทาน	2558	2558	15,000,000	15,000,000	งบรายจ่าย ประจําปี-งบลงทุน ทบ. 2558	<input checked="" type="checkbox"/>
(8) ระบบส่งน้ำฝายเหมืองใหม่ หรืออาคารประกอบ โครงการซ่อมแซมระบบงานเชื่อมโยง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ GFMIS:	การจัดการนำขอลประทาน	2558	2558	12,000,000	12,000,000	งบรายจ่าย ประจําปี-งบลงทุน ทบ. 2558	<input checked="" type="checkbox"/>
(34.1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม	การจัดการแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่	2558	2558	18,000,000	18,000,000	งบรายจ่าย	<input checked="" type="checkbox"/>

2.4 แสดงรายละเอียดรายการงานในโครงการ/หน่วยงาน ที่เลือก

รายงาน งบประมาณ 2558

รายการราย งบประมาณ 2558
สำหรับเจ้าหน้าที่ในระดับ สำนัก กอ

หน่วยงานรับคือรณชอน
สำนัก / กอ สำนักงบประมาณที่ 1

ชื่องาน	หมวดผลิต	เริ่มต้น	สิ้นสุด	งบประมาณ		ประเภท งบ	จัดการ ข้อมูล
				รวม	ปี 2558		
(13) ระบบไปรษณีย์ราชการใน ที่ทำการโครงการ โครงการ รณชอนเชียงใหม่ GFMS:	การจัดการนำส่งรณชอน	2558	2558	3,500,000	3,500,000	งบรายจ่าย ประจำปี-งบ ลงทุน พรณ. 2558	
(7) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่โคก โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตา มัยประมงหลวง GFMS:	การจัดการนำส่งรณชอน	2558	2558	15,000,000	15,000,000	งบรายจ่าย ประจำปี-งบ ลงทุน พรณ. 2558	
(8) ระบบส่งน้ำท่าทางเหนือใหม่หรือ อาคารประกอบ โครงการชลประทาน เชียงใหม่ ตำบลปริมณังค GFMS:	การจัดการนำส่งรณชอน	2558	2558	12,000,000	12,000,000	งบรายจ่าย ประจำปี-งบ ลงทุน พรณ. 2558	
(341) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำภาคเหนือ ตำบลคลอง หลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัด เชียงใหม่ GFMS: 0700322002420117	การจัดการส่งน้ำและเพิ่ม พื้นที่ชลประทาน	2558	2558	18,000,000	18,000,000	งบรายจ่าย ประจำปี-งบ ลงทุน พรณ. 2558	
(11) มอเก็บค่า คสส. พร้อมอาคาร ประกอบบ้านหนองเขิน ตำบลเมือง นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ GFMS:	การสนับสนุนโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ	2558	2558	2,600,000	2,600,000	งบรายจ่าย ประจำปี-งบ ลงทุน พรณ. 2558	
(12) ระบบส่งน้ำบ้านแคบอ ตำบล เมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่ GFMS:	การสนับสนุนโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ	2558	2558	4,900,000	4,900,000	งบรายจ่าย ประจำปี-งบ ลงทุน พรณ. 2558	

0700322002420117 Save
Cancel

2.5 ในส่วนหน้านี้ยังสามารถกรอกข้อมูลรหัส GFMS จากสำนักงบประมาณ เพื่อใช้สำหรับติดตาม
ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างละเอียด ดังรูป

3 เมนูงบประมาณและผลการเบิกจ่าย เมนูนี้จะสรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆและผลเบิกจ่ายภาพรวมที่ทางสำนักรายงาน

หน้าแรก รายงานต่างๆ | คนทำงานฯ | เอกสารแนบในระบบฯ | แผนที่ประมาณการ รายงานสำหรับผู้บริหาร

Logged in: omrid01 | เพิ่มคำอำนวยความสะดวก | รายการประมาณการ **งบประมาณและผลการเบิกจ่าย** | **ร้านค้าหน่วยงาน -** | Log out

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักชลประทานที่ 1

กรุณาเลือก รายการงบประมาณ

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ	รายงานเบิกจ่ายล่าสุด
	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		
ส่วนกลาง สขป.1 (คำส่วนราชการ)	17,082,350	0	17,082,350	9,245,138	0	9,245,138	54.12	24/02/2558
ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขป.1	54,885,100	15,649,000	39,236,100	14,834,889	0	14,834,889	27.03	24/02/2558
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.1	0	0	0	0	0	0	0.00	
ส่วนเครื่องจักรกล สขป.1	9,466,000	9,190,000	276,000	0	0	0	0.00	
งานรักษามริเวณ สขป.1	0	0	0	0	0	0	0.00	
โครงการชลประทานเชียงใหม่	185,609,900	9,393,888	176,216,012	91,749,111	0	91,749,111	49.43	24/02/2558
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	108,132,781	620,000	107,512,781	50,814,469	282,000	50,532,469	46.99	24/02/2558
โครงการชลประทานลำพูน	166,710,143	4,437,143	162,273,000	93,400,937	929,405	92,471,532	56.03	24/02/2558
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่เงา	143,277,445	64,374,345	78,903,100	94,575,388	53,639,107	40,936,281	66.01	24/02/2558
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	146,536,970	2,904,500	143,632,470	75,519,993	866,710	74,653,283	51.54	24/02/2558
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ฝัก-แม่จืด	85,087,000	19,950,000	65,137,000	38,446,666	0	38,446,666	45.19	17/02/2558
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	61,957,522	558,420	60,702,702	33,018,576	0	33,018,576	53.29	24/02/2558
โครงการก่อสร้าง 1/01 (2554)	0	0	0	0	0	0	0.00	
โครงการก่อสร้าง 2/01 (2554)	0	0	0	0	0	0	0.00	
โครงการก่อสร้าง 1	120,220,017	8,027,825	112,192,192	78,001,592	2,020,394	75,981,198	64.88	24/02/2558
ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 1	17,719,000	0	17,719,000	12,519,113	0	12,519,113	70.65	24/02/2558
รวมทั้งสิ้น	1,116,684,228	35,105,121	980,882,707	592,125,873	57,737,816	534,388,257	53.03	

3.1 คลิกเลือกโครงการ/หน่วยงาน ที่ต้องการดูรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และหากต้องการดูสรุปข้อมูลผลการเบิกจ่ายรายสำนัก สามารถเลือกประเภทงบประมาณตามที่ต้องการได้ที่เมนู “รายการงบประมาณ”

งบประมาณ และ ผลการเบิกจ่าย แยกรายโครงการ : สำนักชลประทานที่ 1

รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท ส่วนกลาง สขป.1 (ค่าอำนาจการ)

[กลับ]

ชื่องาน / ประมาณการ	ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ	รายงานเบิกจ่ายล่าสุด	รายงานการโอน	รายงานเบิกจ่าย
	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง				
ซ่อมแซมอาคารวางรับน้ำป่า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	0	0	0	0	0	0	0.00		\$	3.2.1
ซ่อมแซมฝายทิวแม่ป่าไร่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)	0	0	0	0	0	0	0.00		\$	3.2.2
(32.2) ฝ่ายสหขนาดหรือระบบส่งน้ำ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ค่าอำนาจการ)	527,000	0	527,000	174,840	0	174,840	33.18	23/12/2557	\$	
(1.1) บ่อเก็บน้ำ คสล. พร้อมอาคารประกอบบ้านหนองเขี้ยว ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ค่าอำนาจการ)	64,000	0	64,000	63,844	0	63,844	99.76	17/02/2558	\$	
(1.2) ระบบส่งน้ำบ้านแกบิลด์ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ค่าอำนาจการ)	180,000	0	180,000	172,833	0	172,833	96.02	27/01/2558	\$	
(1.28) ระบบส่งน้ำฝายขุนปิง ฝายขุนปิงลูกที่ 1 บ้านเมืองนะ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ (ค่าอำนาจการ)	257,000	0	257,000	88,620	0	88,620	34.48	16/12/2557	\$	
(1.31) ฝายทิวเขี้ยวหรือระบบส่งน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ (ค่าอำนาจการ)	236,000	0	236,000	87,420	0	87,420	37.04	16/12/2557	\$	
(1.6) ฝ่ายบ้านอิพอ หรือระบบส่งน้ำโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝ้ายยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ (ค่าอำนาจการ)	241,000	0	241,000	94,190	0	94,190	39.08	17/02/2558	\$	
(1.7) สระเก็บน้ำห้วยดีหรือระบบส่งน้ำ ละวาลวประกรณ์ โครงการขยาย										

3.2 รายละเอียดรายการงาน งบประมาณและผลการเบิกจ่าย เมื่อคลิกโครงการ/หน่วยงาน

การโอนจัดสรรเงินงบประมาณ

โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ฝักตามแนวพระราชดำริ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

กลับไปหน้างบประมาณและผลการเบิกจ่าย

ที่	ครั้งที่	ลงวันที่	โอนให้กับ	งบประมาณ			แก้ไข	ลบ
				รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		
1			โครงการ/หน่วยงาน	20,635,200	0	20,635,200		

+++ เพิ่มรายการโอนจัดสรรงบประมาณ +++

การโอนจัดสรรเงินงบประมาณ

แบบฟอร์มการรายงาน การโอนจัดสรรงบประมาณ

โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ฝักตามแนวพระราชดำริ

ครั้งที่ ตาม ง.241

ลงวันที่ ตาม ง.241

โอนจัดสรรให้

งบประมาณรวม บาท

งบจ้างเหมา บาท

งบดำเนินการเอง บาท

3.2.1 รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ โดยคลิกที่ไอคอน เว็บไซต์จะแสดงรายละเอียดการโอนจัดสรรที่เคยรายงานมา สามารถ ลบและแก้ไขข้อมูลได้ หากต้องการรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงให้คลิกการ “เพิ่มรายการโอนจัดสรรงบประมาณ” มีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลครั้งที่โอนจัดสรร วันที่ ประเภทโอนจัดสรรให้ งบประมาณรวมแยกเป็น งบจ้างเหมา งบดำเนินการเอง

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายสัปดาห์ของประมาณการ

โครงการจัดหาไม้สนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ฝักตามแนวพระราชดำริ

กลับไปหน้างบประมาณและผลการเบิกจ่าย

รายงานครั้งที่	ลงวันที่	งบประมาณเบิกจ่ายสะสม			แก้ไข
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	
1	19/11/2562	18,183,920.82	0.00	18,183,920.82	

+++ เพิ่มรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายสัปดาห์ +++

การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายสัปดาห์

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

สำนักงานชลประทานที่ 1

แบบฟอร์มการรายงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการจัดหาไม้สนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ฝักตามแนวพระราชดำริ

งวดประจำวันที่ รายงานทุกวันอังคาร

เบิกจ่าย รวม บาท

เบิกจ่าย งานจ้างเหมา บาท

เบิกจ่าย งานทำเอง บาท

3.2.2 รายงานผลการเบิกจ่าย โดยคลิกที่ไอคอน เว็บไซต์จะแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายที่เคยรายงานมา สามารถ ลบและแก้ไขข้อมูลได้ หากต้องการรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงให้คลิกการ “เพิ่มรายการโอนจัดสรรงบประมาณ”

4. รายการประมาณการ เพื่อกำหนดรายละเอียดแผนผลการดำเนินงาน แผนผลการดำเนินงานอย่างพารา แผนผลค่าแรง รูปภาพ ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ ของแต่ละรายการ ในหน่วยทั้งหมด

Logged in: omrid01 [เพิ่มค่าอำนาจการ](#) [รายการประมาณการ](#) [งบประมาณและผลการเบิกจ่าย](#) ระดับหน่วยงาน = [Log out](#)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักงานชลประทานที่ 1

กรุณาเลือก รายการงบประมาณ

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

- รายการประมาณการ**
- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ผลการปฏิบัติงาน
- Cash Flow

รายงานผลการแยกรายประเภทผลการ

ปีงบประมาณ 2562

สำหรับเจ้าหน้าที่ในระดับ หน่วยงาน / โครงการ

หน่วยงาน / โครงการ : **ส่วนกลาง สอป.1 (ค่าจ้างวิทยากร)**

ชื่องาน	ประเภท ปี ประเภท	ค่าคง	ค่าคง	จังหวัด	เริ่ม ต้น	สิ้นสุด	งบประมาณ			ผลลัพธ์ประเภทการ		
							ทั้งหมด	ปี 2562	ที่เหลือ	รวม	จังหวัด	ค่าคง
(1.1) ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ทำงาน, โครงการสอนนำ และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ด้านคลังข้อมูล สำนักหอสมุดระดับ จังหวัดเชียงใหม่ (ค่าจ้างวิทยากร) GFMS	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พ.บ. 2562				2562	2562	0	0	0	0	0	0
(1.2) ฝ่ายแปดสีชมพู พร้อมระบบส่งน้ำ จัดทำน้ำ สิ้นสิ้นสิ้นที่พัฒนาโครงการหลวงอย่าง ส่วนสนับสนุน อื่น ส่วนค่าจ้าง จังหวัดเชียงใหม่ (ค่าจ้างวิทยากร) GFMS	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พ.บ. 2562				2562	2562	0	0	0	0	0	0
(1.3) ฝ่ายบ้านหนองคำพร้อมระบบส่งน้ำ จัดทำน้ำ สิ้นสิ้นสิ้นที่พัฒนาโครงการหลวงอย่าง ส่วนสนับสนุน ส่วนค่าจ้าง อำเภอแม่วง จังหวัดเชียงใหม่ (ค่าจ้างวิทยากร) GFMS	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พ.บ. 2562				2562	2562	0	0	0	0	0	0
(1.4) ระบบส่งน้ำฝ่ายบ้านหนองคำ ลุง 1 จัดทำน้ำ สิ้นสิ้นสิ้นที่พัฒนาโครงการหลวงอย่าง ส่วนสนับสนุน อื่น ส่วนค่าจ้าง จังหวัดเชียงใหม่ (ค่าจ้างวิทยากร) GFMS	งบรายจ่าย ประจำปี- งบลงทุน พ.บ. 2562				2562	2562	0	0	0	0	0	0

หัวข้อ



4.1



4.2



4.3



4.4



4.5



4.6



4.7



4.8

4.1 คลิกที่เครื่องหมาย  เพื่อบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักจัดซื้อสินค้าและบริการฯ สบป.1
สำนักงานชลประทานที่ 1

แบบฟอร์มการรายงานผลการจัดซื้อ / จัดจ้างและ ผลการปฏิบัติงาน

ชื่องาน / ประมาณการ

(1.1.19) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเค็ด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ค้นหาจากชื่อตำบล
ตำบล อำเภอ จังหวัด

วันอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

ราคากลาง บาท

งานจ้างเหมาฯ / จ้างที่ปรึกษา

งานดำเนินการเอง

วิธีการจัดหา

วันประกาศTOR

วันประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ส่งหนังสือเชิญชวน

วันยื่นซอง / ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค

วันเปิดซอง / เปิดข้อเสนอด้านราคา / วันเคาะราคา

วงเงินที่เปิดซอง / ข้อเสนอด้านราคา/ผลประกวดราคา บาท

วันอนุมัติรับราคา

วงเงินที่อนุมัติรับราคา บาท

ผู้ประกอบการ

เลขที่สัญญา

วันที่ลงนามในสัญญา

วันเริ่มสัญญา

วันสิ้นสุดสัญญา

วันที่ส่งเข้าปฏิบัติงาน

อายุสัญญา วัน

หัวข้อปัญหา

หมายเหตุ / คำชี้แจง

แผนการแก้ไขปัญหา-อุปสรรค

ส่วนที่ 1 บันทึกข้อมูล ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่ดำเนินการ วันอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP และราคากลาง จากนั้นเลือกลักษณะงานซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่ งานจ้างเหมา/จ้างที่ปรึกษา งานดำเนินการเอง หากเป็นงานจ้างเหมาบางส่วนต้องบันทึกทั้ง 2 ประเภท

4.1.1 งานจ้างเหมา/จ้างที่ปรึกษา บันทึก วันประกาศTOR วันประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ส่งหนังสือเชิญชวน วันยื่นซอง / ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค วันเปิดซอง / เปิดข้อเสนอด้านราคา / วันเคาะราคา วงเงินที่เปิดซอง / ข้อเสนอด้านราคา วันอนุมัติรับราคา วงเงินที่อนุมัติรับราคา ผู้ประกอบการ เลขที่สัญญา วันที่ลงนามในสัญญา วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ส่งเข้าปฏิบัติงาน อายุสัญญา

งานจ้างเหมา / จ้างที่ปรึกษา		งานดำเนินการเอง	
วิธีการจัดหา	--กรุณาระบุ--		
วันประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	<input type="text"/>	ลบวันที่	
วันยื่นซอง	<input type="text"/>	ลบวันที่	
วันเปิดซอง / วันเคาะราคา	<input type="text"/>	ลบวันที่	
วันอนุมัติรับราคา	<input type="text"/>	ลบวันที่	
วงเงินที่อนุมัติรับราคา	0	บาท	
ผู้ประกอบการ งานดำเนินการเอง	<input type="text"/>		
วันที่ลงนามในสัญญา	<input type="text"/>	ลบวันที่	

4.1.2 งานดำเนินการเอง บันทึกวิธีการจัดหา วันประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันยื่นซอง วันเปิดซอง/วันเคาะราคา วันอนุมัติรับราคา วงเงินที่อนุมัติรับราคา ผู้ประกอบการ งานดำเนินการเอง ลงนามในสัญญา

โครงการชลประทานเชียงใหม่

สำนักงานชลประทานที่ 1

แบบฟอร์ม การรายงานผลการปฏิบัติงาน รายสัปดาห์

(5) ปรับปรุงระบบส่งน้ำส่งชาวพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่ซ้อน ระยะที่ 2 ตำบลเมือง
งาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

งวดประจำวันที่ 22/10/2562 รายงานทุกวันอังคาร

ผลการปฏิบัติงานจริงทั้ง
โครงการ 0 เปอร์เซ็นต์

ผลการปฏิบัติงานจริงปี
ปัจจุบัน 0 เปอร์เซ็นต์

พื้นที่ชลประทาน (ไร่) ผล: 0 แผน:0

พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ผล: 4000 แผน:4000

ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) ผล: 0 แผน:0

คร้วเรือน ผล: 0 แผน:0

หัวข้อปัญหา ติดปัญหาอื่นๆ

ปัญหา-อุปสรรค เนื่องจากเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562 ได้เกิดฝนตกหนักในเขต
พื้นที่ อำเภอเชียงดาว อันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุ "โพดุล" ส่งผลให้งาน
ปรับปรุงระบบส่งน้ำส่งชาวอ่างเก็บน้ำแม่ซ้อน ทำให้บริเวณจุดดำเนินการ

แผนการแก้ไขปัญหา-
อุปสรรค

SAVE RESET

4.2 คลิกที่เครื่องหมาย เพื่อบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน รายสัปดาห์

4.2.1 เลือกงวดที่จะรายงานข้อมูล ผลการปฏิบัติงานจริงทั้งโครงการ ผลการปฏิบัติงาน
ปีปัจจุบัน พื้นที่ชลประทาน พื้นที่รับประโยชน์ ความจุ คร้วเรือน หัวข้อปัญหา ปัญหา-อุปสรรค และแผนการ
แก้ไขปัญหา-อุปสรรค

โดยหากรายการใดมีแผนการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์จะแสดงตัวเลขแผนดังกล่าว และหากมี
ปัญหา-อุปสรรค จะต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถบันทึกผลการดำเนินงานได้

ข้อมูลประมาณการ เพิ่มเติม

งบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ร.บ. 2558

ชื่อรายการงาน

(1.3) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในที่ทำการโครงการ โครงการชลประทานเชียงใหม่

โครงการที่รับผิดชอบ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

หน่วยงานระดับสำนัก

สำนักชลประทานที่ 1

ประเภท :

กิจกรรม :

วงเงินที่อนุมัติ (บาท) :

3,500,000.00

วงเงินจัดสรร (บาท) :

0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ :

<p>1. ชื่อ: นายวิชัย ชัยเจริญชาติ</p> <p>e-mail : irricm@hotmail.com</p> <p>ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกลอาวุโส</p> <p>โทร : 0831521636</p>	<p>2. ชื่อ: <input type="text"/> Save Cancel</p> <p>e-mail : <input type="text"/> Save Cancel</p> <p>ตำแหน่ง : <input type="text"/></p> <p>โทร : (Click here to add text)</p>
--	---

4.3 คลิกที่เครื่องหมาย **plus** เพื่อบันทึกข้อมูล ประเภทงาน, กิจกรรม, วงเงินที่อนุมัติ (บาท), วงเงินจัดสรร (บาท), ผู้รับผิดชอบโครงการ, ชื่อ, e-mail, ตำแหน่ง, เบอร์โทร ผู้รับผิดชอบงาน เพิ่มเติม

ส่วนที่ 1 : ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์
1.1 ยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

1.2 มติคณะรัฐมนตรี : เมื่อวันที่

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลของโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์และรายละเอียดในการดำเนินโครงการ

(คำอธิบาย) :

วัตถุประสงค์ - 1. เพื่อแก้ไขปัญหาการเสื่อมสภาพและการชำรุด ของสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการฯ 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในโครงการฯ สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด , รายละเอียดในการดำเนินโครงการ - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภายในโครงการชลประทานเชียงใหม่

2.2 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ปี) :

1

เริ่มต้น (วัน/เดือน/ปี) :

11/57

สิ้นสุด (วัน/เดือน/ปี) :

02/58

2.3 แผนงาน / ผลงาน (หน่วย : %)

เดือน	ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
แผน	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ผล	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

2.4 แผนเงิน / ผลเงิน (จำนวนเงิน : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เดือน	ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
แผน (ล้านบาท)	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
ผล (ล้านบาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค (เหตุผลที่ล่าช้า) :

4.3.1 บันทึกข้อมูลพื้นฐานของโครงการ

ส่วนที่ 1 : ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์

1.1 ยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

1.2 มติคณะรัฐมนตรี : เมื่อวันที่

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลของโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์และรายละเอียดในการดำเนินโครงการวันเริ่มต้น สิ้นสุดโครงการ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

2.5 ภาพถ่ายประกอบโครงการ

*...Uploadรูปภาพ สำหรับ อุปกรณ์ iPhone iPad **คลิกที่นี่**
ก่อนดำเนินงาน




Latitude:18.836776733398 , Longitude:98.954299926758

[remove]

คำอธิบายภาพ

สภาพหม้อแปลงภายในโครงการเชียงใหม่

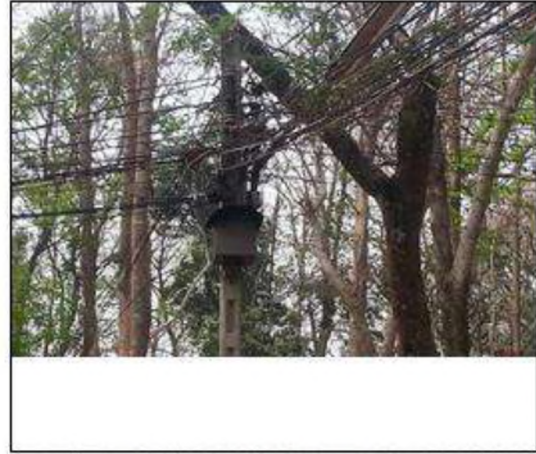


Latitude:18.836936950684 , Longitude:98.95295715332

[remove]

คำอธิบายภาพ

สภาพทั่วไปของเสาไฟฟ้าพร้อมสายส่ง


ระหว่างดำเนินงาน (สามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อมีความก้าวหน้า)



[remove]

คำอธิบายภาพ

Save Cancel




[remove]

คำอธิบายภาพ


4.3.2 บันทึกภาพถ่าย ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และหลังดำเนินงาน โดยเลือกที่กรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ จะปรากฏเมนูให้เลือกไฟล์โดยไฟล์ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกิน 1 MB (สามารถลดขนาดรูปภาพได้ที่เว็บไซต์ squooosh.app) และกรอกคำอธิบายประกอบรูปภาพ

หลังดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%)



[remove]
คำอธิบายภาพ

(Click here to add text)




[remove]
คำอธิบายภาพ

(Click here to add text)

2.6 สถานที่ดำเนินโครงการ (ตำบล อำเภอ จังหวัด) :
(คำอธิบาย) :

ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

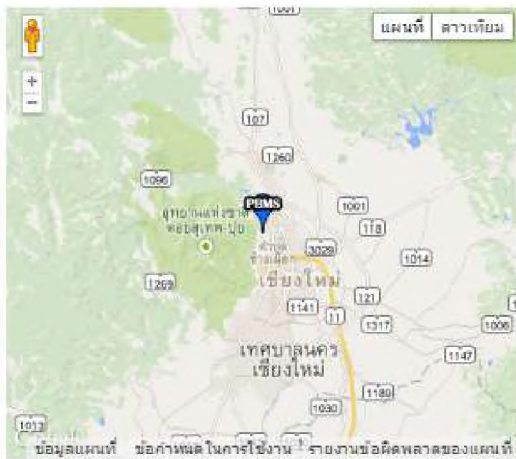

Latitude: 18.837282644186 Longitude: 98.953133225441
reset save

KML data: (copy ข้อมูล kml ของคุณลงช่องด้านล่าง)

Empty text area for KML data with a save button.

4.3.3 สถานที่ดำเนินโครงการ (ข้อมูลในส่วนนี้มีความสำคัญเช่นกรณีทำงานมีพื้นที่คาบเกี่ยว

ระหว่าง ตำบล อำเภอ จังหวัด) Latitude, Longitude, KML data

ข้อมูลประมาณการ เพิ่มเติม

น

งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2558

ชื่อรายงาน

(1.3) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในที่ทำการโครงการ โครงการชลประทานเชียงใหม่

โครงการที่รับผิดชอบ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

หน่วยงานระดับสำนัก

สำนักชลประทานที่ 1

ภาพถ่ายประกอบโครงการ

1. การชี้แจงแบ่งงาน/ผู้รับผิดชอบก่อนปฏิบัติงาน



Latitude: 18.837812423706, Longitude: 98.953002929688

[remove]

คำอธิบายภาพ

ประชุมแบ่งงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบ





Latitude: 18.837831497192, Longitude: 98.952995300293

[remove]

คำอธิบายภาพ

ประชุมแบ่งงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบ

2. ตรวจสอบสภาพพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่



3. การปฏิบัติงาน
ก่อนดำเนินงาน



Latitude:18.836776733398 , Longitude:98.954299926758

[remove]

คำอธิบายภาพ

สภาพหม้อแปลงภายใน โครงการฯ เชียงใหม่




Latitude:18.836936950684 , Longitude:98.95295715332

[remove]

คำอธิบายภาพ

สภาพทั่วไปของเสาไฟฟ้าพร้อมสายส่งฯ

ระหว่างดำเนินงาน (สามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อมีความก้าวหน้า)



[remove]

คำอธิบายภาพ

(Click here to add text)



[remove]

คำอธิบายภาพ

(Click here to add text)

4. พื้นที่ที่ดิน



[remove]
คำอธิบายภาพ




[remove]
คำอธิบายภาพ



5. การตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างการดำเนินงาน



[remove]
คำอธิบายภาพ



[remove]
คำอธิบายภาพ



6. การตรวจเยี่ยมโดยผู้บังคับบัญชาระดับบริหาร เช่นผอ.คป/ผส.ชป./ผชช./รองอธิบดีฯ/อธิบดี

4.4 คลิกที่เครื่องหมาย  เพื่อบันทึกข้อมูลประมาณการ เพิ่มเติม แบ่งเป็น 9 ส่วนดังนี้

- 1.การชี้แจงแบ่งงาน/ผู้รับผิดชอบก่อนปฏิบัติงาน
- 2.ตรวจสอบสภาพพื้นที่/ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
- 3.การปฏิบัติงาน
- 4.พื้นที่ที่ดิน
- 5.การตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างการดำเนินงาน
- 6.การตรวจเยี่ยมโดยผู้บังคับบัญชาระดับบริหาร เช่นผอ.คป/ผส.ชป./ผชช./รองอธิบดีฯ/อธิบดี
- 7.การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ/ผู้ใช้ประโยชน์
- 8.การตรวจรับและส่งมอบงาน
- 9.การรายงานผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลประมาณการเพิ่มเติม ตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจปีงบประมาณ 2558

งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2558

ชื่อรายการงาน

(1.3) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในที่ทำการโครงการ โครงการชลประทานเชียงใหม่

โครงการที่รับผิดชอบ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

หน่วยงานระดับสำนัก

สำนักชลประทานที่ 1

การพิจารณาจ้างแรงงาน

ตามบันทึกที่ กผง.819/2557 ลงวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๗

1. ให้ประชาสัมพันธ์/ประกาศความต้องการแรงงาน
2. สืบค้นการพิจารณาแรงงาน
 - 2.1 เกษตรกรที่มีชื่ออยู่ในบัญชีครัวเรือนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในเขตประกาศต่งนำเพื่อนาปรังฤดูเพาะปลูก 2557/2558
 - 2.2 สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมฯ
 - 2.3 เกษตรกรที่มีชื่ออยู่ในบัญชีครัวเรือนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อ 2.1
 - 2.4 หากแรงงานในพื้นที่ไม่เพียงพอ ให้พิจารณาจ้างแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง
- 3...

การจ้างงาน

แผน (คน)	ผล (คน)		แผน ค่าจ้าง(บาท)	ผล ค่าจ้าง(บาท)	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน)	ระยะเวลาจ้างแรงงาน (วัน)
	* เฉพาะลำดับที่ 2.1	ลำดับอื่น ๆ นอกจาก 2.1				
2	(Click here to add text)	(Click here to add text)	68000	(Click here to add text)	120	3

ดูข้อมูลแบบต่าง ๆ
PBMS01 PBMS02 PBMS04
Normal Strategy ค.ส.ช.

4.5 คลิกที่เครื่องหมาย  เพื่อบันทึก ข้อมูลประมาณการ เพิ่มเติม ตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ

บันทึกข้อมูลแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระยะเวลาจ้างแรงงาน แยกประเภทตาม บันทึกที่ กผง.819/2557

2.1 เกษตรกรที่มีชื่ออยู่ในบัญชีครัวเรือนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในเขตประกาศต่งนำเพื่อนาปรังฤดูเพาะปลูก

2.2 สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมฯ ประเภทอื่น ๆ

เป้าหมายผลผลิต จำนวนตามแหล่งเงิน

งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2561

ชื่อรายการงาน

(3) ค่าศึกษา สำรอง ออกแบบ งานเขลประทาน สำนักงานเขลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

โครงการที่รับผิดชอบ

ส่วนวิศวกรรมบริหาร สป.ป. 1

หน่วยงานระดับสำนัก

สำนักงานเขลประทานที่ 1

* ข้อมูลประกอบสำหรับการอ้างอิง จากเล่มงบประมาณรายจ่ายและรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (หน้า 74) 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงที่วิเคราะห์อย่างละเอียด สำหรับแผนทางผลิต สำนักงานแห่งใหม่

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ				
		ปี 2557 แผน (мл.)	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการขนาดกลางที่ดำเนินการ	โครงการ	63 (63)	59	130	143	125
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	138 (75)	181	293	359	355
***เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	34.94 (-)	148.7	104.31	55.07	62.68
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	281,110 (5,750)	210,121	455,948	376,088	274,820
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

*เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น
จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้นตามข้อเสนอโครงการ:
0 ลบ.ม.
จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น ในปัจจุบัน:
0 ลบ.ม.
ข้อมูลวันที่:

SAVE

ดูข้อมูลแบบต่าง ๆ
PMB01 PMB02 PMB04
Normal Strategy ศ.ส.ช.

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้ข้อมูลงบประมาณ

ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (สงวนลิขสิทธิ์)

4.6 คลินิกที่เครื่องหมาย  บันทึกเป้าหมายผลผลิต จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้นตาม

ข้อเสนอโครงการฯ จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น ในปัจจุบัน

**ข้อมูลประมวลผลการ
งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561**

ชื่อรายการงาน

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน

โครงการที่รับผิดชอบ
สำนักงานก่อสร้าง 1

หน่วยงานระดับสำนัก
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

การดำเนินงานกำจัดวัชพืช
สามารถ download หลักเกณฑ์ การกำจัดวัชพืชได้ -->download

การดำเนินงานกำจัดวัชพืช

ปริมาณการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	รอบการรายงานที่ 1 10 ต.ค.	รอบการรายงานที่ 2 25 ต.ค.	รอบการรายงานที่ 3 10 พ.ย.	รอบการรายงานที่ 4 25 พ.ย.	รอบการรายงานที่ 5 10 ธ.ค.	รอบการรายงานที่ 6 25 ธ.ค.	รอบการรายงานที่ 7 10 ม.ค.	รอบการรายงานที่ 8 25 ม.ค.	รอบการรายงานที่ 9 10 ก.พ.
หน่วย ต้น (สะสม):									
หน่วย ไร่ (สะสม):									
รายละเอียดการกำจัดวัชพืช:	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน

ปริมาณการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	รอบการรายงานที่ 10 25 ก.พ.	รอบการรายงานที่ 11 10 มี.ค.	รอบการรายงานที่ 12 25 มี.ค.	รอบการรายงานที่ 13 10 เม.ย.	รอบการรายงานที่ 14 25 เม.ย.	รอบการรายงานที่ 15 10 พ.ค.	รอบการรายงานที่ 16 25 พ.ค.	รอบการรายงานที่ 17 10 มิ.ย.	รอบการรายงานที่ 18 25 มิ.ย.
หน่วย ต้น (สะสม):									
หน่วย ไร่ (สะสม):									
รายละเอียดการกำจัดวัชพืช:	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน

ปริมาณการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	รอบการรายงานที่ 19 10 ก.ค.	รอบการรายงานที่ 20 25 ก.ค.	รอบการรายงานที่ 21 10 ส.ค.	รอบการรายงานที่ 22 25 ส.ค.	รอบการรายงานที่ 23 10 ก.ย.	รอบการรายงานที่ 24 30 ก.ย.
หน่วย ต้น (สะสม):						
หน่วย ไร่ (สะสม):						
รายละเอียดการกำจัดวัชพืช:	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน

ดูข้อมูลแบบต่าง ๆ
PMB001 PMB002 PDM304
Normal Signify คู.ส.ช.

4.7 คลิกที่เครื่องหมาย  เพื่อบันทึก ข้อมูลการกำจัดวัชพืช แยกเป็น 24 รอบในแต่ละเดือน โดยบันทึกจำนวนต้น และจำนวนไร่

รอบการรายงานครั้งที่ 21

ปริมาณการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

หน่วย ต้น (สะสม)

หน่วย ไร่ (สะสม)

เครื่องมือที่ใช้

แบ็คโฮ คัน (สะสม)

รถบรรทุก คัน (สะสม)

เรือกำจัดดา ลำ (สะสม)

เรือท้องแบน ลำ (สะสม)

แรงงานคน คน (สะสม)

ความยาวคลอง เมตร (สะสม)

ความกว้างคลอง เมตร (สะสม)

พื้นที่อ่างเก็บน้ำ ไร่ (สะสม)

พื้นที่ทิ้งเศษวัชพืช

Lat

Long

ปัญหาอื่นๆ

บันทึก

4.7.1 คลิกที่ “คลิกเพื่อรายงาน” เพื่อบันทึก ข้อมูลเพิ่มเติมโดยแยกเป็น 24 รอบในแต่ละเดือน โดยเป็นข้อมูลจำนวนเครื่องจักร แบ็คโฮ รถบรรทุก เรือกำจัดวัชพืช แรงงานคน และข้อมูลรายละเอียดโครงการ พื้นที่ทิ้งดิน (LAT LONG) ความยาวคลอง ความกว้างคลอง พื้นที่อ่างเก็บน้ำ และปัญหาอื่นๆ

ข้อมูลประมาณการ เพิ่มเติม การใช้ยางพารา

เงินกันเหลื่อมปี 2563

ชื่อรายการงาน

ซ่อมแซมถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝายน้ำยมช่วงบ้านห้วยบง ตำบลแม่ม่อม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 0.622 กม.

โครงการที่รับผิดชอบ

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน


หน่วยงานระดับสำนัก

สำนักงานชลประทานที่ 1

การใช้ยางพารา

แผนการใช้ยางพารา (ตัน)	รวมผลการใช้ยางพารา	ผลการใช้ยางพารา			
		น้ำยางข้น (ตัน)	ยางแผ่นรมควัน (ตัน)	ยางแท่ง (ตัน)	ร้อยละจากแผน
	0	(Click here to add text)	(Click here to add text)	(Click here to add text)	
แผนการใช้ยางพารา (ระยะทาง/กิโลเมตร)	รวมผลระยะทาง (ระยะทาง/กิโลเมตร)				
(Click here to add text)	(Click here to add text)				
ประเภทถนน	<input type="radio"/> Para Asphalt Concrete <input type="radio"/> Para Soil Cement บันทึก				

ดูข้อมูลแบบต่าง ๆ
PBMS01 PBMS02 PBMS04
Normal Sirasay ค.ส.ช.

4.8 คลิกที่เครื่องหมาย  เพื่อบันทึก ข้อมูลการใช้ยางพารา (สามารถบันทึกได้เฉพาะผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับยางพาราที่มี ICON ปราบกฐัน) โดยบันทึกแผน ผล จำนวนต้นยางพารา ผลแยกเป็น น้ำยางข้น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และแผนผล ระยะทาง ที่ดำเนินการ ประเภทถนนที่ดำเนินการ

6. เมนูผลการปฏิบัติงาน

Logged in: **omrid01** [เพิ่มคำอำนวยความสะดวก](#) [รายการประมาณการ](#) [งบประมาณและผลการเบิกจ่าย](#) ระดับหน่วยงาน - [Log out](#)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักชลประทานที่ 1

กรณเลือก รายการงบประมาณ:

รายการงบประมาณ : **รวมทุกประเภท**

Logged in: **test2** [เพิ่มคำอำนวยความสะดวก](#) [รายการประมาณการ](#) [งบประมาณและผลการเบิกจ่าย](#) ระดับหน่วยงาน - [Log out](#)

- รายการประมาณการ
- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ผลการปฏิบัติงาน** ←
- Cash Flow

ผลการปฏิบัติงาน

รายงานงาน ปีงบประมาณ 2558

โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ 11/03/2558

ชื่องาน / ประมาณการ	เป้าหมายทั้งโครงการ (%)			เป้าหมายปีปัจจุบัน (%)			รายงานผลงานล่าสุด	รายงานทั้งหมด
	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง		
(1.3) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในที่ทำการโครงการ โครงการชลประทานเชียงใหม่	30.00	0.00	-30.00	30.00	0.00	-30.00	10/03/2558	รายละเอียด
(7) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่โก๊น โครงการชลประทานเชียงใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	39.00	14.00	-25.00	39.00	14.00	-25.00	10/03/2558	รายละเอียด
(8) ระบบส่งน้ำฝายเหมืองใหม่พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	66.00	69.00	3.00	66.00	69.00	3.00	10/03/2558	รายละเอียด
(34.1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโศกเสื่อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	5.00	0.00	-5.00	5.00	0.00	-5.00	10/03/2558	รายละเอียด
(1.1) บ่อเก็บน้ำ คลส. พร้อมอาคารประกอบบ้านหนองเขียว ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	10/03/2558	รายละเอียด
(1.2) ระบบส่งน้ำบ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	92.00	45.00	-47.00	92.00	45.00	-47.00	10/03/2558	รายละเอียด
(1.6) ฝายบ้านปิวอ พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	58.00	74.00	16.00	58.00	74.00	16.00	10/03/2558	รายละเอียด
(1.7) สระเก็บน้ำห้วยตี่ดีพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	76.00	74.00	-2.00	76.00	74.00	-2.00	10/03/2558	รายละเอียด

6.1 สรุปรายละเอียดผลการดำเนินงานของแต่ละรายการงาน

ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์

ชื่อประมาณการ (1.3) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในที่ทำการโครงการ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ปีเริ่มต้น 2558 ปีสิ้นสุด 2558

ที่	สัปดาห์ที่รายงาน	ผลงานปีปัจจุบัน (%)	ผลงานทั้งโครงการ (%)	ปัญหา - อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ	ลบ
1	28/10/2557	0	0	เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนจัดทำ Spec			X
2	04/11/2557	0	0	เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนจัดทำ Spec			X
3	11/11/2557	0	0	เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนจัดทำ Spec			X
4	18/11/2557	0	0	เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนจัดทำ ราคาากลาง			X
5	18/11/2557	0	0	เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนจัดทำ ราคาากลาง			X
6	25/11/2557	0	0	เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างจัดจ้าง			X
7	02/12/2557	0	0	เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ ขั้นตอนจัดทำ spec			X
8	09/12/2557	0	0	เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ ขั้นตอนจัดทำ spec			X
9	16/12/2557	0	0	ประกาศ TOR 17-22 ๕๕.57 ประกาศขายเอกสาร 23 ๕๕.57 ยื่นเอกสาร 7 ๓๕.57 ประมูล 19 ๓๕.58			X
10	23/12/2557	0	0	ประกาศ TOR 17-22 ๕๕.57 ประกาศขายเอกสาร 23 ๕๕.57 ยื่นเอกสาร 7 ๓๕.57 ประมูล 19 ๓๕.58			X
11	23/12/2557	0	0	ประกาศ TOR 17-22 ๕๕.57 ประกาศขายเอกสาร 23 ๕๕.57 ยื่นเอกสาร 7 ๓๕.57 ประมูล 19 ๓๕.58			X
12	30/12/2557	0	0	ประกาศ TOR 17-22 ๕๕.57 ประกาศขายเอกสาร 23 ๕๕.57 ยื่นเอกสาร 7 ๓๕.57 ประมูล 19 ๓๕.58			X
13	06/01/2558	0	0	ประกาศ TOR 17-22 ๕๕.57 ประกาศขายเอกสาร 23 ๕๕.57 ยื่นเอกสาร 7 ๓๕.57 ประมูล 19 ๓๕.58			X
14	13/01/2558	0	0	ประกาศ TOR 17-22 ๕๕.57 ประกาศขายเอกสาร 23 ๕๕.57 ยื่นเอกสาร 7 ๓๕.57 ประมูล 19 ๓๕.58			X
15	20/01/2558	0	0	ประกาศ TOR 17-22 ๕๕.57 ประกาศขายเอกสาร 23 ๕๕.57 ยื่นเอกสาร 7 ๓๕.57 ประมูล 19 ๓๕.58			X
16	27/01/2558	0	0	ประกาศ TOR 17-22 ๕๕.57 ประกาศขายเอกสาร 23 ๕๕.57 ยื่นเอกสาร 7 ๓๕.57 ประมูล 19 ๓๕.58			X
17	03/02/2558	0	0	ประกาศ TOR 17-22 ๕๕.57 ประกาศขายเอกสาร 23 ๕๕.57 ยื่นเอกสาร 17 ๓๕.57 ประมูล 19			X

6.1.1 เลือกไปที่เมนูรายละเอียดซึ่งอยู่ท้ายรายการงานจะแสดงข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์พร้อมปัญหาอุปสรรค

7. เมนู Cash Flow

Logged in: omrid01 เพิ่มคำอำนาจการ รายการประมาณการ งบประมาณและผลการเบิกจ่าย ระดับหน่วยงาน Log out

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักชลประทานที่ 1

กรุณาเลือก รายการงบประมาณ:

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

- รายการประมาณการ
- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ผลการปฏิบัติงาน
- Cash Flow** ←

แผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (Cash Flow)

รายการงาน ปีงบประมาณ 2558

โครงการชลประทานเชียงใหม่

เลือกรายการงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (Cash Flow)

(1.3) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในที่ทำการโครงการ โครงการชลประทานเชียงใหม่
(7) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่โกน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ
(8) ระบบส่งน้ำฝายเหมืองใหม่พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ
(34.1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโกลีต ตามคลองหูล่อ ลำคลองยลล่อ จังหวัดเชียงใหม่
(1.1) บ่อเก็บน้ำ คสล.พร้อมอาคารประกอบบ้านหนองเขี้ยว ตำบลเมืองนะ อำเภอเมืองดาว จังหวัดเชียงใหม่
(1.2) ระบบส่งน้ำบ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเมืองดาว จังหวัดเชียงใหม่
(1.6) ฝ่ายบำรุงรักษาพร้อมระบบส่งน้ำโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ
(1.7) สระเก็บน้ำห้วยคังพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ
(1.18) ฝ่ายบำรุงรักษาพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำแม่หาด) จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ
(1.23) ฝ่ายโยธา 7 พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะ 1) จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแก๋อ้อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.24) อาคารบังคับน้ำพวยชานแลห้วยน้อยพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.25) ระบบส่งน้ำและบ่อฝักภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างช้าง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.26) ฝ่ายบำรุงรักษาพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงอ่างช้างโดยถนนบ้านปางงะโอ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.28) ระบบส่งน้ำฝายเนินฝายขานเชิงลูกที่ 1 บ้านเมืองนะ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ
(1.1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยบอน(ระแจะลดห้วย) จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ

7.1 เว็บไซต์จะแสดงรายละเอียดรายการงานรับผิดชอบ โดยสามารถคลิกที่ชื่อรายการงานเพื่อกรอกข้อมูล Cash Flow

การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการปฏิบัติงาน (Cash Flow)

ชื่อประมาณการ: (1.3) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในที่ทำการโครงการ โครงการชลประทานเชียงใหม่						
ปีแรก: 2558 ปีสิ้นสุด: 2558						
เพิ่ม / แก้ไข						
ที่	เดือน	ปี	แผนการปฏิบัติงานปีปัจจุบัน(%)	แผนการปฏิบัติงานเป้าหมายรวมทั้งโครงการ(%)	แผนการเบิกจ่ายปีปัจจุบัน(บาท)	แผนการเบิกจ่ายรวมทั้งโครงการ(บาท)
1	ตุลาคม	2557	0	0	0	0
2	พฤศจิกายน	2557	20	20	766000	766000
3	ธันวาคม	2557	50	50	1766000	1766000
4	มกราคม	2558	80	80	2766000	2766000
5	กุมภาพันธ์	2558	100	100	3500000	3500000
6	มีนาคม	2558	100	100	3500000	3500000
7	เมษายน	2558	100	100	3500000	3500000
8	พฤษภาคม	2558	100	100	3500000	3500000
9	มิถุนายน	2558	100	100	3500000	3500000
10	กรกฎาคม	2558	100	100	3500000	3500000
11	สิงหาคม	2558	100	100	3500000	3500000
12	กันยายน	2558	100	100	3500000	3500000

7.1.1 เว็บไซต์จะแสดงรายละเอียด แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่าย โดยแยกเป็นข้อมูลปีปัจจุบันและข้อมูลทั้งโครงการ โดยสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลโดยคลิกที่ [เพิ่ม / แก้ไข](#)

การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการปฏิบัติงาน (Cash Flow)

ชื่อประเภทการ: (1.3) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในท่าอากาศยาน โครงการชลประทานเชียงใหม่
ปีแรก: 2558 ปีสิ้นสุด: 2558

BACK **SAVE** **RESET**


ที่	เดือน	ปี	แผนการปฏิบัติงาน ปีปัจจุบัน(%)	แผนการปฏิบัติงาน เป้าหมายรวมทั้ง โครงการ(%)	แผนการเบิกจ่าย ปีปัจจุบัน(บาท)	แผนการเบิกจ่าย รวมทั้งโครงการ(บาท)
1	ตุลาคม	2557	0	0	0	0
2	พฤศจิกายน	2557	20	20	766000	766000
3	ธันวาคม	2557	50	50	1766000	1766000
4	มกราคม	2558	80	80	2766000	2766000
5	กุมภาพันธ์	2558	100	100	3500000	3500000
6	มีนาคม	2558	100	100	3500000	3500000
7	เมษายน	2558	100	100	3500000	3500000
8	พฤษภาคม	2558	100	100	3500000	3500000
9	มิถุนายน	2558	100	100	3500000	3500000
10	กรกฎาคม	2558	100	100	3500000	3500000
11	สิงหาคม	2558	100	100	3500000	3500000
12	กันยายน	2558	100	100	3500000	3500000

*หมายเหตุ: ในช่องแผนการเบิกจ่าย ให้ใส่ข้อมูล เงินโดยไม่ใช้ เครื่องหมาย "," และ หน่วยเป็นบาท เช่น 1700000.00 ไม่ใช้ 1,700,000.00

7.1.2 เมื่อเข้าสู่เพิ่มแก้ไขแผนการดำเนินงาน จะปรากฏกล่องข้อความให้กรอกรายละเอียดของแต่ละเดือน

คู่มือการใช้งานระบบติดตามออนไลน์-ระดับหน่วยงาน

1. รายการประมาณการ เพื่อกรกรายละเอียดแผนผลการดำเนินงาน แผนผลการดำเนินงานยาวพารา แผนผลค่าแรง รูปภาพ ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ ของแต่ละรายการ ในหน่วยทั้งหมด



ระบบติดตาม
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

หน้าหลัก รายงานต่างๆ คณะทำงาน PDF เอกสารแนะนำระบบฯ แผนที่ประมาณการ รายงานสำหรับผู้บริหาร


Logged in: test2 เพิ่มค่ารายการ รายการประมาณการ งบประมาณและผลการเบิกจ่าย ระดับหน่วยงาน - Log out

รายการงาน แยกรายประมาณการ
ปีงบประมาณ 2562
สำหรับเจ้าหน้าที่ในระดับ หน่วยงาน / โครงการ

หน่วยงาน / โครงการ : ส่วนกลาง สบป 1 (ค่าจ้างรายการ)

ชื่องาน	ประเภทงบประมาณ	ค่าผล	จำนวน	จังหวัด	เริ่ม	สิ้นสุด	งบประมาณ		อนุมัติประมาณการ			
							ทั้งหมด	ปี 2562	วันที่	รวม	ค้างเหมา	ทำเลย
(1.1) ปรับปรุงระบบโทรศัพท์มือถือ, โครงการสอนทำและปายอกรักสามแมงกวดูตตรา ตำบลลวงเหนือ อำเภอထေးတေဗ်တီ ဟိုတီထွေဗ်တီ (ค่าจ้างรายการ) GFMS	งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พจน. 2562				2562	2562	0	0		0	0	0
(1.2) ฝ่ายแปดก๊วยม หรือระบบสงน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างจาก ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ค่าจ้างรายการ) GFMS	งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พจน. 2562				2562	2562	0	0		0	0	0
(1.3) ฝ่ายบ้านหนองคำหรือระบบสงน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างจาก ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ค่าจ้างรายการ) GFMS	งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พจน. 2562				2562	2562	0	0		0	0	0
(1.4) ระบบส่งน้ำผ่านบ้านของต้ง ลูก1 จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างจาก ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ค่าจ้างรายการ) GFMS	งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พจน. 2562				2562	2562	0	0		0	0	0

หัวข้อ



1.1 คลิกที่เครื่องหมาย  เพื่อบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักจัดซื้อสินค้าและบริการฯ สบป.1
สำนักงานชลประทานที่ 1

แบบฟอร์มการรายงานผลการจัดซื้อ / จัดจ้างและ ผลการปฏิบัติงาน

ชื่องาน / ประมาณการ

(1.1.19) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดโคก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ค้นหาจากชื่อตำบล
ตำบล อำเภอ จังหวัด

วันอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

ราคาากลาง บาท

งานจ้างเหมา / จ้างที่ปรึกษา

งานดำเนินการเอง

วิธีการจัดหา

วันประกาศTOR

วันประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ส่งหนังสือเชิญชวน

วันยื่นซอง / ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค

วันเปิดซอง / เปิดข้อเสนอด้านราคา / วันเคาะ
ราคา

วงเงินที่เปิดซอง / ข้อเสนอด้านราคา/ผลประกวด
ราคา บาท

วันอนุมัติรับราคา

วงเงินที่อนุมัติรับราคา บาท

ผู้ประกอบการ

เลขที่สัญญา

วันที่ลงนามในสัญญา

วันเริ่มสัญญา

วันสิ้นสุดสัญญา

วันที่ส่งเข้าปฏิบัติงาน

อายุสัญญา วัน

หัวข้อปัญหา

หมวดเหตุ / คำชี้แจง

แผนการแก้ไขปัญหา-อุปสรรค

ส่วนที่1 บันทึกข้อมูล ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่ดำเนินการ วันอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP และราคากลาง จากนั้นเลือกลักษณะงานซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่
งานจ้างเหมา/จ้างที่ปรึกษา งานดำเนินการเอง หากเป็นงานจ้างเหมาบางส่วนต้องบันทึกทั้ง2ประเภท

1.1.1 งานจ้างเหมา/จ้างที่ปรึกษา บันทึก วันประกาศTOR วันประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ส่งหนังสือเชิญชวน วันยื่นซอง / ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค วันเปิดซอง / เปิดข้อเสนอด้านราคา / วันเคาะราคา วงเงินที่เปิดซอง / ข้อเสนอด้านราคา วันอนุมัติรับราคา วงเงินที่อนุมัติรับราคา ผู้ประกอบการ เลขที่สัญญา วันที่ลงนามในสัญญา วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ส่งเข้าปฏิบัติงาน อายุสัญญา

งานจ้างเหมา / จ้างที่ปรึกษา		งานดำเนินการเอง	
วิธีการจัดหา	--กรณารับ--		
วันประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	<input type="text"/>	ลบวันที่	
วันยื่นซอง	<input type="text"/>	ลบวันที่	
วันเปิดซอง / วันเคาะราคา	<input type="text"/>	ลบวันที่	
วันอนุมัติรับราคา	<input type="text"/>	ลบวันที่	
วงเงินที่อนุมัติรับราคา	0	บาท	
ผู้ประกอบการ งานดำเนินการเอง	<input type="text"/>		
วันที่ลงนามในสัญญา	<input type="text"/>	ลบวันที่	

1.1.2 งานดำเนินการเอง บันทึกวิธีการจัดหา วันประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันยื่นซอง วันเปิดซอง / วันเคาะราคา วันอนุมัติรับราคา วงเงินที่อนุมัติรับราคา ผู้ประกอบการ งานดำเนินการเอง ลงนามในสัญญา

โครงการชลประทานเชียงใหม่

สำนักงานชลประทานที่ 1

แบบฟอร์ม การรายงานผลการปฏิบัติงาน รายสัปดาห์

(5) ปรับปรุงระบบส่งน้ำส่งชาวพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่ซ้อน ระยะที่ 2 ตำบลเมือง
งาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

งวดประจำวันที่ 22/10/2562 รายงานทุกวันอังคาร

ผลการปฏิบัติงานจริงทั้งโครงการ 0 เปอร์เซนต์

ผลการปฏิบัติงานจริงปีปัจจุบัน 0 เปอร์เซนต์

พื้นที่ชลประทาน (ไร่) ผล: 0 แผน:0

พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ผล: 4000 แผน:4000

ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) ผล: 0 แผน:0


คร้วเรือน ผล: 0 แผน:0

หัวข้อปัญหา ติดปัญหาอื่นๆ

ปัญหา-อุปสรรค เนื่องจากเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562 ได้เกิดฝนตกหนักในเขตพื้นที่ อำเภอเชียงดาว อันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุ "โพดุล" ส่งผลให้งานปรับปรุงระบบส่งน้ำส่งชาวอ่างเก็บน้ำแม่ซ้อน ทำให้บริเวณจุดดำเนินการ

แผนการแก้ไขปัญหา-อุปสรรค

SAVE RESET

1.2 คลิกที่เครื่องหมาย  เพื่อบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน รายสัปดาห์

1.2.1 เลือกงวดที่จะรายงานข้อมูล ผลการปฏิบัติงานจริงทั้งโครงการ ผลการปฏิบัติงานปีปัจจุบัน พื้นที่ชลประทาน พื้นที่รับประโยชน์ ความจุ คร้วเรือน หัวข้อปัญหา ปัญหา-อุปสรรคและแผนการแก้ไขปัญหา-อุปสรรค

โดยหากรายการใดมีแผนการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์จะแสดงตัวเลขแผนดังกล่าว และหากมีปัญหา-อุปสรรคจะต้องระบุรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถบันทึกผลการดำเนินงานได้

ข้อมูลประมาณการเพิ่มเติม

งบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ร.บ. 2558

ชื่อรายการงาน

(1.3) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในที่ทำการโครงการ โครงการชลประทานเชียงใหม่

โครงการที่รับผิดชอบ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

หน่วยงานระดับสำนัก

สำนักชลประทานที่ 1

ประเภท :

กิจกรรม :

วงเงินที่อนุมัติ (บาท) :

3,500,000.00

วงเงินจัดสรร (บาท) :

0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ :

1.ชื่อ: นายวิชัย ชัยเจริญชาติ	2.ชื่อ: <input type="text"/>
e-mail : iricm@hotmail.com	e-mail : <input type="text"/>
ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกลอาวุโส	ตำแหน่ง : <input type="text"/>
โทร : 0831521636	โทร : (Click here to add text)

1.3 คลิกที่เครื่องหมาย **plus** เพื่อบันทึกข้อมูล ประเภทงาน, กิจกรรม, วงเงินที่อนุมัติ (บาท), วงเงินจัดสรร (บาท),ผู้รับผิดชอบโครงการ,ชื่อ, e-mail, ตำแหน่ง,เบอร์โทร ผู้รับผิดชอบงาน เพิ่มเติม

ส่วนที่ 1 : ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์
1.1 ยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

1.2 มติคณะรัฐมนตรี : เมื่อวันที่

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลของโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์และรายละเอียดในการดำเนินโครงการ

(คำอธิบาย) :

วัตถุประสงค์ - 1. เพื่อแก้ไขปัญหาการเสื่อมสภาพและการชำรุด ของสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการฯ 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในโครงการฯ สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด , รายละเอียดในการดำเนินโครงการ - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภายในโครงการชลประทานเชียงใหม่

2.2 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ปี) :

1

เริ่มต้น (วัน/เดือน/ปี) :

11/57

สิ้นสุด (วัน/เดือน/ปี) :

02/58

2.3 แผนงาน / ผลงาน (หน่วย : %)

เดือน	ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
แผน	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ผล	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

2.4 แผนเงิน / ผลเงิน (จำนวนเงิน : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เดือน	ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
แผน (ล้านบาท)	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
ผล (ล้านบาท)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค (เหตุผลที่ล่าช้า) :

1.3.1 บันทึกข้อมูลพื้นฐานของโครงการ

ส่วนที่ 1 : ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์

1.1 ยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

1.2 มติคณะรัฐมนตรี : เมื่อวันที่

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลของโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์และรายละเอียดในการดำเนินโครงการวันเริ่มต้น สิ้นสุดโครงการ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

2.5 ภาพถ่ายประกอบโครงการ

*...Uploadรูปภาพ สำหรับ อุปกรณ์ iphone ipad [คลิกที่นี่](#)
ก่อนดำเนินงาน



Latitude:18.836776733398 , Longilude:98.954299926758

[remove]

คำอธิบายภาพ

สภาพหม้อแปลงภายในโครงการเชียงใหม่




Latitude:18.836936950684 , Longitude:98.95295715332

[remove]

คำอธิบายภาพ

สภาพทั่วไปของเสาไฟฟ้าพร้อมสายส่ง


ระหว่างดำเนินงาน (สามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อมีความก้าวหน้า)



[remove]

คำอธิบายภาพ

Save Cancel



[remove]

คำอธิบายภาพ

1.3.2 การบันทึกภาพถ่าย ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และหลังดำเนินงาน โดยเลือกที่กรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ จะปรากฏเมนูให้เลือกไฟล์โดยไฟล์ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกิน 1 MB (สามารถลดขนาดรูปภาพได้ที่เว็บไซต์ squooosh.app) และกรอกคำอธิบายประกอบรูปภาพ

หลังดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%)



[remove]
คำอธิบายภาพ

(Click here to add text)



[remove]
คำอธิบายภาพ

(Click here to add text)

2.6 สถานที่ดำเนินโครงการ (ตำบล อำเภอ จังหวัด) :
(คำอธิบาย) :

ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แผนที่ ดาวเทียม Latitude:18.837282644186 Longitude:98.953133225441
reset save
KML data:(copy ข้อมูล kml ของคุณลงช่องด้านล่าง)
save

ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลพิกัดในการใช้งาน รายงานข้อผิดพลาดของแผนที่

1.3.3 สถานที่ดำเนินโครงการ (ข้อมูลในส่วนนี้มีความสำคัญเช่นกรณีทำงานมีพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่าง ตำบล อำเภอ จังหวัด) Latitude, Longitude, KML data

ข้อมูลประมาณการ เพิ่มเติม

งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2558

ชื่อรายงานงาน

(1.3) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในที่ทำการโครงการ โครงการชลประทานเชียงใหม่

โครงการที่รับผิดชอบ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

หน่วยงานระดับสำนัก

สำนักชลประทานที่ 1

ภาพถ่ายประกอบโครงการ

1. การชี้แจงแบ่งงาน/ผู้รับผิดชอบก่อนปฏิบัติงาน



Latitude:18.837812423706 , Longitude:98.953002929688

[remove]

คำอธิบายภาพ

ประชุมแบ่งงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบ





Latitude:18.837831497192 , Longitude:98.952995300293

[remove]

คำอธิบายภาพ

ประชุมแบ่งงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบ

2. ตรวจสอบสภาพพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่



3. การปฏิบัติงาน
ก่อนดำเนินงาน



Latitude:18.836776733398 , Longitude:98.954299926758

[remove]

คำอธิบายภาพ

สภาพหม้อแปลงภายใน โครงการฯ เชียงใหม่




Latitude:18.836936950684 , Longitude:98.95295715332

[remove]

คำอธิบายภาพ

สภาพทั่วไปของเสาไฟฟ้าพร้อมสายส่งฯ

ระหว่างดำเนินงาน (สามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อมีความก้าวหน้า)



[remove]

คำอธิบายภาพ

(Click here to add text)




[remove]

คำอธิบายภาพ


(Click here to add text)

4. พื้นที่ที่ดิน



[remove]
คำอธิบายภาพ

Save Cancel



[remove]
คำอธิบายภาพ

5. การตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างการดำเนินงาน



[remove]
คำอธิบายภาพ

(Click here to add text)



[remove]
คำอธิบายภาพ

(Click here to add text)

6. การตรวจเยี่ยมโดยผู้บังคับบัญชาระดับบริหาร เช่นผอ.คป/ผส.ชป./ผชช./รองอธิบดีฯ/อธิบดี

1.4 คลิกที่เครื่องหมาย  เพื่อบันทึกข้อมูลประมาณการ เพิ่มเติม

1. การชี้แจงแบ่งงาน/ผู้รับผิดชอบก่อนปฏิบัติงาน
2. ตรวจสอบสภาพพื้นที่/ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
3. การปฏิบัติงาน
4. พื้นที่ที่ดิน
5. การตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างการดำเนินงาน
6. การตรวจเยี่ยมโดยผู้บังคับบัญชาระดับบริหาร เช่นผอ.คป/ผส.ชป./ผชช./รองอธิบดีฯ/อธิบดี
7. การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ/ผู้ใช้ประโยชน์
8. การตรวจรับและส่งมอบงาน
9. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลประมาณการเพิ่มเติม ตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจปีงบประมาณ 2558

งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2558

ชื่อรายการงาน

(1.3) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในที่ทำการโครงการ โครงการชลประทานเชียงใหม่

โครงการที่รับผิดชอบ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

หน่วยงานระดับสำนัก

สำนักชลประทานที่ 1

การพิจารณาจ้างแรงงาน


ตามบันทึกที่ กผง.819/2558 ลงวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๗

1. ให้ประชาสัมพันธ์/ประกาศความต้องการแรงงาน
2. สืบค้นพิจารณาแรงงาน
 - 2.1 เกษตรกรที่มีชื่ออยู่ในบัญชีครัวเรือนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในเขตประกาศต่งนำเพื่อนาปรังฤดูเพาะปลูก 2557/2558
 - 2.2 สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมฯ
 - 2.3 เกษตรกรที่มีชื่ออยู่ในบัญชีครัวเรือนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อ 2.1
 - 2.4 หากแรงงานในพื้นที่ไม่เพียงพอ ให้พิจารณาจ้างแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง
- 3...

การจ้างงาน

การจ้างแรงงานเกษตรกร						
แผน (คน)	ผล (คน)		แผน ค่าจ้าง(บาท)	ผล ค่าจ้าง(บาท)	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (วัน)	ระยะเวลาจ้างแรงงาน (วัน)
	* เฉพาะลำดับที่ 2.1	ลำดับอื่นๆ นอกจาก2.1				
2	(Click here to add text)	(Click here to add text)	68000	(Click here to add text)	120	3

ดูข้อมูลแบบต่าง ๆ
PBMS01 PBMS02 PBMS04
Normal Strategy ค.ส.ช.

1.5 คลิกที่เครื่องหมาย  เพื่อบันทึก ข้อมูลประมาณการ เพิ่มเติม ตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ

บันทึกข้อมูลแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระยะเวลาจ้างแรงงาน แยกประเภทตาม บันทึกที่ กผง.819/2557

2.1 เกษตรกรที่มีชื่ออยู่ในบัญชีครัวเรือนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในเขตประกาศต่งนำเพื่อนาปรังฤดูเพาะปลูก

2.2 สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมฯ ประเภทอื่นๆ

เป้าหมายผลผลิต จำนวนตามแหล่งเงิน

งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2561

ชื่อรายการงาน

(3) ค่าศึกษา สำรอง ออกแบบ งานเขลประธาน สำนักงานเขลประธานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

โครงการที่รับผิดชอบ

ส่วนวิศวกรรมบริหาร สป.ป. 1

หน่วยงานระดับสำนัก


สำนักงานเขลประธานที่ 1

* ข้อมูลประกอบสำหรับการอ้างอิง จากเล่มงบประมาณรายจ่ายและรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (หน้า 74) 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงที่วิเคราะห์อย่างละเอียด สำนักงานเขลประธานที่ 1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ				
		ปี 2557 แผน (мл.)	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการขนาดกลางที่ดำเนินการ	โครงการ	63 (63)	59	130	143	125
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	138 (75)	181	293	359	355
***เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	34.94 (-)	148.7	184.31	55.07	62.88
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	281,110 (5,750)	210,121	455,948	376,888	274,820
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

*เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น
 จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้นตามข้อเสนอโครงการ:
 ลบ.ม.
 จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น ในปัจจุบัน:
 ลบ.ม.
 ข้อมูลวันที่:
SAVE

ดูข้อมูลแบบต่าง ๆ
PMB01 PMB02 PMB04
Normal Strategy ศ.ส.ช.

1.6 คลิกที่เครื่องหมาย  บันทึกเป้าหมายผลผลิต จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้นตาม
ข้อเสนอโครงการฯ, จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น ในปัจจุบัน

ข้อมูลประเภทการ
งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561

ชื่อรายการงาน
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน

โครงการที่รับผิดชอบ
สำนักงานก่อสร้าง 1

หน่วยงานระดับสำนัก
สำนักพัฒนาแหล่งป่าขนาดใหญ่

การดำเนินงานกำจัดวัชพืช
สามารถ download หลักเกณฑ์ การกำจัดวัชพืชได้ -->download

การดำเนินงานกำจัดวัชพืช

ปริมาณการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	รอบการรายงานที่ 1 10 พ.ค.	รอบการรายงานที่ 2 25 พ.ค.	รอบการรายงานที่ 3 10 มิ.ย.	รอบการรายงานที่ 4 25 มิ.ย.	รอบการรายงานที่ 5 10 ก.ค.	รอบการรายงานที่ 6 25 ก.ค.	รอบการรายงานที่ 7 10 ส.ค.	รอบการรายงานที่ 8 25 ส.ค.	รอบการรายงานที่ 9 10 ก.ย.
หน่วย ต้น (สะสม):									
หน่วย ไร่ (สะสม):									
รายละเอียดการกำจัดวัชพืช:	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน

ปริมาณการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	รอบการรายงานที่ 10 25 ก.ย.	รอบการรายงานที่ 11 10 ต.ค.	รอบการรายงานที่ 12 25 ต.ค.	รอบการรายงานที่ 13 10 พ.ย.	รอบการรายงานที่ 14 25 พ.ย.	รอบการรายงานที่ 15 10 ธ.ค.	รอบการรายงานที่ 16 25 ธ.ค.	รอบการรายงานที่ 17 10 ม.ค.	รอบการรายงานที่ 18 25 ม.ค.
หน่วย ต้น (สะสม):									
หน่วย ไร่ (สะสม):									
รายละเอียดการกำจัดวัชพืช:	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน

ปริมาณการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	รอบการรายงานที่ 19 10 ก.พ.	รอบการรายงานที่ 20 25 ก.พ.	รอบการรายงานที่ 21 10 มี.ค.	รอบการรายงานที่ 22 25 มี.ค.	รอบการรายงานที่ 23 10 เม.ย.	รอบการรายงานที่ 24 30 เม.ย.
หน่วย ต้น (สะสม):						
หน่วย ไร่ (สะสม):						
รายละเอียดการกำจัดวัชพืช:	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน	คลิกเพื่อรายงาน

ดูข้อมูลแบบต่าง ๆ
PMB01 PMB02 PM504
Normal วิจัยชัย คุ.ส.ช.

1.7 คลิกที่เครื่องหมาย  เพื่อบันทึก ข้อมูลการกำจัดวัชพืช แยกเป็น 24 รอบในแต่ละเดือน โดยบันทึกจำนวนต้น และจำนวนไร่

รอบการรายงานครั้งที่ 21

ปริมาณการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช หน่วย ต้น (สะสม) หน่วย ไร่ (สะสม)

เครื่องมือที่ใช้ พื้นที่ทั้งหมดวัชพืช

แบ็คโฮ คัน (สะสม) lat

รถบรรทุก คัน (สะสม) img

เรือกำจัดวัชพืช ลำ (สะสม)

เรือท้องแบน ลำ (สะสม)

แรงงานคน คน (สะสม)

ความยาวคลอง เมตร (สะสม)

ความกว้างคลอง เมตร (สะสม)

พื้นที่อ่างเก็บน้ำ ไร่ (สะสม)

ปัญหาอื่นๆ

บันทึก

1.7.1 คลิกที่ “คลิกเพื่อรายงาน” เพื่อบันทึก ข้อมูลเพิ่มเติมโดยแยกเป็น 24 รอบในแต่ละเดือน โดยเป็นข้อมูลจำนวนเครื่องจักร แบ็คโฮ รถบรรทุก เรือกำจัดวัชพืช แรงงานคน และข้อมูลรายละเอียดโครงการ พื้นที่ที่ดิน (LAT LONG) ความยาวคลอง ความกว้างคลอง พื้นที่อ่างเก็บน้ำ และปัญหาอื่นๆ

ข้อมูลประมาณการ เพิ่มเติม การใช้ยางพารา

เงินกันเหลื่อมปี 2563

ชื่อรายการงาน

ซ่อมแซมถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝายน้ำวมช่วงบ้านห้วยบง ตำบลแม่ขอม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 0.622 กม.

โครงการที่รับผิดชอบ

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน


หน่วยงานระดับสำนัก

สำนักงานชลประทานที่ 1

การใช้ยางพารา

แผนการใช้ยางพารา (ตัน)	รวมผลการใช้ยางพารา	ผลการใช้ยางพารา			
		น้ำยางข้น (ตัน)	ยางแผ่นรมควัน (ตัน)	ยางแท่ง (ตัน)	ร้อยละจากแผน
	0	(Click here to add text)	(Click here to add text)	(Click here to add text)	
แผนการใช้ยางพารา (ระยะทาง/กิโลเมตร)	รวมผลระยะทาง (ระยะทาง/กิโลเมตร)				
(Click here to add text)	(Click here to add text)				
ประเภทถนน	<input type="radio"/> Para Asphalt Concrete <input type="radio"/> Para Soil Cement บันทึก				

ดูข้อมูลแบบต่าง ๆ
PBMS01 PBMS02 PBMS04
Normal Sirasay ค.ส.ช.

1.8 คลิกที่เครื่องหมาย  เพื่อบันทึก ข้อมูลการใช้ยางพารา (สามารถบันทึกได้เฉพาะผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับยางพาราที่มี ICON ปราบกฐัน) โดยบันทึกแผน ผล จำนวนต้นยางพารา ผลแยกเป็น น้ำยางข้น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และแผนผล ระยะทาง ที่ดำเนินการ ประเภทถนนที่ดำเนินการ

2. เมนูผลการจัดซื้อจัดจ้าง



2.1 เมนูผลการจัดซื้อจัดจ้างจะแสดงข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างที่สำนักได้กรอกข้อมูลเข้ามาโดยแสดงรายละเอียดแต่ละรายการงาน


ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการประมวลผล (งานจ้างเหมา)

รายงานระบบประมวลผล 2558
แสดงผลการจัดการจัดซื้อ (โดยที่งานประมวลผล) สำหรับงานจ้างเหมา (โดยที่งานจ้างเหมา)
หน่วยงาน / โครงการ : **โครงการขุดลอกคลองในเขตเมืองใหม่**
(คลิก>>> ดูผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมา)

ชื่องาน	อนุมัติงบ จัดซื้อ-จัด จ้าง	วันที่ทำ ราคา	ประมวลผล โดย	ประมวลผล วันที่	ประมวลผล วันที่	ประมวลผล วันที่	ประมวลผล วันที่	ประมวลผล วันที่	ประมวลผล วันที่	ประมวลผล วันที่	ประมวลผล วันที่	ประมวลผล วันที่	ประมวลผล วันที่	ประมวลผล วันที่	ประมวลผล วันที่	ประมวลผล วันที่	ประมวลผล วันที่	ประมวลผล วันที่
(1.2) งานขุดลอกคลองในเขตเมืองใหม่ ขุดลอกคลองในเขตเมืองใหม่ - [ดู]	179002557	ประมวลผลค่า	09/02/2558	13/02/2558														
(7) งานขุดลอกคลองในเขตเมืองใหม่ ขุดลอกคลองในเขตเมืองใหม่ - [ดู]	13/10/2557																	
(8) งานขุดลอกคลองในเขตเมืองใหม่ ขุดลอกคลองในเขตเมืองใหม่ - [ดู]	25/03/2557																	
(34.1) งานขุดลอกคลองในเขตเมืองใหม่ ขุดลอกคลองในเขตเมืองใหม่ - [ดู]	13/10/2557	ประมวลผลค่า	19/12/2557	25/12/2557	09/01/2558	03/02/2558	12,369,000											
(1.1) งานขุดลอกคลองในเขตเมืองใหม่ ขุดลอกคลองในเขตเมืองใหม่ - [ดู]	22/09/2557																	
(1.2) งานขุดลอกคลองในเขตเมืองใหม่ ขุดลอกคลองในเขตเมืองใหม่ - [ดู]	11/03/2557																	
(1.5) งานขุดลอกคลองในเขตเมืองใหม่ ขุดลอกคลองในเขตเมืองใหม่ - [ดู]	13/10/2557																	
(1.7) งานขุดลอกคลองในเขตเมืองใหม่ ขุดลอกคลองในเขตเมืองใหม่ - [ดู]	29/02/2557																	
(1.15) งานขุดลอกคลองในเขตเมืองใหม่ ขุดลอกคลองในเขตเมืองใหม่ - [ดู]	13/10/2557																	

2.1.1 รายละเอียดข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแบ่งเป็นงานจ้างเหมาและงานดำเนินการเอง โดยสามารถแก้ไขข้อมูล

3. เมนูผลการปฏิบัติงาน



ผลการปฏิบัติงาน

รายการงาน ปีงบประมาณ 2558

โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ 11/03/2558

ชื่องาน / ประมาณการ	เป้าหมายทั้งโครงการ (%)			เป้าหมายปีปัจจุบัน (%)			รายงานผลงานล่าสุด	รายงานทั้งหมด
	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง		
(1.3) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในที่ทำการโครงการ โครงการชลประทานเชียงใหม่	30.00	0.00	-30.00	30.00	0.00	-30.00	10/03/2558	รายละเอียด
(7) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่โก๋น โครงการชลประทานเชียงใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	39.00	14.00	-25.00	39.00	14.00	-25.00	10/03/2558	รายละเอียด
(8) ระบบส่งน้ำฝายเหมืองใหม่พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	66.00	69.00	3.00	66.00	69.00	3.00	10/03/2558	รายละเอียด
(34.1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโทกเสื่อ ตำบลคอยหล่อ อำเภอคอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	5.00	0.00	-5.00	5.00	0.00	-5.00	10/03/2558	รายละเอียด
(1.1) บ่อเก็บน้ำ คสล. พร้อมอาคารประกอบบ้านหนองเขียว ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	10/03/2558	รายละเอียด
(1.2) ระบบส่งน้ำบ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	92.00	45.00	-47.00	92.00	45.00	-47.00	10/03/2558	รายละเอียด
(1.6) ฝายบ้านปิลอ พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	58.00	74.00	16.00	58.00	74.00	16.00	10/03/2558	รายละเอียด
(1.7) สระเก็บน้ำห้วยทีคีพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	76.00	74.00	-2.00	76.00	74.00	-2.00	10/03/2558	รายละเอียด

3.1 สรุปรายละเอียดผลการดำเนินงานของแต่ละรายการงาน

ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์


ชื่อประมวลการ (1.3) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในที่ทำการโครงการ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ปีเริ่มต้น 2558 ปีสิ้นสุด 2558

ที่	สัปดาห์ที่รายงาน	ผลงานปีปัจจุบัน (%)	ผลงานทั้งโครงการ (%)	ปัญหา - อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ	ลบ
1	28/10/2557	0	0	เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนจัดทำ Spec			X
2	04/11/2557	0	0	เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนจัดทำ Spec			X
3	11/11/2557	0	0	เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนจัดทำ Spec			X
4	18/11/2557	0	0	เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนจัดทำ ราคาากลาง			X
5	18/11/2557	0	0	เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนจัดทำ ราคาากลาง			X
6	25/11/2557	0	0	เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างจัดจ้าง			X
7	02/12/2557	0	0	เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ ขั้นตอนจัดทำ spec			X
8	09/12/2557	0	0	เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ ขั้นตอนจัดทำ spec			X
9	16/12/2557	0	0	ประกาศ TOR 17-22 ๕๕.57 ประกาศขายเอกสาร 23 ๕๕.57 ยื่นเอกสาร 7 ๓๕.57 ประมูล 19 ๓๕.58			X
10	23/12/2557	0	0	ประกาศ TOR 17-22 ๕๕.57 ประกาศขายเอกสาร 23 ๕๕.57 ยื่นเอกสาร 7 ๓๕.57 ประมูล 19 ๓๕.58			X
11	23/12/2557	0	0	ประกาศ TOR 17-22 ๕๕.57 ประกาศขายเอกสาร 23 ๕๕.57 ยื่นเอกสาร 7 ๓๕.57 ประมูล 19 ๓๕.58			X
12	30/12/2557	0	0	ประกาศ TOR 17-22 ๕๕.57 ประกาศขายเอกสาร 23 ๕๕.57 ยื่นเอกสาร 7 ๓๕.57 ประมูล 19 ๓๕.58			X
13	06/01/2558	0	0	ประกาศ TOR 17-22 ๕๕.57 ประกาศขายเอกสาร 23 ๕๕.57 ยื่นเอกสาร 7 ๓๕.57 ประมูล 19 ๓๕.58			X
14	13/01/2558	0	0	ประกาศ TOR 17-22 ๕๕.57 ประกาศขายเอกสาร 23 ๕๕.57 ยื่นเอกสาร 7 ๓๕.57 ประมูล 19 ๓๕.58			X
15	20/01/2558	0	0	ประกาศ TOR 17-22 ๕๕.57 ประกาศขายเอกสาร 23 ๕๕.57 ยื่นเอกสาร 7 ๓๕.57 ประมูล 19 ๓๕.58			X
16	27/01/2558	0	0	ประกาศ TOR 17-22 ๕๕.57 ประกาศขายเอกสาร 23 ๕๕.57 ยื่นเอกสาร 7 ๓๕.57 ประมูล 19 ๓๕.58			X
17	03/02/2558	0	0	ประกาศ TOR 17-22 ๕๕.57 ประกาศขายเอกสาร 23 ๕๕.57 ยื่นเอกสาร 17 ๓๕.57 ประมูล 19			X

3.1.1 เลือกไปที่เมนูรายละเอียดซึ่งอยู่ท้ายรายการงานจะแสดงข้อมูลรายงานผลในการปฏิบัติงานรายสัปดาห์พร้อมปัญหาอุปสรรค

4. เมนู ผลการเบิกจ่าย



ระบบจะแสดงสรุปผลการเบิกจ่ายรายการ ที่ทางสำนักได้บันทึกข้อมูลไว้ โครงการ/หน่วยงาน ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยผู้มีสิทธิ์แก้ไขคือ username ระดับสำนัก

รายการงาน ปีงบประมาณ 2563
โครงการชลประทานเชียงใหม่

ชื่องาน / ประมาณการ	ได้รับกรมจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	รายงาน เบิกจ่าย ล่าสุด
	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		
ซ่อมแซมประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำ ดอนขุนห้วยทราย	485,900	0	485,900	485,782	0	485,782	99.98	19/11/2562
ซ่อมแซมประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำ แม่ชื่อน	497,500	0	497,500	497,490	0	497,490	100.00	19/11/2562
ซ่อมแซมประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำ ห้วยสระคะ	474,400	0	474,400	474,212	0	474,212	99.98	19/11/2562
ซ่อมแซมประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำ ห้วยเปือย(ก้วยระคาน)	473,300	0	473,300	473,120	0	473,120	99.98	19/11/2562
ซ่อมแซมประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำ อมตงไค้	488,200	0	488,200	485,523	0	485,523	99.86	19/11/2562
ซ่อมแซมประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำ แม่ฮอน	490,000	0	490,000	482,807	0	482,807	98.89	19/11/2562
ซ่อมแซมประตูน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำอหลอง	148,900	0	148,900	148,900	0	148,900	100.00	19/11/2562
ซ่อมแซมประตูน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำดงผึ้ง	118,900	0	118,900	118,000	0	118,000	99.24	19/11/2562
ซ่อมแซมประตูน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำทุ่งเขา	118,900	0	118,900	118,000	0	118,000	99.24	19/11/2562
ปรับปรุงระบบส่งน้ำที่เขว้าพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำ แม่รัตนระยะที่ 2 อ่างแม่เมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่	290,029	0	290,029	290,029	0	290,029	100.00	03/12/2562
รวมทั้งโครงการ	3,594,029	0	3,594,029	3,583,864	0	3,583,864	99.72	

5. เมนู Cash Flow



Logged in: **omid01** [เพิ่มค่าหน่วยการ](#) [รายการประมาณการ](#) [งบประมาณและผลการเบิกจ่าย](#) [ระดับหน่วยงาน](#) - [Log out](#)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (Cash Flow)

รายงานงาน ปีงบประมาณ 2558

โครงการชลประทานเชียงใหม่

เลือกกรายการงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (Cash Flow)

(1.3) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในพื้นที่อาคารโครงการ โครงการชลประทานเชียงใหม่
(7) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่โกนิง โครงการชลประทานเชียงใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ
(8) ระบบส่งน้ำฝายเหมืองใหม่พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ
(34.1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโกลือ ตามคลองหูล่อ อำเภอค้อยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
(1.1) บ่อเก็บน้ำ คสล.พร้อมอาคารประกอบบ้านหนองเขี้ยว ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
(1.2) ระบบส่งน้ำบ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
(1.6) ฝ่ายบำรุงรักษา พร้อมระบบส่งน้ำโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ
(1.7) สระเก็บน้ำห้วยดีพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ
(1.18) ฝ่ายบำรุงรักษาพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำแมหาด) จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ
(1.23) ฝ่ายโยธา 7 พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะ 1) จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.24) อาคารบังคับน้ำห้วยยานแลพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.25) ระบบส่งน้ำและของฟักในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางฮาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.26) ฝ่ายบำรุงรักษาพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงลำน้ำปิงตอนบนบ้านปางฮาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
(1.28) ระบบส่งน้ำฝายชนิงฝายชนิงลูกที่ 1 บ้านเมืองนะ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ
(1.1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยบอน(ระชะตห้วย) จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ

5.1 เว็บไซต์จะแสดงรายละเอียดรายการงานรับผิดชอบ โดยสามารถคลิกที่ชื่อรายการงานเพื่อกรอกข้อมูล Cash Flow

การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการปฏิบัติงาน (Cash Flow)

ชื่อโครงการ: (1.3) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในท่าอากาศยาน โครงการชลประทานเชียงใหม่						
ปีแรก: 2558 ปีสิ้นสุด: 2558						
เพิ่ม / แก้ไข						
ที่	เดือน	ปี	แผนการปฏิบัติงาน ปีปัจจุบัน(%)	แผนการปฏิบัติงาน เป้าหมายรวมทั้ง โครงการ(%)	แผนการเบิกจ่าย ปีปัจจุบัน(บาท)	แผนการเบิกจ่าย รวมทั้งโครงการ(บาท)
1	ตุลาคม	2557	0	0	0	0
2	พฤศจิกายน	2557	20	20	766000	766000
3	ธันวาคม	2557	50	50	1766000	1766000
4	มกราคม	2558	80	80	2766000	2766000
5	กุมภาพันธ์	2558	100	100	3500000	3500000
6	มีนาคม	2558	100	100	3500000	3500000
7	เมษายน	2558	100	100	3500000	3500000
8	พฤษภาคม	2558	100	100	3500000	3500000
9	มิถุนายน	2558	100	100	3500000	3500000
10	กรกฎาคม	2558	100	100	3500000	3500000
11	สิงหาคม	2558	100	100	3500000	3500000
12	กันยายน	2558	100	100	3500000	3500000

5.1.1 เว็บไซต์จะแสดงรายละเอียด แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่าย โดยแยกเป็นข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลทั้งโครงการ โดยสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลโดยคลิกที่ **เพิ่ม / แก้ไข**

การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการปฏิบัติงาน (Cash Flow)

ชื่อโครงการ: (1.3) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในท่าอากาศยาน โครงการชลประทานเชียงใหม่						
ปีแรก: 2558 ปีสิ้นสุด: 2558						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> BACK SAVE RESET </div>						
ที่	เดือน	ปี	แผนการปฏิบัติงาน ปีปัจจุบัน(%)	แผนการปฏิบัติงาน เป้าหมายรวมทั้ง โครงการ(%)	แผนการเบิกจ่าย ปีปัจจุบัน(บาท)	แผนการเบิกจ่าย รวมทั้งโครงการ(บาท)
1	ตุลาคม	2557	0	0	0	0
2	พฤศจิกายน	2557	20	20	766000	766000
3	ธันวาคม	2557	50	50	1766000	1766000
4	มกราคม	2558	80	80	2766000	2766000
5	กุมภาพันธ์	2558	100	100	3500000	3500000
6	มีนาคม	2558	100	100	3500000	3500000
7	เมษายน	2558	100	100	3500000	3500000
8	พฤษภาคม	2558	100	100	3500000	3500000
9	มิถุนายน	2558	100	100	3500000	3500000
10	กรกฎาคม	2558	100	100	3500000	3500000
11	สิงหาคม	2558	100	100	3500000	3500000
12	กันยายน	2558	100	100	3500000	3500000

*หมายเหตุ: ในช่องแผนการเบิกจ่าย ให้ใส่ข้อมูล เงินโดยไม่ใช่ เครื่องหมาย "," และ หน่วยเป็นบาท เช่น 1700000.00 ไม่ใช่ 1,700,000.00

5.1.2 เมื่อเข้าสู่เพิ่มแก้ไขแผนการดำเนินงาน จะปรากฏกล่องข้อความให้กรอกรายละเอียดของแต่ละเดือน

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

การรายงานข้อมูลระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อมูลที่กรอก	น้ำหนักข้อมูล	หน่วย	การให้คะแนน
วัตถุประสงค์และรายละเอียดในการดำเนินโครงการ	0.25	คะแนน	กรอกข้อมูลวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์และรายละเอียดในการดำเนินโครงการครบถ้วน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ปี)	0.25	คะแนน	กรอกข้อมูลระยะเวลาดำเนินโครงการครบถ้วน
วันที่เริ่มต้น	0.25	คะแนน	กรอกข้อมูลวันที่เริ่มต้นโครงการครบถ้วน
วันที่สิ้นสุด	0.25	คะแนน	กรอกข้อมูลวันที่สิ้นสุดโครงการครบถ้วน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	0.5	คะแนน	กรอกแผนการใช้จ่ายงบประมาณครบถ้วนและผลรวมถูกต้องตามงบประมาณที่ได้รับ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	0.5	คะแนน	กรอกผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลรวมถูกต้องตามงบประมาณที่ได้รับ
รูปภาพก่อนการดำเนินงาน	1	คะแนน	อัปโหลดรูปภาพก่อนการดำเนินงานทั้ง2ภาพครบถ้วน
รูปภาพระหว่างการดำเนินงาน	1	คะแนน	อัปโหลดรูปภาพระหว่างการดำเนินงานทั้ง2ภาพครบถ้วน
รูปภาพหลังการดำเนินงาน	1	คะแนน	อัปโหลดรูปภาพหลังการดำเนินงานทั้ง2ภาพครบถ้วน
สถานที่ดำเนินงาน	0.5	คะแนน	ข้อมูลสถานที่ดำเนินงานครบถ้วน
lat	0.25	คะแนน	ข้อมูล lat ถูกต้อง
long	0.25	คะแนน	ข้อมูล long ถูกต้อง
กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง	21	คะแนน	กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกอบด้วย งานจ้างเหมา และงานดำเนินการเอง วิธีจัดหา, วันประกาศ TOR, วันที่และวงเงิน อนุมัติรับราคา, วันที่และวงเงิน ลงนามในสัญญา, ผู้ประกอบการ และกรอกข้อมูลถูกต้องตามประเภทการดำเนินงาน วงเงินจ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งบตัวเบิกรเอง
ผลการดำเนินงาน	4	คะแนน	รายงานผลการดำเนินงานถูกต้องครบถ้วน
ผลการเบิกจ่ายและโอนจัดสรร	7	คะแนน	รายงานข้อมูลผลเบิกจ่ายแยกประเภทเป็นจ้างเหมางานดำเนินการเอง ถูกต้อง งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและงบประมาณที่ได้รับ กรณีเบิกจ่ายเกินงบประมาณที่ได้รับ ต้องกรอกข้อมูลในช่องชี้แจงปัญหา/อุปสรรค
ชี้แจงปัญหา/อุปสรรค	2	คะแนน	มีการชี้แจงปัญหา/อุปสรรค กรณีที่ผลการดำเนินงานแตกต่างจากแผนการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ20
GFMS	1	คะแนน	กรอกข้อมูล GFMS ครบถ้วน
ข้อมูลพื้นฐาน (ตำบล อำเภอ จังหวัด งบประมาณการ)	8	คะแนน	กรอกข้อมูล ตำบล อำเภอ จังหวัด งบประมาณการ ครบถ้วน
รวมทั้งหมด	49	คะแนน	
ปรับน้ำหนักคะแนนทั้งหมด	5	คะแนน	

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

การรายงานข้อมูลระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ร้อยละ	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
ค่าคะแนน	1.00*	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00

ร้อยละ	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
ค่าคะแนน	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	4.80	5.00

หมายเหตุ : * ไม่บันทึกข้อมูล หรือบันทึก < ร้อยละ 80 ได้ 1 คะแนน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘, ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๑๓๗๐/๒๕๖๒

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง คำคะแนผลการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม Online กองแผนงาน) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

ด้วยกองแผนงาน จัดทำคำคะแนผลการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม Online กองแผนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว สรุปรายตามตารางที่แนบ

ที่	สำนัก/กอง	จำนวนรายการงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.)				รอบ 6 เดือน		รอบ 12 เดือน		สรุป คะแนน ทั้งปี
		รายการ ผูกพันใหม่	รายการ ผูกพันเดิม	งานปีเดียว	รวม	ร้อยละ การบันทึกข้อมูล	คะแนน	ร้อยละ การบันทึก	คะแนน	
	รวมทั้งสิ้น	21	100	8,216	8,337					
1	สำนักงานชลประทานที่ 1	-	-	396	396	94.88	3.9767	97.10	4.4200	4.1983
2	สำนักงานชลประทานที่ 2	-	2	332	334	93.28	3.6556	96.41	4.2830	3.9693
3	สำนักงานชลประทานที่ 3	-	1	254	255	93.16	3.6329	95.66	4.1313	3.8821
4	สำนักงานชลประทานที่ 4	-	-	291	291	93.59	3.7189	98.18	4.6357	4.1773
5	สำนักงานชลประทานที่ 5	-	1	453	454	98.19	4.6378	98.77	4.7548	4.6963
6	สำนักงานชลประทานที่ 6	-	-	498	498	97.01	4.4010	96.74	4.3478	4.3744
7	สำนักงานชลประทานที่ 7	-	-	391	391	91.42	3.2836	96.13	4.2262	3.7549
8	สำนักงานชลประทานที่ 8	-	-	512	512	94.00	3.7999	96.66	4.3316	4.0657
9	สำนักงานชลประทานที่ 9	-	3	591	594	97.05	4.4096	97.29	4.4584	4.4340
10	สำนักงานชลประทานที่ 10	-	-	469	469	97.94	4.5887	95.51	4.1012	4.3449
11	สำนักงานชลประทานที่ 11	-	-	500	500	96.91	4.3812	97.60	4.5204	4.4508
12	สำนักงานชลประทานที่ 12	-	2	454	456	97.93	4.5861	98.90	4.7800	4.6831
13	สำนักงานชลประทานที่ 13	-	-	502	502	96.86	4.3728	98.36	4.6727	4.5228
14	สำนักงานชลประทานที่ 14	-	-	325	325	98.41	4.6819	98.46	4.6929	4.6874
15	สำนักงานชลประทานที่ 15	-	-	366	366	95.94	4.1871	96.01	4.2026	4.1949
16	สำนักงานชลประทานที่ 16	-	-	376	376	99.57	4.9133	97.66	4.5316	4.7224
17	สำนักงานชลประทานที่ 17	-	-	268	268	95.76	4.1518	97.09	4.4178	4.2848
18	สำนักเครื่องจักรกล	-	-	640	640	95.63	4.1256	95.56	4.1111	4.1184
19	สำนักบริหารโครงการ	5	15	19	39	95.12	4.0240	95.12	4.0240	4.0240
20	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	-	-	138	138	92.38	3.4755	94.29	3.8583	3.6669
21	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	7	32	156	195	94.90	3.9800	94.90	3.9800	3.9800
22	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	8	40	146	194	95.20	4.0400	95.20	4.0400	4.0400
23	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	-	-	48	48	98.33	4.6660	96.24	4.2474	4.4567
24	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	1	4	1	6	94.05	3.8095	96.26	4.2517	4.0306
25	สำนักกฎหมายและที่ดิน	-	-	90	90	97.96	4.5918	98.92	4.7846	4.6882

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

ตารางที่ 1 สรุปค่าคะแนนการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (รอบ 12 เดือน)

ที่	สำนัก/กอง	จำนวนรายการงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.)				รอบ 6 เดือน		รอบ 12 เดือน		สรุป คะแนน ทั้งปี
		รายการ ผูกพันใหม่	รายการ ผูกพันเดิม	งานปีเดียว	รวม	ร้อยละ การบันทึกข้อมูล	คะแนน	การบันทึก ข้อมูล	คะแนน	
	รวมทั้งสิ้น	21	100	8,216	8,337					
1	สำนักงานชลประทานที่ 1	-	-	396	396	94.88	3.9767	97.10	4.4200	4.1983
2	สำนักงานชลประทานที่ 2	-	2	332	334	93.28	3.6556	96.41	4.2830	3.9693
3	สำนักงานชลประทานที่ 3	-	1	254	255	93.16	3.6329	95.66	4.1313	3.8821
4	สำนักงานชลประทานที่ 4	-	-	291	291	93.59	3.7189	98.18	4.6357	4.1773
5	สำนักงานชลประทานที่ 5	-	1	453	454	98.19	4.6378	98.77	4.7548	4.6963
6	สำนักงานชลประทานที่ 6	-	-	498	498	97.01	4.4010	96.74	4.3478	4.3744
7	สำนักงานชลประทานที่ 7	-	-	391	391	91.42	3.2836	96.13	4.2262	3.7549
8	สำนักงานชลประทานที่ 8	-	-	512	512	94.00	3.7999	96.66	4.3316	4.0657
9	สำนักงานชลประทานที่ 9	-	3	591	594	97.05	4.4096	97.29	4.4584	4.4340
10	สำนักงานชลประทานที่ 10	-	-	469	469	97.94	4.5887	95.51	4.1012	4.3449
11	สำนักงานชลประทานที่ 11	-	-	500	500	96.91	4.3812	97.60	4.5204	4.4508
12	สำนักงานชลประทานที่ 12	-	2	454	456	97.93	4.5861	98.90	4.7800	4.6831
13	สำนักงานชลประทานที่ 13	-	-	502	502	96.86	4.3728	98.36	4.6727	4.5228
14	สำนักงานชลประทานที่ 14	-	-	325	325	98.41	4.6819	98.46	4.6929	4.6874
15	สำนักงานชลประทานที่ 15	-	-	366	366	95.94	4.1871	96.01	4.2026	4.1949
16	สำนักงานชลประทานที่ 16	-	-	376	376	99.57	4.9133	97.66	4.5316	4.7224
17	สำนักงานชลประทานที่ 17	-	-	268	268	95.76	4.1518	97.09	4.4178	4.2848
18	สำนักเครื่องจักรกล	-	-	640	640	95.63	4.1256	95.56	4.1111	4.1184

ที่	สำนัก/กอง	จำนวนรายการงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.)				รอบ 6 เดือน		รอบ 12 เดือน		สรุป คะแนน ทั้งปี
		รายการ ผูกพันใหม่	รายการ ผูกพันเดิม	งานปีเดียว	รวม	ร้อยละ การบันทึกข้อมูล	คะแนน	การบันทึก ข้อมูล	คะแนน	
19	สำนักบริหารโครงการ	5	15	19	39	95.12	4.0240	95.12	4.0240	4.0240
20	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	-	-	138	138	92.38	3.4755	94.29	3.8583	3.6669
21	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	7	32	156	195	94.90	3.9800	94.90	3.9800	3.9800
22	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	8	40	146	194	95.20	4.0400	95.20	4.0400	4.0400
23	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	-	-	48	48	98.33	4.6660	96.24	4.2474	4.4567
24	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	1	4	1	6	94.05	3.8095	96.26	4.2517	4.0306
25	สำนักกฎหมายและที่ดิน	-	-	90	90	97.96	4.5918	98.92	4.7846	4.6882

ตารางที่ 2 สรุปผลการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (รอบ 6 เดือน)

ร.ที่	สำนัก	ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูล					
		ความครบถ้วน (บรรยาย)					
		กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง	แผนที่ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ชี้แจงปัญหา/อุปสรรค	ข้อมูลพื้นฐาน (ตำบล อำเภอ จังหวัด GFMIS)
1	สำนักงานชลประทานที่ 1	บางรายการบันทึกวิธีจัดหางานจ้างเหมา,วันประกาศ TOR, วันประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้างงานจ้างเหมา, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา (วันที่), อนุมัติรับราคา(วงเงิน), ลงนามในสัญญา(วันที่), ลงนามในสัญญา(วงเงิน), อายุสัญญา, เริ่มสัญญา, สั่งเข้าทำงาน, สิ้นสุดสัญญา, ผู้ประกอบการไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแผนเงิน, ผลเงิน, lat, longไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกผลการปฏิบัติงานปัจจุบัน (เดือน)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (จ้างเหมา)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแนวทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึก ตำบล อำเภอ จังหวัดไม่สมบูรณ์

ที่	สำนัก	ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูล					
		ความครบถ้วน (บรรยาย)					
		กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง	แผนที่ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ชี้แจงปัญหา/อุปสรรค	ข้อมูลพื้นฐาน (ตำบล อำเภอ จังหวัด GFMS)
2	สำนักงานชลประทานที่ 2	บางรายการบันทึกวิธีจัดหางานจ้างเหมา,วันประกาศ TOR, วันประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้างงานจ้างเหมา, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา (วันที่), อนุมัติรับราคา(วงเงิน), ลงนามในสัญญา(วันที่), ลงนามในสัญญา(วงเงิน), อายุสัญญา, เริ่มสัญญา, สั่งเข้าทำงาน, สิ้นสุดสัญญา, ผู้ประกอบการ, วิธีจัดซื้อไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแผนเงิน, ผลเงิน, lat, longไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกผลการปฏิบัติงานปัจจุบัน (เดือน)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (จ้างเหมา)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแนวทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึก ตำบล อำเภอ จังหวัดไม่สมบูรณ์
3	สำนักงานชลประทานที่ 3	บางรายการบันทึกวิธีจัดหางานจ้างเหมา,วันประกาศ TOR, วันประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้างงานจ้างเหมา, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา (วันที่), อนุมัติรับราคา(วงเงิน), ลงนามในสัญญา(วันที่), ลงนามในสัญญา(วงเงิน), อายุสัญญา, เริ่มสัญญา, สั่งเข้าทำงาน, สิ้นสุดสัญญา, ผู้ประกอบการไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแผนเงิน, ผลเงิน, lat, longไม่สมบูรณ์	บันทึกครบถ้วน	บางรายการบันทึกได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (จ้างเหมา), ได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (ทำเอง)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแนวทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึก ตำบล อำเภอ จังหวัด GFMSไม่สมบูรณ์

ที่	สำนัก	ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูล					
		ความครบถ้วน (บรรยาย)					
		กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง	แผนที่ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ชี้แจงปัญหา/อุปสรรค	ข้อมูลพื้นฐาน (ตำบล อำเภอ จังหวัด GFMS)
4	สำนักงานชลประทานที่ 4	บางรายการบันทึกวิธีจัดหางานจ้างเหมา,วันประกาศ TOR, วันประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้างงานจ้างเหมา, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา (วันที่), อนุมัติรับราคา(วงเงิน), ลงนามในสัญญา(วันที่), ลงนามในสัญญา(วงเงิน), อายุสัญญา, เริ่มสัญญา, สั่งเข้าทำงาน, สิ้นสุดสัญญา, ผู้ประกอบการไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแผนเงิน, lat, long ไม่สมบูรณ์	บันทึกครบถ้วน	บางรายการบันทึกได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (ทำเอง), ผลการเบิกจ่าย (รวม)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแนวทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึก ตำบล อำเภอ จังหวัดไม่สมบูรณ์
5	สำนักงานชลประทานที่ 5	บางรายการบันทึกวิธีจัดหางานจ้างเหมา,วันประกาศ TOR, วันประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้างงานจ้างเหมา, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา (วันที่), อนุมัติรับราคา(วงเงิน), ลงนามในสัญญา(วันที่), ลงนามในสัญญา(วงเงิน), อายุสัญญา, เริ่มสัญญา, สั่งเข้าทำงาน, สิ้นสุดสัญญา, ผู้ประกอบการไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแผนเงิน, lat, long ไม่สมบูรณ์	บันทึกครบถ้วน	บางรายการบันทึกได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (จ้างเหมา)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแนวทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึก GFMSไม่สมบูรณ์

ที่	สำนัก	ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูล					
		ความครบถ้วน (บรรยาย)					
		กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง	แผนที่ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ชี้แจงปัญหา/อุปสรรค	ข้อมูลพื้นฐาน (ตำบล อำเภอ จังหวัด GFMS)
6	สำนักงานชลประทานที่ 6	บางรายการบันทึกวิธีจัดหางานจ้างเหมา,วันประกาศ TOR, วันประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้างงานจ้างเหมา, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา (วันที่), อนุมัติรับราคา(วงเงิน), ลงนามในสัญญา(วันที่), ลงนามในสัญญา(วงเงิน), อายุสัญญา, เริ่มสัญญา, สั่งเข้าทำงาน, สิ้นสุดสัญญา, ผู้ประกอบการไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแผนเงิน, lat, long ไม่สมบูรณ์	บันทึกครบถ้วน	บางรายการบันทึกได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (จ้างเหมา), ผลการเบิกจ่าย (รวม), ผลการเบิกจ่าย (ทำเอง)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแนวทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึก ตำบล อำเภอ จังหวัดไม่สมบูรณ์
7	สำนักงานชลประทานที่ 7	บางรายการบันทึกวิธีจัดหางานจ้างเหมา,วันประกาศ TOR, วันประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้างงานจ้างเหมา, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา (วันที่), อนุมัติรับราคา(วงเงิน), ลงนามในสัญญา(วันที่), ลงนามในสัญญา(วงเงิน), อายุสัญญา, เริ่มสัญญา, สั่งเข้าทำงาน, สิ้นสุดสัญญา, ผู้ประกอบการไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแผนเงิน, longไม่สมบูรณ์	บันทึกครบถ้วน	บางรายการบันทึกได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (ทำเอง), ผลการเบิกจ่าย (ทำเอง)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแนวทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึก ตำบล อำเภอ จังหวัดไม่สมบูรณ์

ที่	สำนัก	ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูล					
		ความครบถ้วน (บรรยาย)					
		กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง	แผนที่ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ชี้แจงปัญหา/อุปสรรค	ข้อมูลพื้นฐาน (ตำบล อำเภอ จังหวัด GFMS)
8	สำนักงานชลประทานที่ 8	บางรายการบันทึกวิธีจัดหางานจ้างเหมา,วันประกาศ TOR, วันประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้างงานจ้างเหมา, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา (วันที่), อนุมัติรับราคา(วงเงิน), ลงนามในสัญญา(วันที่), ลงนามในสัญญา(วงเงิน), อายุสัญญา, เริ่มสัญญา, สั่งเข้าทำงาน, สิ้นสุดสัญญา, ผู้ประกอบการไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแผนเงิน, ผลเงิน, lat, longไม่สมบูรณ์	บันทึกครบถ้วน	บางรายการบันทึกได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (จ้างเหมา), ได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (ทำเอง)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแนวทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึก ตำบล อำเภอ จังหวัดไม่สมบูรณ์
9	สำนักงานชลประทานที่ 9	บางรายการบันทึกวิธีจัดหางานจ้างเหมา,วันประกาศ TOR, วันประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้างงานจ้างเหมา, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา (วันที่), อนุมัติรับราคา(วงเงิน), ลงนามในสัญญา(วันที่), ลงนามในสัญญา(วงเงิน), อายุสัญญา, เริ่มสัญญา, สั่งเข้าทำงาน, สิ้นสุดสัญญา, ผู้ประกอบการไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแผนเงิน, lat, long ไม่สมบูรณ์	บันทึกครบถ้วน	บางรายการบันทึกได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (ทำเอง), ผลการเบิกจ่าย (ทำเอง)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแนวทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึก ตำบล อำเภอ จังหวัดไม่สมบูรณ์

ที่	สำนัก	ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูล					
		ความครบถ้วน (บรรยาย)					
		กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง	แผนที่ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ชี้แจงปัญหา/อุปสรรค	ข้อมูลพื้นฐาน (ตำบล อำเภอ จังหวัด GFMS)
10	สำนักงานชลประทานที่ 10	บางรายการบันทึกวิธีจัดหางานจ้างเหมา,วันประกาศ TOR, วันประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้างงานจ้างเหมา, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา (วันที่), อนุมัติรับราคา(วงเงิน), ลงนามในสัญญา(วันที่), ลงนามในสัญญา(วงเงิน), อายุสัญญา, เริ่มสัญญา, สั่งเข้าทำงาน, สิ้นสุดสัญญา, ผู้ประกอบการไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแผนเงิน, lat, long ไม่สมบูรณ์	บันทึกครบถ้วน	บางรายการบันทึกได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (จ้างเหมา), ได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (ทำเอง)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแนวทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึก ตำบล อำเภอ จังหวัดไม่สมบูรณ์
11	สำนักงานชลประทานที่ 11	บางรายการบันทึกวิธีจัดหางานจ้างเหมา,วันประกาศ TOR, วันประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้างงานจ้างเหมา, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา (วันที่), อนุมัติรับราคา(วงเงิน), ลงนามในสัญญา(วันที่), ลงนามในสัญญา(วงเงิน), อายุสัญญา, เริ่มสัญญา, สั่งเข้าทำงาน, สิ้นสุดสัญญา, ผู้ประกอบการไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแผนเงิน, ผลเงิน, lat, longไม่สมบูรณ์	บันทึกครบถ้วน	บางรายการบันทึกได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (จ้างเหมา), ผลการเบิกจ่าย (ทำเอง)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแนวทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึก ตำบล อำเภอ จังหวัด GFMSไม่สมบูรณ์

ที่	สำนัก	ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูล					
		ความครบถ้วน (บรรยาย)					
		กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง	แผนที่ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ชี้แจงปัญหา/อุปสรรค	ข้อมูลพื้นฐาน (ตำบล อำเภอ จังหวัด GFMS)
12	สำนักงานชลประทานที่ 12	บางรายการบันทึกวิธีจัดหางานจ้างเหมา,วันประกาศ TOR, วันประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้างงานจ้างเหมา, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา (วันที่), อนุมัติรับราคา(วงเงิน), ลงนามในสัญญา(วันที่), ลงนามในสัญญา(วงเงิน), อายุสัญญา, เริ่มสัญญา, สั่งเข้าทำงาน, สิ้นสุดสัญญา, ผู้ประกอบการไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแผนเงิน, lat, long ไม่สมบูรณ์	บันทึกครบถ้วน	บางรายการบันทึกได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (จ้างเหมา)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแนวทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึก ตำบล อำเภอ จังหวัดไม่สมบูรณ์
13	สำนักงานชลประทานที่ 13	บางรายการบันทึกวิธีจัดหางานจ้างเหมา,วันประกาศ TOR, วันประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้างงานจ้างเหมา, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา (วันที่), อนุมัติรับราคา(วงเงิน), ลงนามในสัญญา(วันที่), ลงนามในสัญญา(วงเงิน), อายุสัญญา, เริ่มสัญญา, สั่งเข้าทำงาน, สิ้นสุดสัญญา, ผู้ประกอบการไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกlat, longไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกผลการปฏิบัติงานทั้งโครงการ (เดือน)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (จ้างเหมา), ผลการเบิกจ่าย (ทำเอง)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแนวทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึก ตำบล อำเภอ จังหวัด GFMSไม่สมบูรณ์

ที่	สำนัก	ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูล					
		ความครบถ้วน (บรรยาย)					
		กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง	แผนที่ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ชี้แจงปัญหา/อุปสรรค	ข้อมูลพื้นฐาน (ตำบล อำเภอ จังหวัด GFMIS)
14	สำนักงานชลประทานที่ 14	บางรายการบันทึกวิธีจัดหางานจ้างเหมา,วันประกาศ TOR, วันประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้างงานจ้างเหมา, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา (วันที่), อนุมัติรับราคา(วงเงิน), ลงนามในสัญญา(วันที่), ลงนามในสัญญา(วงเงิน), อายุสัญญา, เริ่มสัญญา, สั่งเข้าทำงาน, สิ้นสุดสัญญา, ผู้ประกอบการไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแผนเงิน, lat, long ไม่สมบูรณ์	บันทึกครบถ้วน	บันทึกครบถ้วน	บางรายการบันทึกแนวทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึก GFMISไม่สมบูรณ์
15	สำนักงานชลประทานที่ 15	บางรายการบันทึกวิธีจัดหางานจ้างเหมา,วันประกาศ TOR, วันประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้างงานจ้างเหมา, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา (วันที่), อนุมัติรับราคา(วงเงิน), ลงนามในสัญญา(วันที่), ลงนามในสัญญา(วงเงิน), อายุสัญญา, เริ่มสัญญา, สั่งเข้าทำงาน, สิ้นสุดสัญญา, ผู้ประกอบการ, วิธีจัดซื้อไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแผนเงิน, lat, long ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกผลการปฏิบัติงานปัจจุบัน (เดือน)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (จ้างเหมา), ได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (ทำเอง)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแนวทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึก ตำบล อำเภอ จังหวัดไม่สมบูรณ์

ที่	สำนัก	ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูล					
		ความครบถ้วน (บรรยาย)					
		กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง	แผนที่ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ชี้แจงปัญหา/อุปสรรค	ข้อมูลพื้นฐาน (ตำบล อำเภอ จังหวัด GFMIS)
16	สำนักงานชลประทานที่ 16	บางรายการบันทึกวิธีจัดหางานจ้างเหมา, วันประกาศ TOR, วันประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้างงานจ้างเหมา, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา (วันที่), อนุมัติรับราคา(วงเงิน), ลงนามในสัญญา(วันที่), ลงนามในสัญญา(วงเงิน), อายุสัญญา, เริ่มสัญญา, สั่งเข้าทำงาน, สิ้นสุดสัญญา, ผู้ประกอบการไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกผลเงินไม่สมบูรณ์	บันทึกครบถ้วน	บางรายการบันทึกได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (จ้างเหมา)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแนวทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึก GFMISไม่สมบูรณ์
17	สำนักงานชลประทานที่ 17	บางรายการบันทึกวิธีจัดหางานจ้างเหมา, วันประกาศ TOR, วันประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้างงานจ้างเหมา, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา (วันที่), อนุมัติรับราคา(วงเงิน), ลงนามในสัญญา(วันที่), ลงนามในสัญญา(วงเงิน), อายุสัญญา, เริ่มสัญญา, สั่งเข้าทำงาน, สิ้นสุดสัญญา, ผู้ประกอบการไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแผนเงิน, ผลเงิน, lat, longไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกผลการปฏิบัติงานทั้งโครงการ (เดือน)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (จ้างเหมา), ได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (ทำเอง)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแนวทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึก ตำบล อำเภอ จังหวัดไม่สมบูรณ์

ที่	สำนัก	ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูล					
		ความครบถ้วน (บรรยาย)					
		กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง	แผนที่ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ชี้แจงปัญหา/อุปสรรค	ข้อมูลพื้นฐาน (ตำบล อำเภอ จังหวัด GFMS)
18	สำนักเครื่องจักรกล	บางรายการบันทึกวิธีจัดหางานจ้างเหมา,วันประกาศ TOR, วันประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้างงานจ้างเหมา, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา (วันที่), อนุมัติรับราคา(วงเงิน), ลงนามในสัญญา(วันที่), ลงนามในสัญญา(วงเงิน), อายุสัญญา, เริ่มสัญญา, สั่งเข้าทำงาน, สิ้นสุดสัญญา, ผู้ประกอบการไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแผนเงิน, lat, long ไม่สมบูรณ์	บันทึกครบถ้วน	บางรายการบันทึกได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (ทำเอง)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแนวทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึก ตำบล อำเภอ จังหวัดไม่สมบูรณ์
19	สำนักบริหารโครงการ	บางรายการบันทึกวิธีจัดหางานจ้างเหมา,วันประกาศ TOR, วันประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้างงานจ้างเหมา, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา (วันที่), อนุมัติรับราคา(วงเงิน), ลงนามในสัญญา(วันที่), ลงนามในสัญญา(วงเงิน), อายุสัญญา, เริ่มสัญญา, สั่งเข้าทำงาน, สิ้นสุดสัญญา, ผู้ประกอบการไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแผนเงิน, lat, long ไม่สมบูรณ์	บันทึกครบถ้วน	บางรายการบันทึกได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (จ้างเหมา)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแนวทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึก ตำบล อำเภอ จังหวัด GFMSไม่สมบูรณ์

ที่	สำนัก	ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูล					
		ความครบถ้วน (บรรยาย)					
		กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง	แผนที่ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ชี้แจงปัญหา/อุปสรรค	ข้อมูลพื้นฐาน (ตำบล อำเภอ จังหวัด GFMS)
20	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	บางรายการบันทึกวิธีจัดหางานจ้างเหมา,วันประกาศ TOR, วันประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้างงานจ้างเหมา, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา (วันที่), อนุมัติรับราคา(วงเงิน), ลงนามในสัญญา(วันที่), ลงนามในสัญญา(วงเงิน), อายุสัญญา, เริ่มสัญญา, สิ้นเข้าทำงาน, สิ้นสุดสัญญา, ผู้ประกอบการ, วิธีจัดซื้อไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแผนเงิน, lat, long ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกผลการปฏิบัติงานทั้งโครงการ (เดือน), ผลการปฏิบัติงานปีปัจจุบัน(เดือน)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (จ้างเหมา), ได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (ทำเอง)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแนวทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึก ตำบล อำเภอ จังหวัด GFMSไม่สมบูรณ์

ที่	สำนัก	ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูล					
		ความครบถ้วน (บรรยาย)					
		กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง	แผนที่ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ชี้แจงปัญหา/อุปสรรค	ข้อมูลพื้นฐาน (ตำบล อำเภอ จังหวัด GFMIS)
21	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง	บางรายการบันทึกวิธีจัดหางานจ้าง เหมา,วันประกาศ TOR, วัน ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้างงานจ้าง เหมา, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา (วันที่), อนุมัติรับราคา(วงเงิน), ลง นามในสัญญา(วันที่), ลงนามใน สัญญา(วงเงิน), อายุสัญญา, เริ่ม สัญญา, สั่งเข้าทำงาน, สิ้นสุดสัญญา , ผู้ประกอบการ, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา(วันที่), วงเงินอนุมัติ รับราคามากกว่างบประมาณตาม ประมาณการไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแผนเงิน, ผลเงิน, lat, longไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกผลการ ปฏิบัติงานทั้งโครงการ (เดือน), ผลการปฏิบัติงาน ปีปัจจุบัน(เดือน)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกได้รับ การโอนจัดสรรมากกว่า งบประมาณตามประมาณ การ (จ้างเหมา), ได้รับการ โอนจัดสรรมากกว่า งบประมาณตามประมาณ การ (ทำเอง), ผลการ เบิกจ่าย (จ้างเหมา)ไม่ สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแนว ทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึก ตำบล อำเภอ จังหวัดไม่สมบูรณ์

ที่	สำนัก	ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูล					
		ความครบถ้วน (บรรยาย)					
		กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง	แผนที่ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ชี้แจงปัญหา/อุปสรรค	ข้อมูลพื้นฐาน (ตำบล อำเภอ จังหวัด GFMIS)
22	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	บางรายการบันทึกวิธีจัดหางานจ้างเหมา, วันประกาศ TOR, วันประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้างงานจ้างเหมา, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา (วันที่), อนุมัติรับราคา(วงเงิน), ลงนามในสัญญา(วันที่), ลงนามในสัญญา(วงเงิน), อายุสัญญา, เริ่มสัญญา, สั่งเข้าทำงาน, สิ้นสุดสัญญา, ผู้ประกอบการ, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา(วันที่), วงเงินอนุมัติรับราคามากกว่างบประมาณตามประมาณการไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแผนเงิน, ผลเงิน, lat, longไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกผลการปฏิบัติงานทั้งโครงการ (เดือน), ผลการปฏิบัติงานปีปัจจุบัน(เดือน)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (จ้างเหมา), ได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (ทำเอง), ผลการเบิกจ่าย (จ้างเหมา)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแนวทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึก ตำบล อำเภอ จังหวัดไม่สมบูรณ์

ที่	สำนัก	ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูล					
		ความครบถ้วน (บรรยาย)					
		กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง	แผนที่ประมาณการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	ชี้แจงปัญหา/อุปสรรค	ข้อมูลพื้นฐาน (ตำบล อำเภอ จังหวัด GFMIS)
23	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	บางรายการบันทึกวิธีจัดหางานจ้างเหมา, วันประกาศ TOR, วันประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้างงานจ้างเหมา, วันเปิดซอง, อนุมัติรับราคา (วันที่), อนุมัติรับราคา(วงเงิน), ลงนามในสัญญา(วันที่), ลงนามในสัญญา(วงเงิน), อายุสัญญา, เริ่มสัญญา, สั่งเข้าทำงาน, สิ้นสุดสัญญา, ผู้ประกอบการไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแผนเงิน, lat, long ไม่สมบูรณ์	บันทึกครบถ้วน	บางรายการบันทึกได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (ทำเอง)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแนวทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึก GFMISไม่สมบูรณ์
24	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	บันทึกครบถ้วน	บางรายการบันทึกlat, longไม่สมบูรณ์	บันทึกครบถ้วน	บางรายการบันทึกได้รับการโอนจัดสรรมากกว่างบประมาณตามประมาณการ (ทำเอง)ไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแนวทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บันทึกครบถ้วน
25	สำนักกฎหมายและที่ดิน	บางรายการบันทึกวงเงินอนุมัติรับราคามากกว่างบประมาณตามประมาณการไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึกแผนเงินไม่สมบูรณ์	บันทึกครบถ้วน	บันทึกครบถ้วน	บางรายการบันทึกแนวทางแก้ไขไม่สมบูรณ์	บางรายการบันทึก GFMISไม่สมบูรณ์
